



Общество с ограниченной ответственностью
«СПБ ДОРПРОЕКТ»
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д 39 лит А, помещ. 1-Н, ком. 4
+7 (963) 314-31-73
ОГРН 1217800078770, ИНН 7840096283, КПП 784001001

Заказчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению
деятельности муниципального образования» Свердловского городского
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Генеральный подрядчик

ООО «СПБ ДОРПРОЕКТ»

Утверждаю

«___» _____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах дер. Новосаратовка

Разработано

Генеральный директор _____ О.Н. Мельничук

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 24-09-2025

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Введение	4
2	Пояснительная записка	6
3	Лист согласования и ответы согласующих органов	10
4	Условные обозначения	11
5	дер. Новосаратовка (1-й участок)	13
6	дер. Новосаратовка (2-й участок)	17
7	дер. Новосаратовка (3-й участок)	22
8	дер. Новосаратовка (4-й участок)	25
9	дер. Новосаратовка (5-й участок)	27
10	дер. Новосаратовка (6-й участок)	29
11	дер. Новосаратовка (7-й участок)	32
12	дер. Новосаратовка (8-й участок)	34
13	дер. Новосаратовка (9-й участок)	36
14	дер. Новосаратовка (10-й участок)	38
15	дер. Новосаратовка (11-й участок)	56
16	дер. Новосаратовка (12-й участок)	58
17	дер. Новосаратовка (13-й участок)	60
18	дер. Новосаратовка (14-й участок)	62
19	дер. Новосаратовка (15-й участок)	64
20	дер. Новосаратовка (16-й участок)	67
21	дер. Новосаратовка (17-й участок)	69
22	дер. Новосаратовка (18-й участок)	72
23	дер. Новосаратовка (19-й участок)	75
24	дер. Новосаратовка (20-й участок)	78
25	дер. Новосаратовка (21-й участок)	80
26	дер. Новосаратовка (22-й участок)	82
27	дер. Новосаратовка (23-й участок)	84
28	дер. Новосаратовка (24-й участок)	86
29	дер. Новосаратовка (25-й участок)	88
30	дер. Новосаратовка (26-й участок)	90
31	дер. Новосаратовка (27-й участок)	92
32	дер. Новосаратовка (28-й участок)	97

№ п/п	Наименование	Стр.
33	дер. Новосаратовка (29-й участок)	100
34	дер. Новосаратовка (30-й участок)	103
35	дер. Новосаратовка (31-й участок)	106
36	дер. Новосаратовка (32-й участок)	109
37	дер. Новосаратовка (33-й участок)	111
38	дер. Новосаратовка (34-й участок)	113
39	дер. Новосаратовка (35-й участок)	115
40	дер. Новосаратовка (36-й участок)	117
41	дер. Новосаратовка (37-й участок)	119
42	дер. Новосаратовка (38-й участок)	121
43	дер. Новосаратовка (39-й участок)	123
44	дер. Новосаратовка (40-й участок)	125
45	дер. Новосаратовка (41-й участок)	127
46	дер. Новосаратовка (42-й участок)	129
47	дер. Новосаратовка (43-й участок)	131
48	дер. Новосаратовка (44-й участок)	133
49	дер. Новосаратовка (45-й участок)	135
50	дер. Новосаратовка (46-й участок)	137
51	дер. Новосаратовка (47-й участок)	139
52	дер. Новосаратовка (48-й участок)	142
53	дер. Новосаратовка (49-й участок)	145
54	дер. Новосаратовка (50-й участок)	148
55	дер. Новосаратовка (51-й участок)	151
56	дер. Новосаратовка (52-й участок)	153
57	дер. Новосаратовка (53-й участок)	155
58	дер. Новосаратовка (54-й участок)	157
59	дер. Новосаратовка (55-й участок)	160
60	дер. Новосаратовка (56-й участок)	163
61	дер. Новосаратовка (57-й участок)	166
62	дер. Новосаратовка (58-й участок)	169
63	ул. Покровская	172
64	ул. Полевая	178

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с *МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТом №24-09-25 от 24 сентября 2025 года на «оказание услуг по внесению изменений в действующий проект организации дорожного движения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»*, заключенным между ООО «СПБ Дорпроект» и муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Документация по ПОДД разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.

ПОДД выполнен в специализированном программном комплексе, который обеспечивает автоматический подсчет и формирование ведомостей ТСОДД на заданном участке дорожной сети.

Разработка ПОДД осуществлялась на основе данных, полученных в ходе полевых работ. Для автомобильной дороги выполнена видеосъемка в прямом и обратном направлениях, и топографическая съемка.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И РАССТАНОВКИ ТСОДД.

Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Основные положения, принятые при разработке проекта

1. Масштаб графической части принят 1:1000.
2. Разметка, должна соответствовать требованиям ГОСТ 32953 и ГОСТ Р 51256 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597.

Основные пункты при проектировании дорожной разметки:

- минимальная длина разметки 1.1 в населенном пункте оставляет 20 м;
- минимальная длина разметки 1.1 вне населенного пункта составляет 40 м;
- длина разметки 1.6 в населенном пункте принята равной 50 м;
- длина разметки 1.6 вне населенного пункта принята равной 100 м.

Вся разметка показана схематически. В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 52289-2019.

3. Типоразмер дорожных знаков – П. Линейные размеры знаков (в соответствии с выбранным типоразмером) в мм:

- треугольные – длина стороны 900;
- круглые – диаметр 700;
- квадратные – 700х700

Знаки изготавливают в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

При дислокации дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и 3.21 «Конец запрещения обгона» проектом предусмотрены минимальные расстояния

видимости, обеспечивающие безопасность движения по таблице 4 ГОСТ Р 52289-2019.

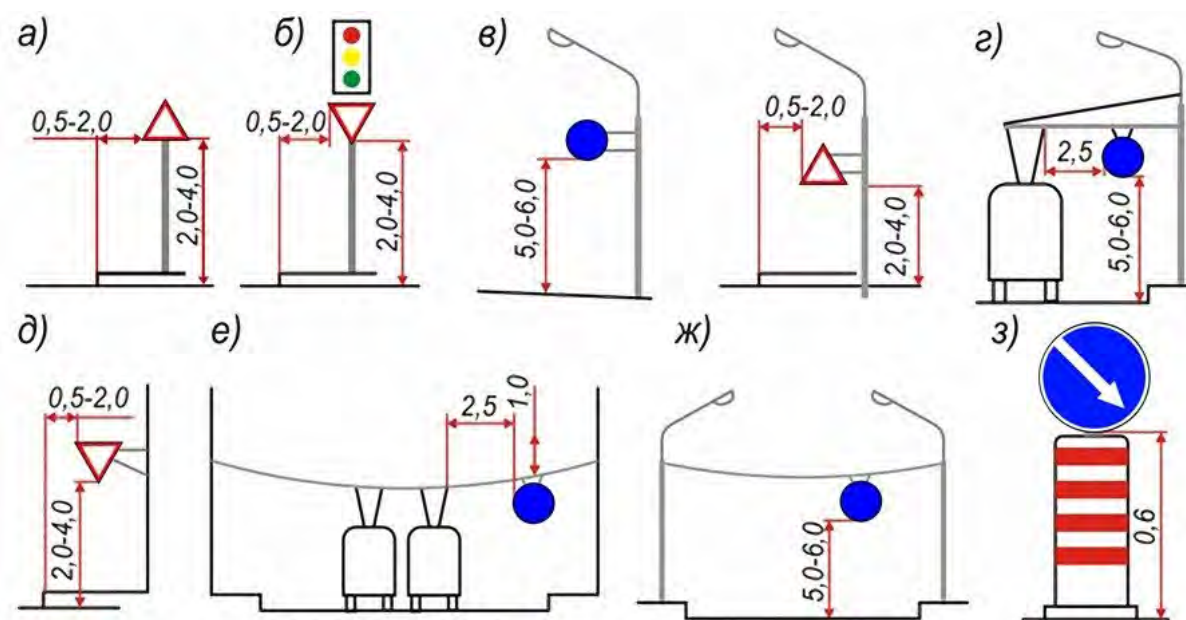


Рисунок 1 – Схемы установки знаков на стойке

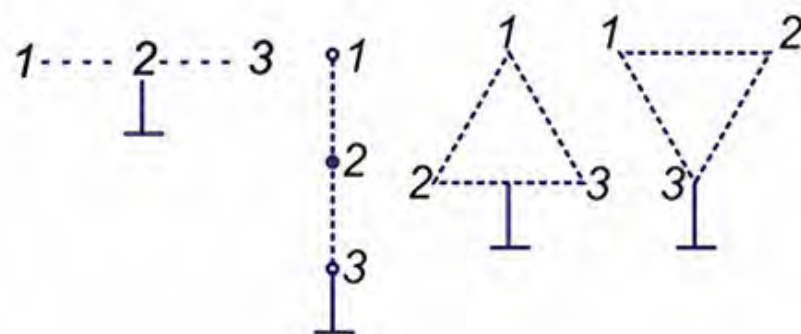


Рисунок 2 – Схемы расположения нескольких знаков на стойке

4. Конструкция и установка пешеходных ограждений (перильного типа) должна соответствовать ГОСТ 33127-2014, ГОСТ Р 52607-2006 и ГОСТ Р 52289-2019.

5. Конструкции проектируемых искусственных неровностей на данном объекте приняты – сборно-разборные и должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006.

Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных геометрически совместимых основных и краевых элементов. Основной и краевой элементы могут состоять из одной (см. рисунок 3а) или двух частей (см. рисунок 3б), которые геометрически совместимы друг с другом и имеют отверстия для крепления к покрытию дороги.

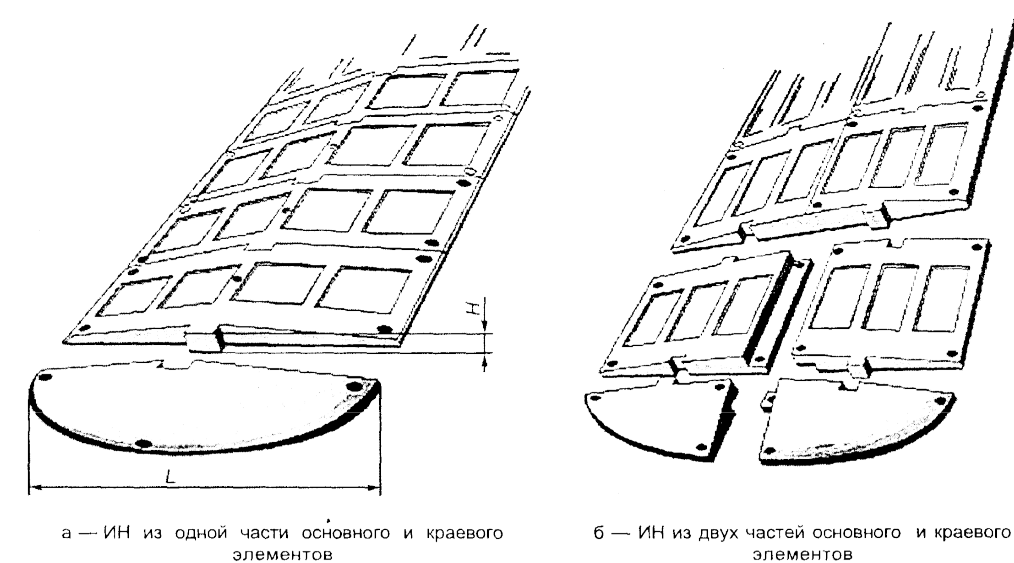


Рисунок 3 — Конструкция сборно-разборной ИН

ИН должна иметь поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597.

6. Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах устраивают в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. Основные пункты разработки освещения, принятые на данном объекте:

- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м;

7. Трогуары устраивают в пределах населенных пунктов на автомобильных дорогах с твердым покрытием (ГОСТ Р 52766-2007). Трогуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке - с одной стороны

Пешеходные дорожки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 33150.

Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с двумя полосами движения и более должна быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки или тротуара должна быть не менее 1,0 м.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Свердловское городское поселение — муниципальное образование в южной части Всеволожского района Ленинградской области. Административный центр — пгт им. Свердлова. Площадь района — 115,1 км². На Севере граничит с Заневским городским поселением; на северо-востоке — с Колтушским сельским поселением.

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 37 км.

Географическое расположение Свердловского городского поселения является выгодным с точки зрения транспортной доступности. С запада на восток по территории района проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга А118. В непосредственной близости от Свердловского городского поселения расположена федеральная трасса Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисоглебский (граница с Норвегией). Через Свердловское городское поселение проходят трассы регионального значения Санкт-Петербург — Всеволожск, Карьер-Мяглово — Кузьминка, Посёлок имени Свердлова — Маслово.

Рельеф равнинный, частично заболоченный, на востоке района присутствуют отдельные холмы. Большая часть района находится на Балтийско-Ладожском уступе. Более 60 % площади занимают леса. По территории района протекает 12 рек общей протяжённостью 254 км. Крупнейшими являются р. Нева, р. Труневка, р. Черная, р. Утка. На территории района находится ряд небольших озёр. Наиболее распространённым видом почв в районе являются дерново-карбонатные. Их ещё называют «северными чернозёмами», так как они благоприятны для развития земледелия. Имеются несколько месторождений известняка, керамические глины и пески.

Численность населения района по состоянию на 1 января 2021 года составляет 14 246 человек, численность населения административного центра района — 12 644 человек. В состав Свердловского городского поселения входят 10 населённых пунктов.

Главным транспортным узлом района является пгт. им. Свердлово.

С учетом функционального назначения дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, они делятся на следующие категории:

- 1 федеральные дороги;
- 2 региональные дороги;
- 3 муниципальные дороги:
 - дороги городского и сельских поселений;
 - дороги района.

В Свердловском городском поселении не очень хорошо развита сеть внутренних автомобильных дорог регионального и местного значения, а плотность дорожного покрытия значительно выше на западе поселения.

Износ дорожного покрытия выше в сельской местности ввиду большого количества грунтовых дорог и дорог с покрытием переходного типа.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

Организация движения транспортных средств различного назначения, пешеходов и велосипедистов это сложный, многоступенчатый процесс. В трактовке федерального законодательства под организацией дорожного движения понимается деятельность по упорядочению движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, направленная на снижение потерь времени (задержек) при движении транспортных средств и (или) пешеходов, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. К основным способам организации дорожного движения относят: распределение транспортных потоков по ширине проезжей части и направлениям движения; ориентирование водителей; разделение потоков на группы автомобилей, следующих с разными скоростями; разделение траекторий движения на сложных участках; обеспечение возможности перехода с одной полосы на другую и т.п. К организации движения относится также информация о наиболее целесообразных маршрутах и условиях движения. Выполнение этих мероприятий возлагается на владельцев дорог или органы исполнительной власти, в чьем ведении находятся эти дороги. Любые мероприятия по изменению организации движения не могут снижать уровень безопасности дорожного движения.

При анализе существующей дорожно-транспортной ситуации в Свердловском городском поселении были выявлены отклонения в организации пешеходного и автомобильного движения от нормативных требований.

В населенных пунктах для организации пешеходного движения следует обустроить тротуары или пешеходные дорожки на дорогах с твердым покрытием. Также необходимо обустройство пешеходных переходов с учетом мест сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов.

Для организации автомобильного движения на участках дороги с ограниченной видимостью (кривые в плане, продольные уклоны) необходимо введение запрета обгона и нанесение соответствующей разметки.

В населенных пунктах требуется установка искусственного освещения.

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП

В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств, в таких дорожно-транспортных происшествиях погибает и получает ранения подавляющее большинство пострадавших (85,9 процента общего числа погибших и 91 процент общего числа раненых).

Детальный анализ мест совершения ДТП показывает, что основными причинами ДТП являются:

- несоблюдение очередности проезда перекрестков;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода;
- неправильный выбор режима движения;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение правил перестроения;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- превышение установленной скорости движения;
- разворот в местах, где разворот запрещён;
- нарушение правил расположения ТС на проезжей части.

В число основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению участков концентрации ДТП, входят:

- наличие дефектов эксплуатационного состояния покрытия проезжей части и обочин, ТСОДД и инженерного оборудования дорог, снижающих безопасность дорожного движения;

– сложные сочетания геометрических элементов трассы, не обеспечивающие равномерный режим движения транспортных средств;

– неудовлетворительный уровень содержания дорог;

– разделение, слияние и пересечение транспортных потоков на пересечениях и примыканиях дорог, на которых планировка и схемы организации движения не отвечают установленным требованиям;

– несоответствие параметров геометрических элементов трассы дороги состоянию покрытия и придорожной обстановке, способствующее значительному превышению безопасной скорости движения;

– отсутствие оборудованных пешеходных переходов в необходимых местах;

– недостаточное обеспечение УДС техническими средствами ОДД (в частности, дорожными знаками).

– отсутствие или дефекты инженерного оборудования на эксплуатируемых железнодорожных переездах, а также несоблюдение нормативных требований к расстоянию видимости приближающихся поездов.

В частности, сопутствующей причиной каждого второго дорожно-транспортного происшествия являлись недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (дефекты покрытия, отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неудовлетворительное состояние обочин, недостаточная освещённость).

При этом наезд на пешеходов, чаще происходит на нерегулируемых пешеходных переходах и в местах неорганизованного движения пешеходных потоков, а также в тёмное время суток на не освещенных участках дороги или выключенном уличном освещении.

Таким образом, становится очевидным, что достижения целевых показателей по снижению количества ДТП и обнулению уровню смертности необходимо сформировать целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование сложившейся системы организации дорожного движения на территории Свердловского городского поселения.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОДД

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе анализа дорожно-транспортной ситуации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Свердловском городском поселении, были выработаны следующие проектные решения:

1. На автомобильных дорогах откорректирована схема нанесения дорожной разметки (согласно ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 32952, ГОСТ Р 51256-2018), схема дислокации дорожных знаков (согласно ГОСТ Р 52289-2019) для:

- информирования участников дорожного движения о предстоящих изменениях в дорожной ситуации;

- ликвидации условий, способствующих совершению ДТП, что в свою очередь дает возможность значительно повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в целом.

2. В проекте организации дорожного движения предусмотрена установка линий освещения на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них 100м, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

3. Предусмотрено устройство тротуаров на дорогах с твердым и усовершенствованным покрытием, с учетом невысокой интенсивности движения пешеходов, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

4. На участках дороги с ограниченной видимостью (кривые в плане, продольные уклоны) был введен запрета обгона, а также установлены предупреждающие знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Одним из важных принципов, которые должны обязательно учитываться при оценке эффективности мероприятий по снижению аварийности, является стохастичность условий их реализации. В настоящее время при рассмотрении проблем безопасности движения на дорогах принято принимать во внимание только вероятность возникновения после указанных мероприятий тех или иных дорожно-транспортных происшествий (общего числа ДТП или ДТП с пострадавшими).

К первой группе относятся мероприятия по улучшению транспортно-эксплуатационных качеств дорожных сооружений, предусматривающие, как правило, либо увеличение их пропускной способности в местах концентрации аварийности (уширение проезжей части, увеличение числа полос движения, строительство транспортных и пешеходных развязок в разных уровнях и т.п.), либо повышение устойчивости автомобилей, зависящей от дорожных условий (устройство шероховатой поверхностной обработки, ямочный ремонт устранение колеиности и т.д.).

Во вторую группу входят мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения, которые можно разбить на две подгруппы: мероприятия по улучшению обстановки пути (установка знаков, нанесение разметки, устройство ограждений и т.д.).

Практически все мероприятия первой группы и большинство мероприятий второй группы по повышению БДД обеспечивают, наряду со снижением аварийности движения, улучшение эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта.

В течение проектного периода предусматривается разработка и реализация всех вышеперечисленных проектных решений, что должно привести к следующим изменениям в дорожно-транспортной ситуации:

1. Актуализация существующей схемы нанесения дорожной разметки:

- повышает эффективность использования площади дорожного полотна;
- своевременно информирует участников движения о предстоящих изменениях

в дорожной ситуации;

- снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

2. Установка дополнительных линий освещения:

- повышает безопасность и улучшает ориентирование участников движения, а также снижает аварийность в темное время суток;
- увеличивает расстояние видимости в зонах остановок маршрутных транспортных средств и пешеходных переходов.

3. Обустройство выделенных зон для движения пешеходов в полосе отвода автодороги (пешеходные дорожки), а также обустройство новых пешеходных

переходов в местах прохождения основных пешеходных маршрутов упорядочит движение пешеходных потоков, а также обеспечит комфортное и безопасное передвижение пешеходов в любое время года.

Все проектные решения были приняты и направлены на оптимизацию методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Свердловского городского поселения, для повышения их пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.









Разработанный проект организации оценивается как соответствующий нормативной документации РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также являющийся, наиболее исчерпывающим ввиду, анализа и учета сопутствующих технических документов, и результатов обследования автомобильных дорог Свердловского городского поселения.




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ №24-09-25 от 24 сентября 2025 года на «оказание услуг по внесению изменений в действующий проект организации дорожного движения на территории Свердловского городского оселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание

Условные обозначения элементов обустройства дороги


Обозначения	Наименование
	- Светофоры: Транспортный / Пешеходный/ Т7
	- Ограждения дорожные, металлические
	- Ограждения пешеходные, перильного типа
	- Бордюрный камень
	- Стационарное электрическое освещение с указанием начального и конечного участка освещения
	- Сигнальные столбики
	- Путепроводы/Мост/Эстакада
	- Водопропускная труба
	- Сборно-разборная искусственная дорожная неровность
	- Остановка общественного транспорта с павильоном, посадочной площадкой и карманом
	- Знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части
	- Знаки, устанавливаемые над проезжей частью
	- Делинаторы

Обозначения	Наименование
	- Коммуникации: ВЛЭП/Теплотрасса/Газопровод/Подземный газопровод
	- Железнодорожный переезд
	- Линии разметки
	- Тротуар (пешеходная дорожка)
ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые необходимо установить дополнительно
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые фактически установлены
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые необходимо демонтировать
	- Тип покрытия: Асфальтобетон/ Цементобетон / Тротуарная плитка
	- Тип покрытия: Гравий/Щебень
	- Тип покрытия: Песчанно-гравийная смесь
	- Тип покрытия: Грунт
	- Тип покрытия: Иное
	- Шлагбаум


автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

дер. Новосаратовка





дер. Новосаратовка (1-й участок)
0,395-0,678
1:1000

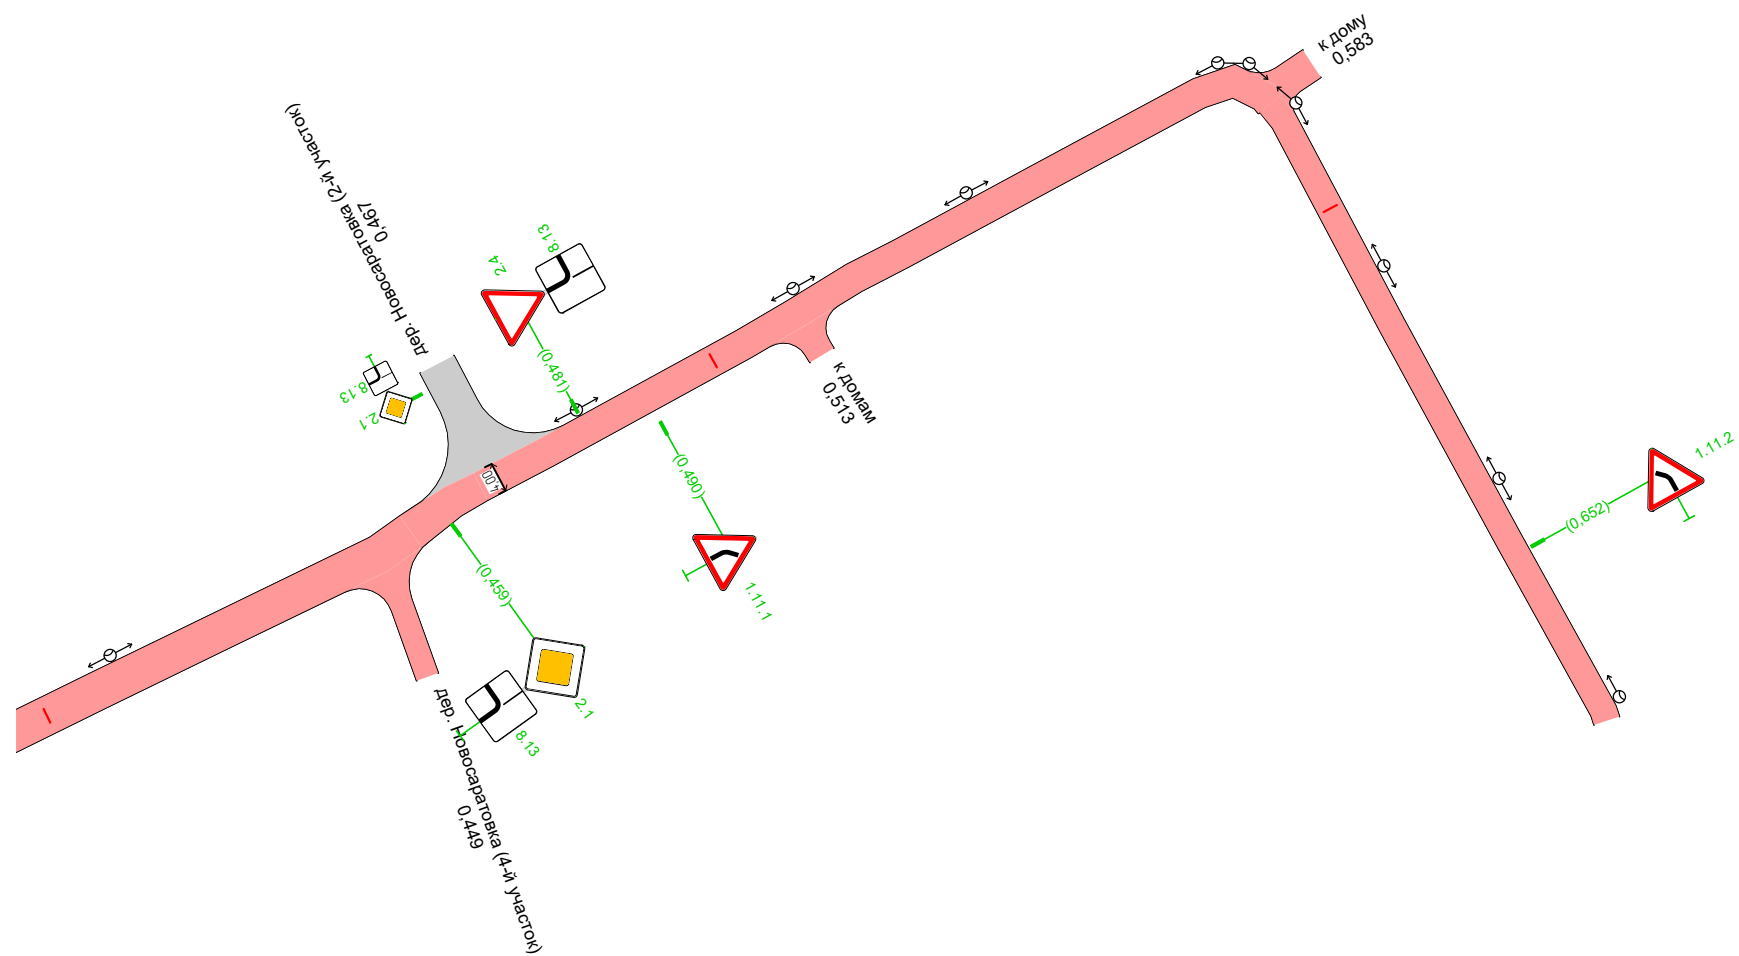

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (1-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,149	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,168	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,183	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,194	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,459	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,481	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						6	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						6	
Предупреждающие знаки							
1.11.1	Опасный поворот	II		0,490	Требуется установка	1	Справа
1.11.2	Опасный поворот	II		0,652	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,030	Требуется установка	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I		0,030	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,459	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,481	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						12	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						12	

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (1-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,060	0,675	Населенный пункт	18/18	615	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого		
Статус	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	18/18	615

0,000-0,427

1:1000

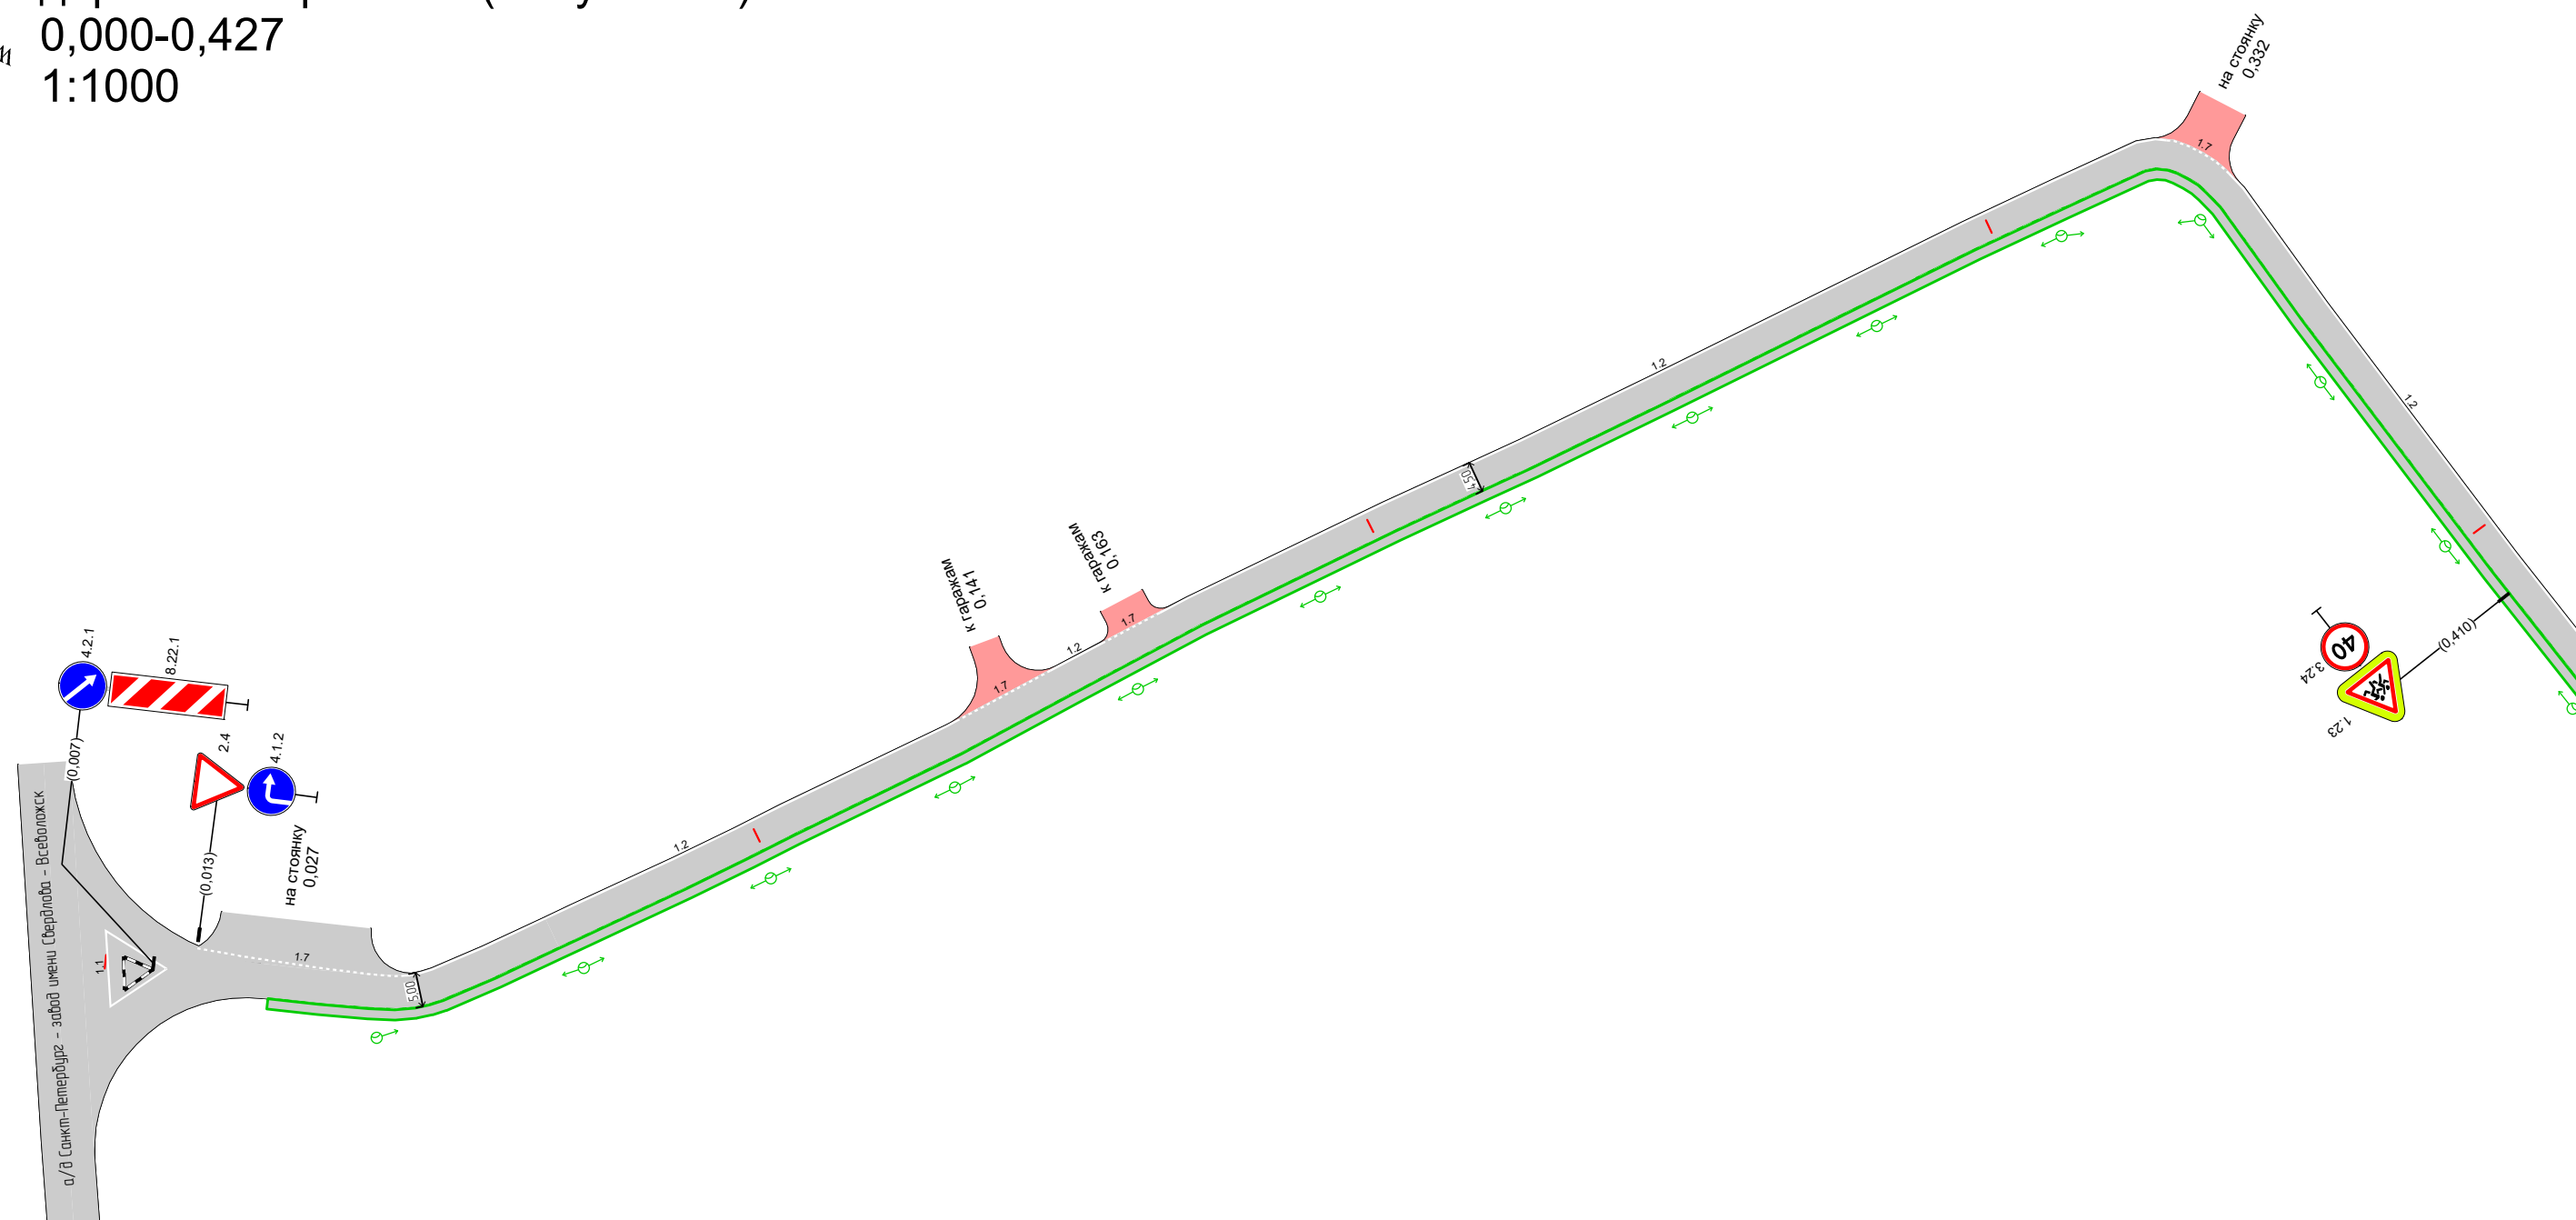

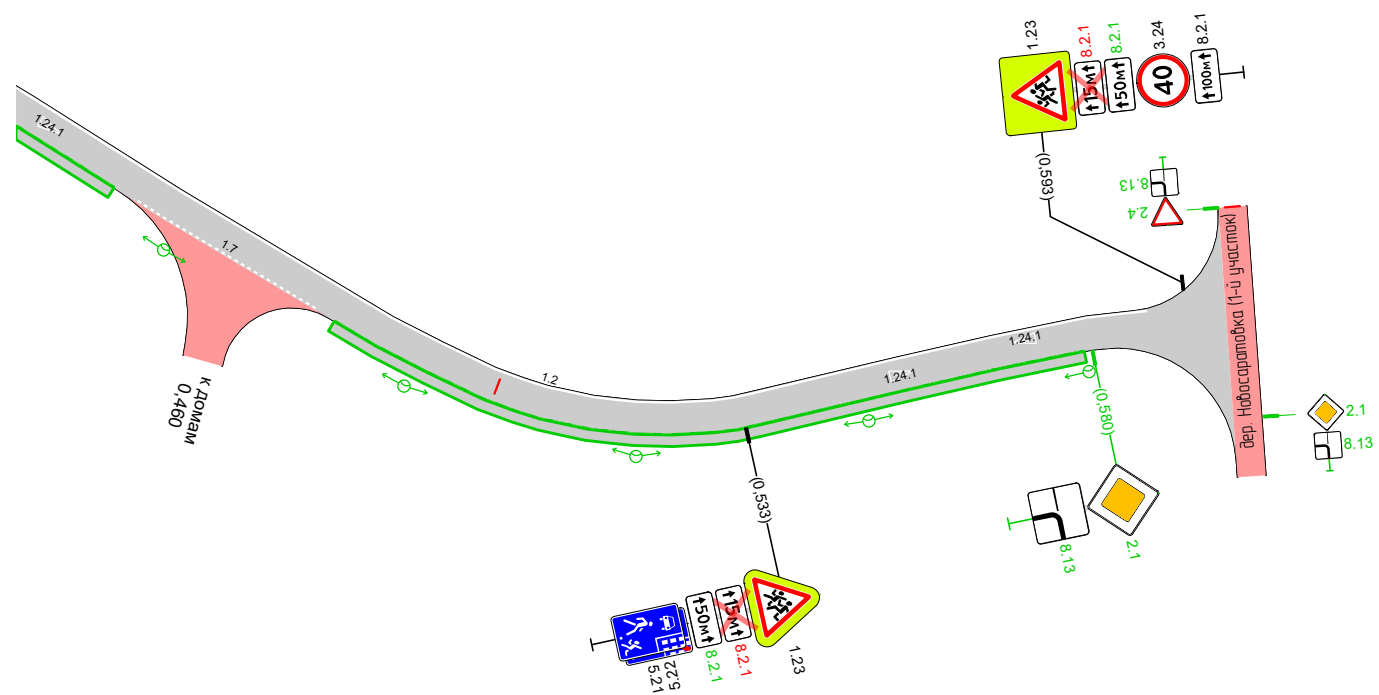

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (2-й участок)

Участок, км,м	1.2	1.7	1.24.1	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	—	—
Ширина, м	0,10	0,10	—	—
Единицы	м	м	шт.	м²
0,000 - 0,598	511,0	92,0	3	60,35
Длина, км	0,511	0,092		
Привед. длина, км	0,511	0,046		0,557
Площадь, м²	51,10	4,60	4,65	60,35

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (2-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0,410	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		0,533	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		0,593	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,580	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,410	Установлен	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,593	Установлен	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.21	Жилая зона	I		0,533	Установлен	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I		0,533	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,533	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (15м)	Зона действия	II		0,533	К демонтажу	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,580	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (15м)	Зона действия	II		0,593	К демонтажу	1	Слева
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,593	Установлен	1	Слева
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,593	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		8					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		14					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (2-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,579	Населенный пункт	19/19	539	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	19/19	539


Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

дер. Новосаратовка (2-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,024	0,443	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	419	625	Требуется строительство
2	0,477	0,579	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	102	156	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								521	781	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								521	781	



дер. Новосаратовка (3-й участок)
0,000-0,212
1:1000

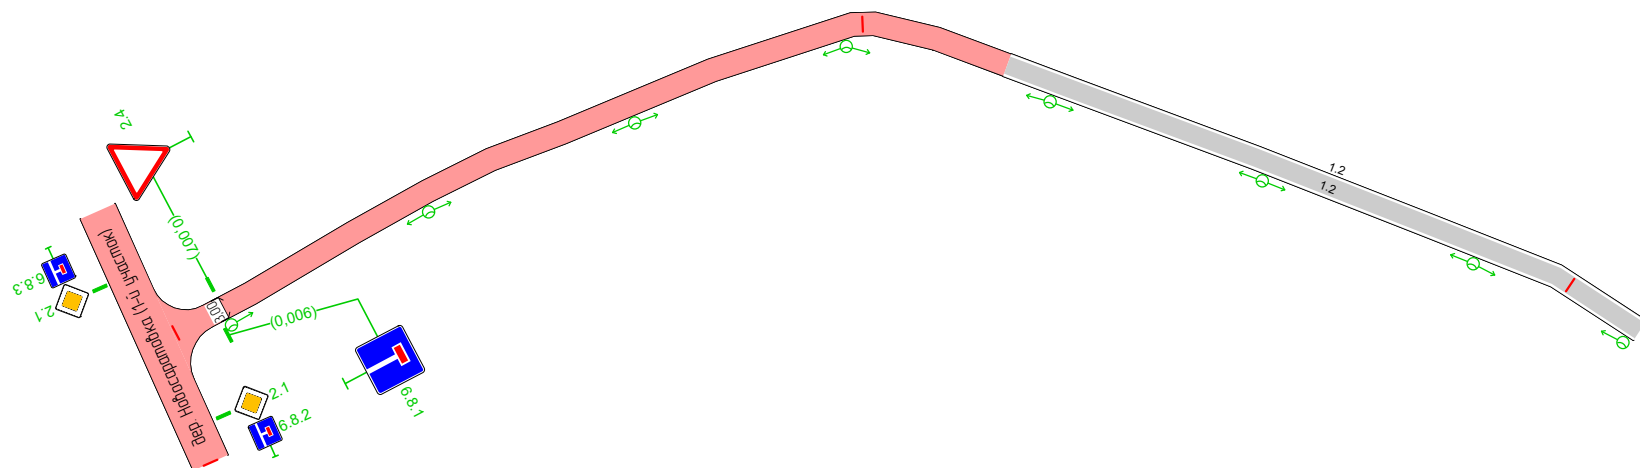

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (3-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,212	182,00	18,20
Длина, км	0,182	
Привед. длина, км	0,182	0,182
Площадь, м²	18,20	18,20

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (3-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,006	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (3-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,210	Населенный пункт	8/8	203	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	8/8	203

дер. Новосаратовка (4-й участок)
0,000-0,114
1:1000

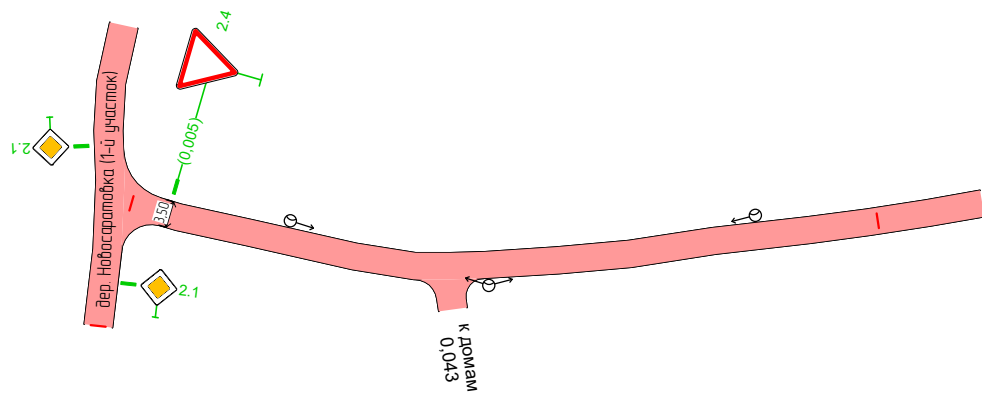

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (4-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (4-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,084	Населенный пункт	3/3	63	Установлено	Правая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	3/3	63



дер. Новосаратовка (5-й участок)

0,000-0,285

1:1000

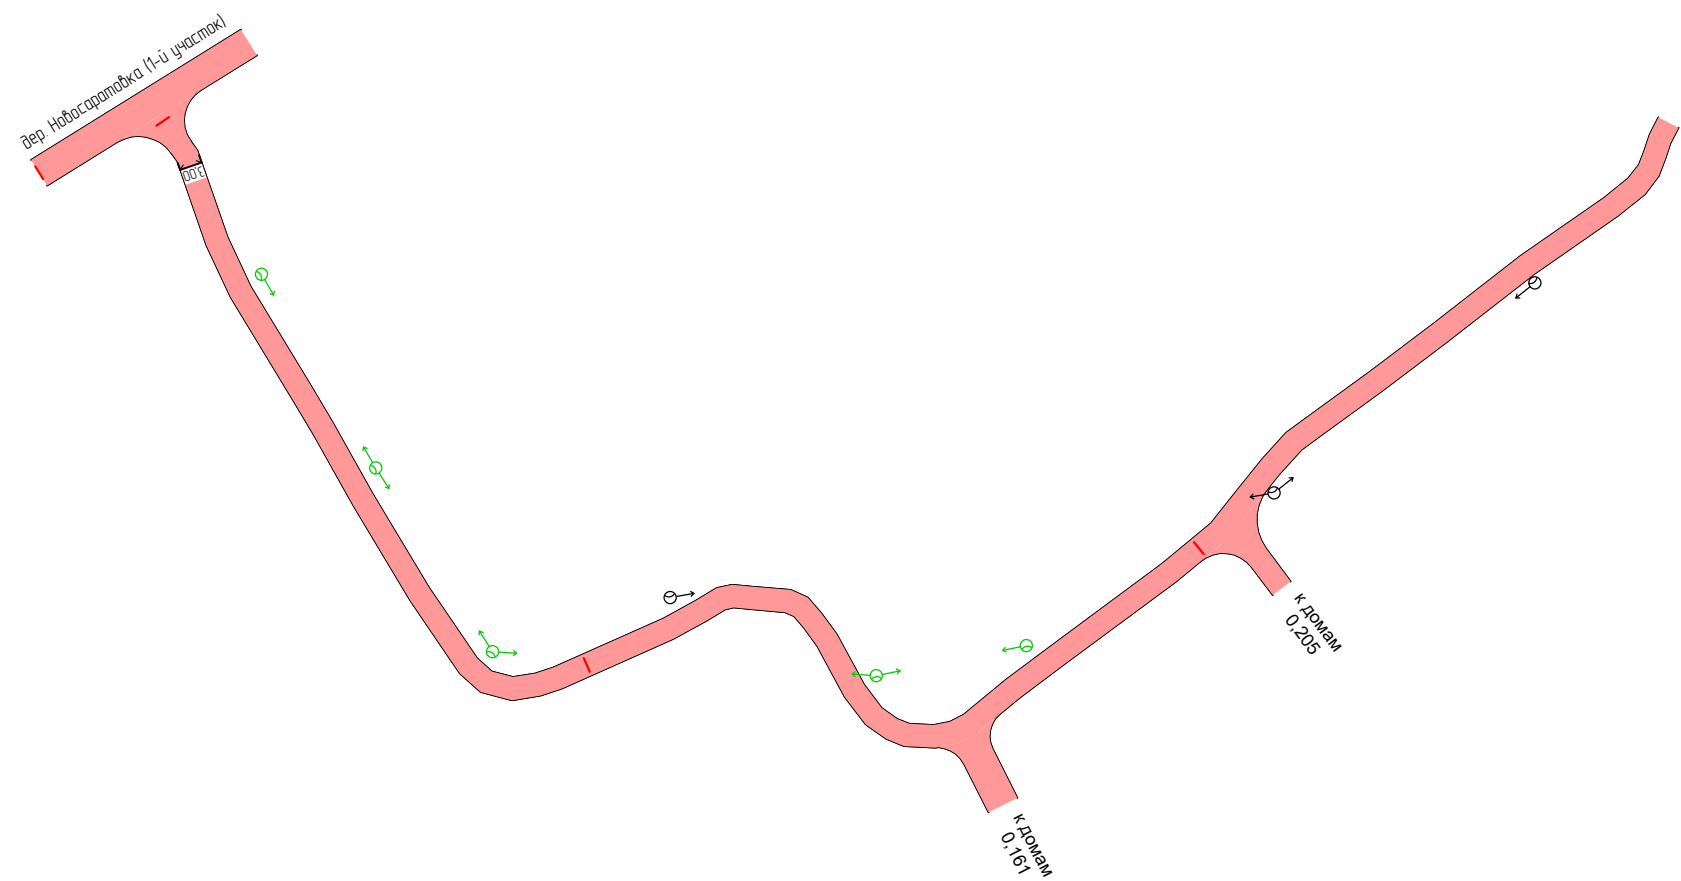

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (5-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,024	0,174	Населенный пункт	5/5	150	Требуется установка	Левая кромка
2	0,114	0,257	Населенный пункт	3/3	143	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	150
Соответствует нормам	3/3	143



дер. Новосаратовка (6-й участок)
0,000-0,034
1:1000

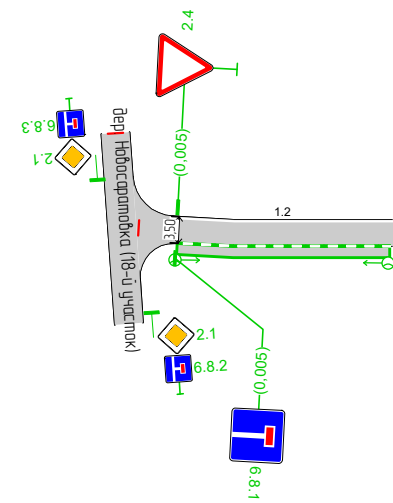

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (6-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,034	29,51	2,95
Длина, км	0,030	
Привед. длина, км	0,030	0,030
Площадь, м²	2,95	2,95

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (6-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,005	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (6-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,033	Населенный пункт	2/2	28	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	28

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

дер. Новосаратовка (6-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,005	0,033	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	28	42	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								28	42	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								28	42	

дер. Новосаратовка (7-й участок)
0,000-0,159
1:1000

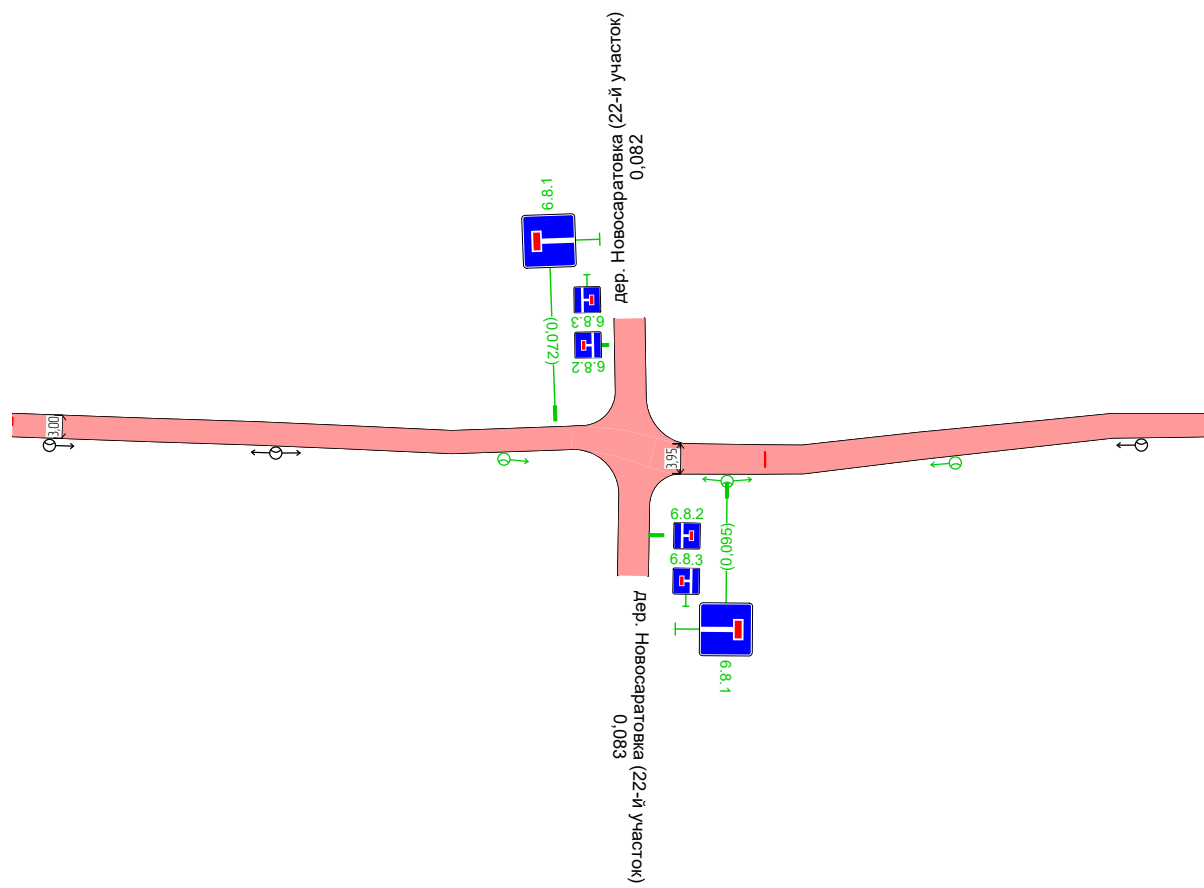

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (7-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,072	Требуется	1	Слева
6.8.1	Тупик	II		0,095	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (7-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,150	Населенный пункт	3/3	145	Установлено	Правая кромка
2	0,065	0,125	Населенный пункт	3/3	60	Требуется	Правая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	3/3	145
Требуется	3/3	60



дер. Новосаратовка (8-й участок)

0,000-0,122

1:1000

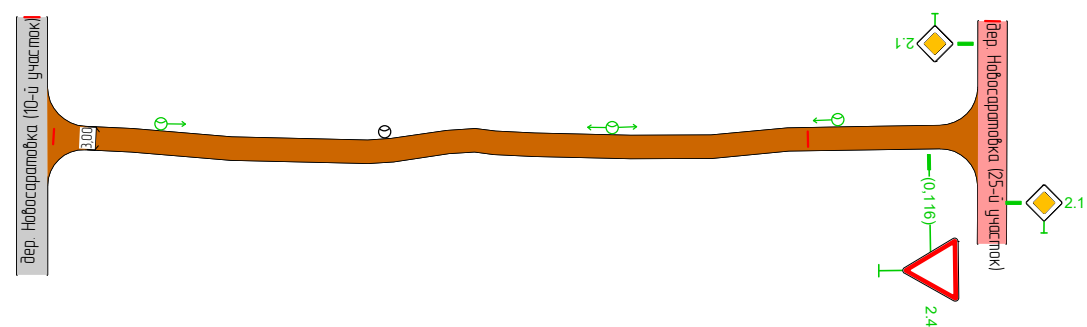

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (8-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,116	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (8-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,014	0,104	Населенный пункт	3/3	90	Требуется	Левая кромка
2	0,044	0,044	Населенный пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	90
Установлено	1/1	0

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (9-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,093	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,093	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.8.2	Тупик	II		0,009	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (9-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,085	Населенный пункт	3/3	60	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	60



дер. Новосаратовка (10-й участок)


0,000-0,396

1:1000

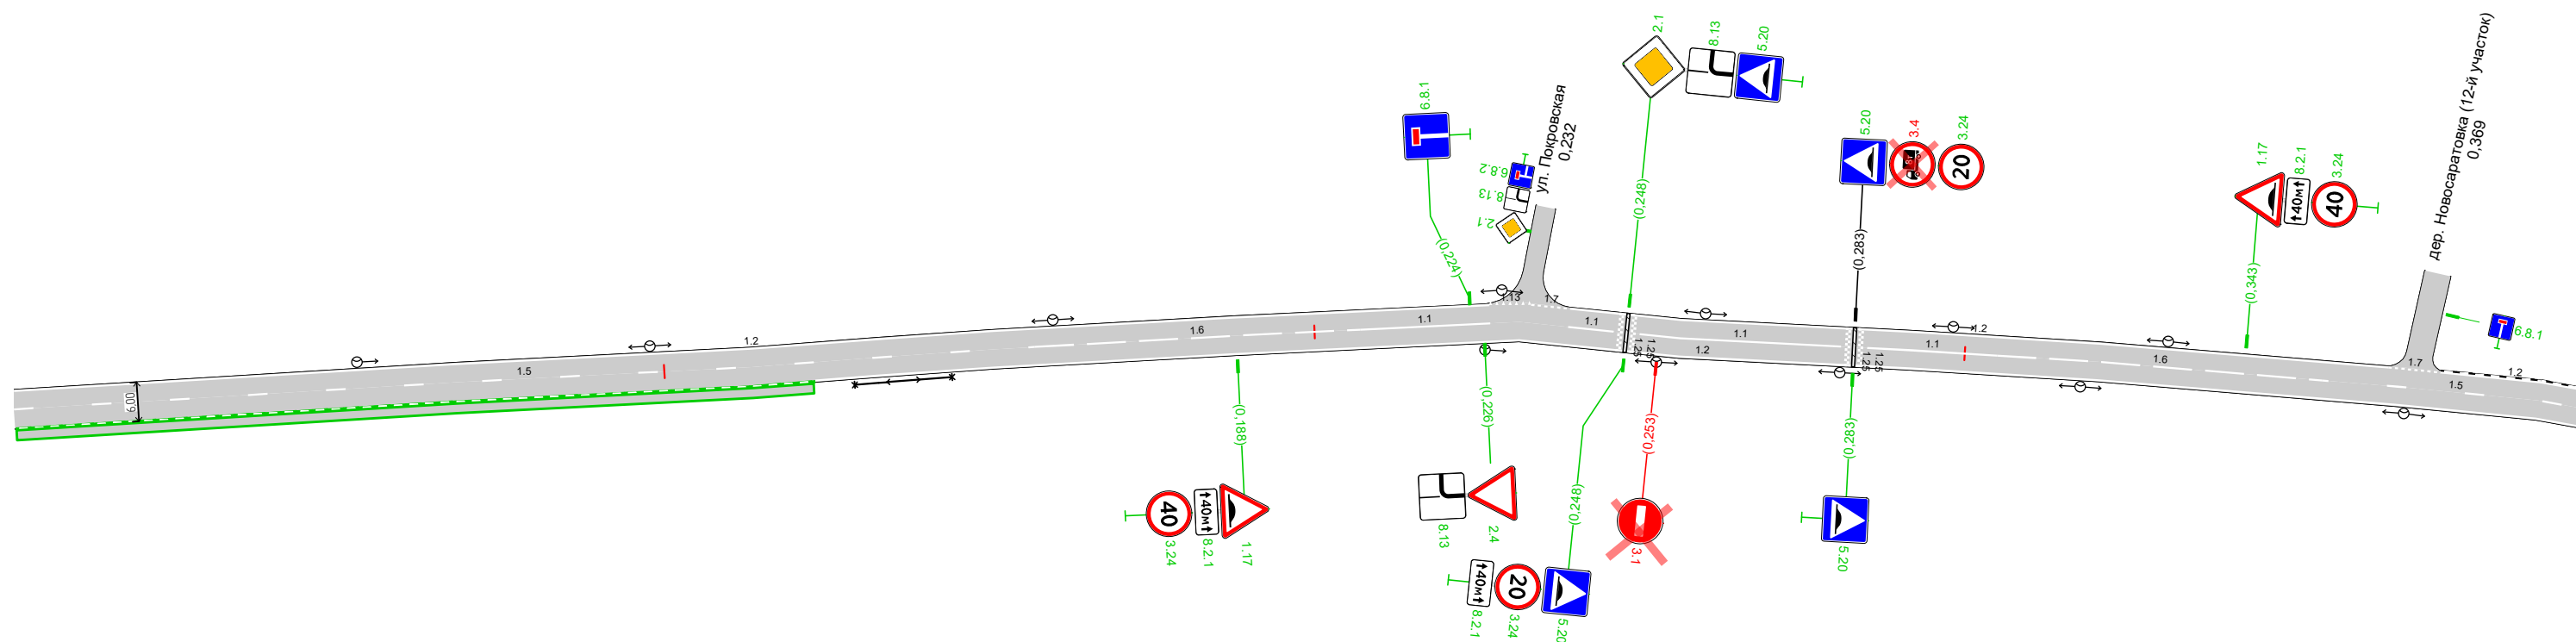




дер. Новосаратовка (10-й участок)
0,396-0,790
1:1000

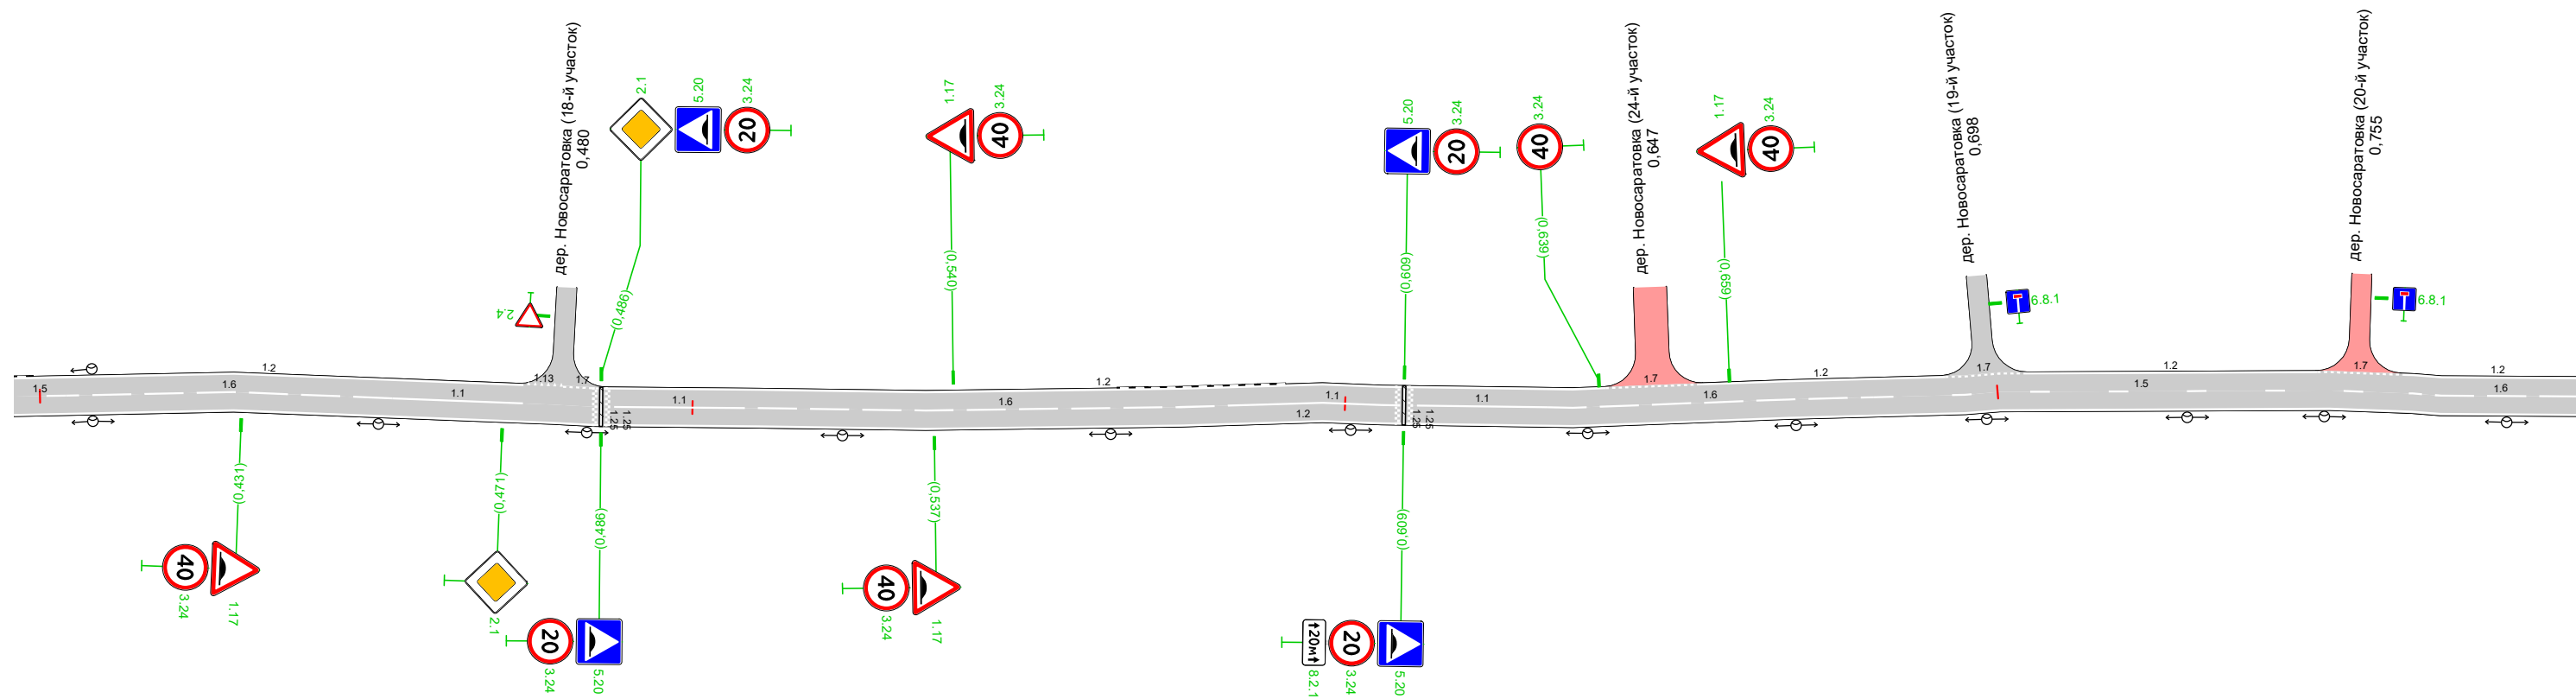




дер. Новосаратовка (10-й участок)
0,790-1,187
1:1000

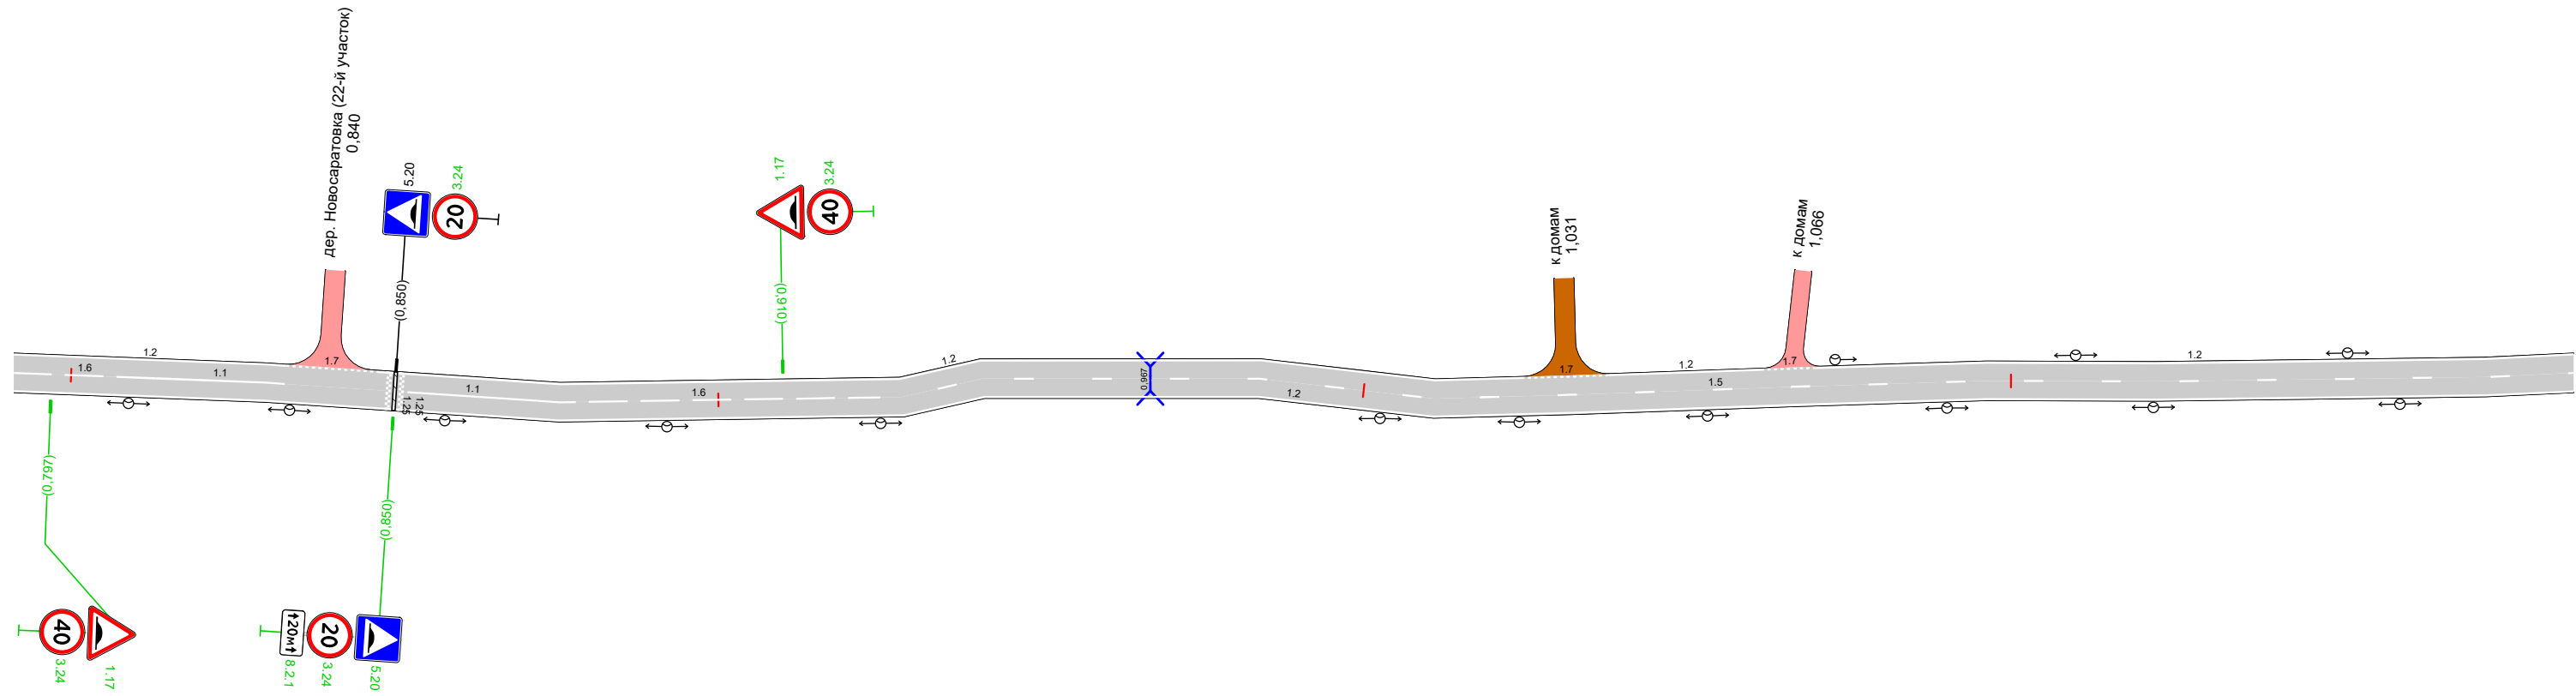




дер. Новосаратовка (10-й участок)
1,187-1,582
1:1000

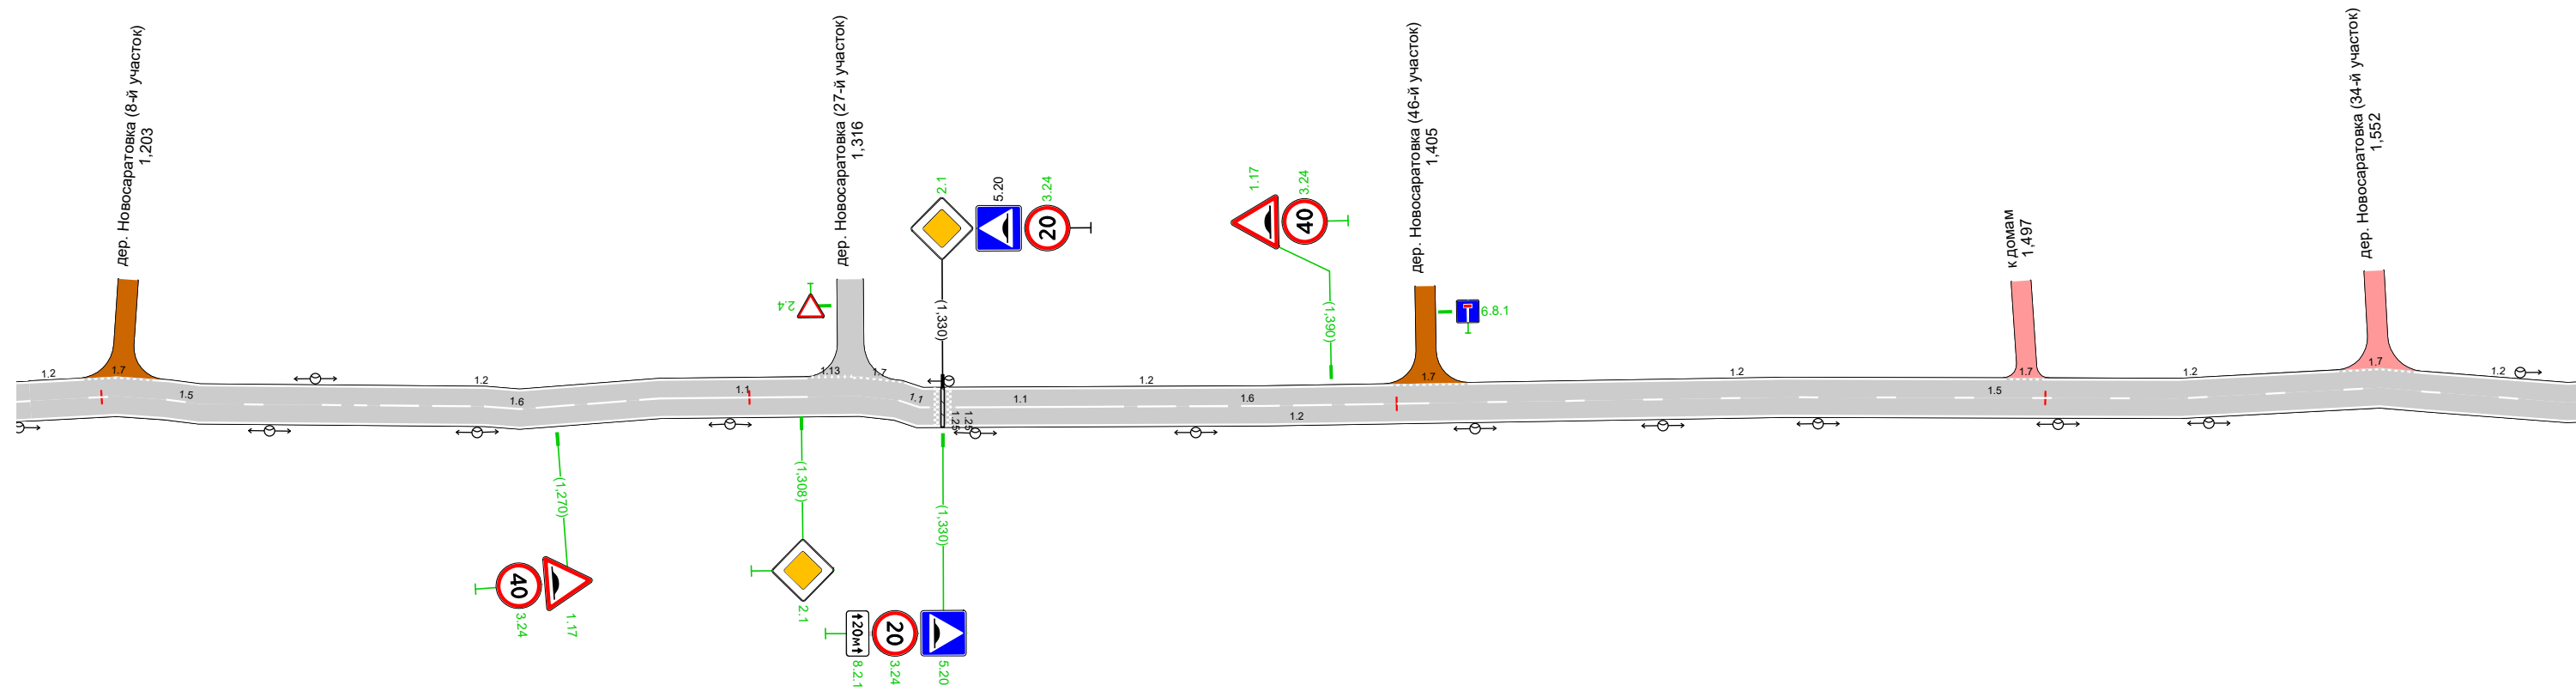





дер. Новосаратовка (10-й участок)
1,582-2,002
1:1000

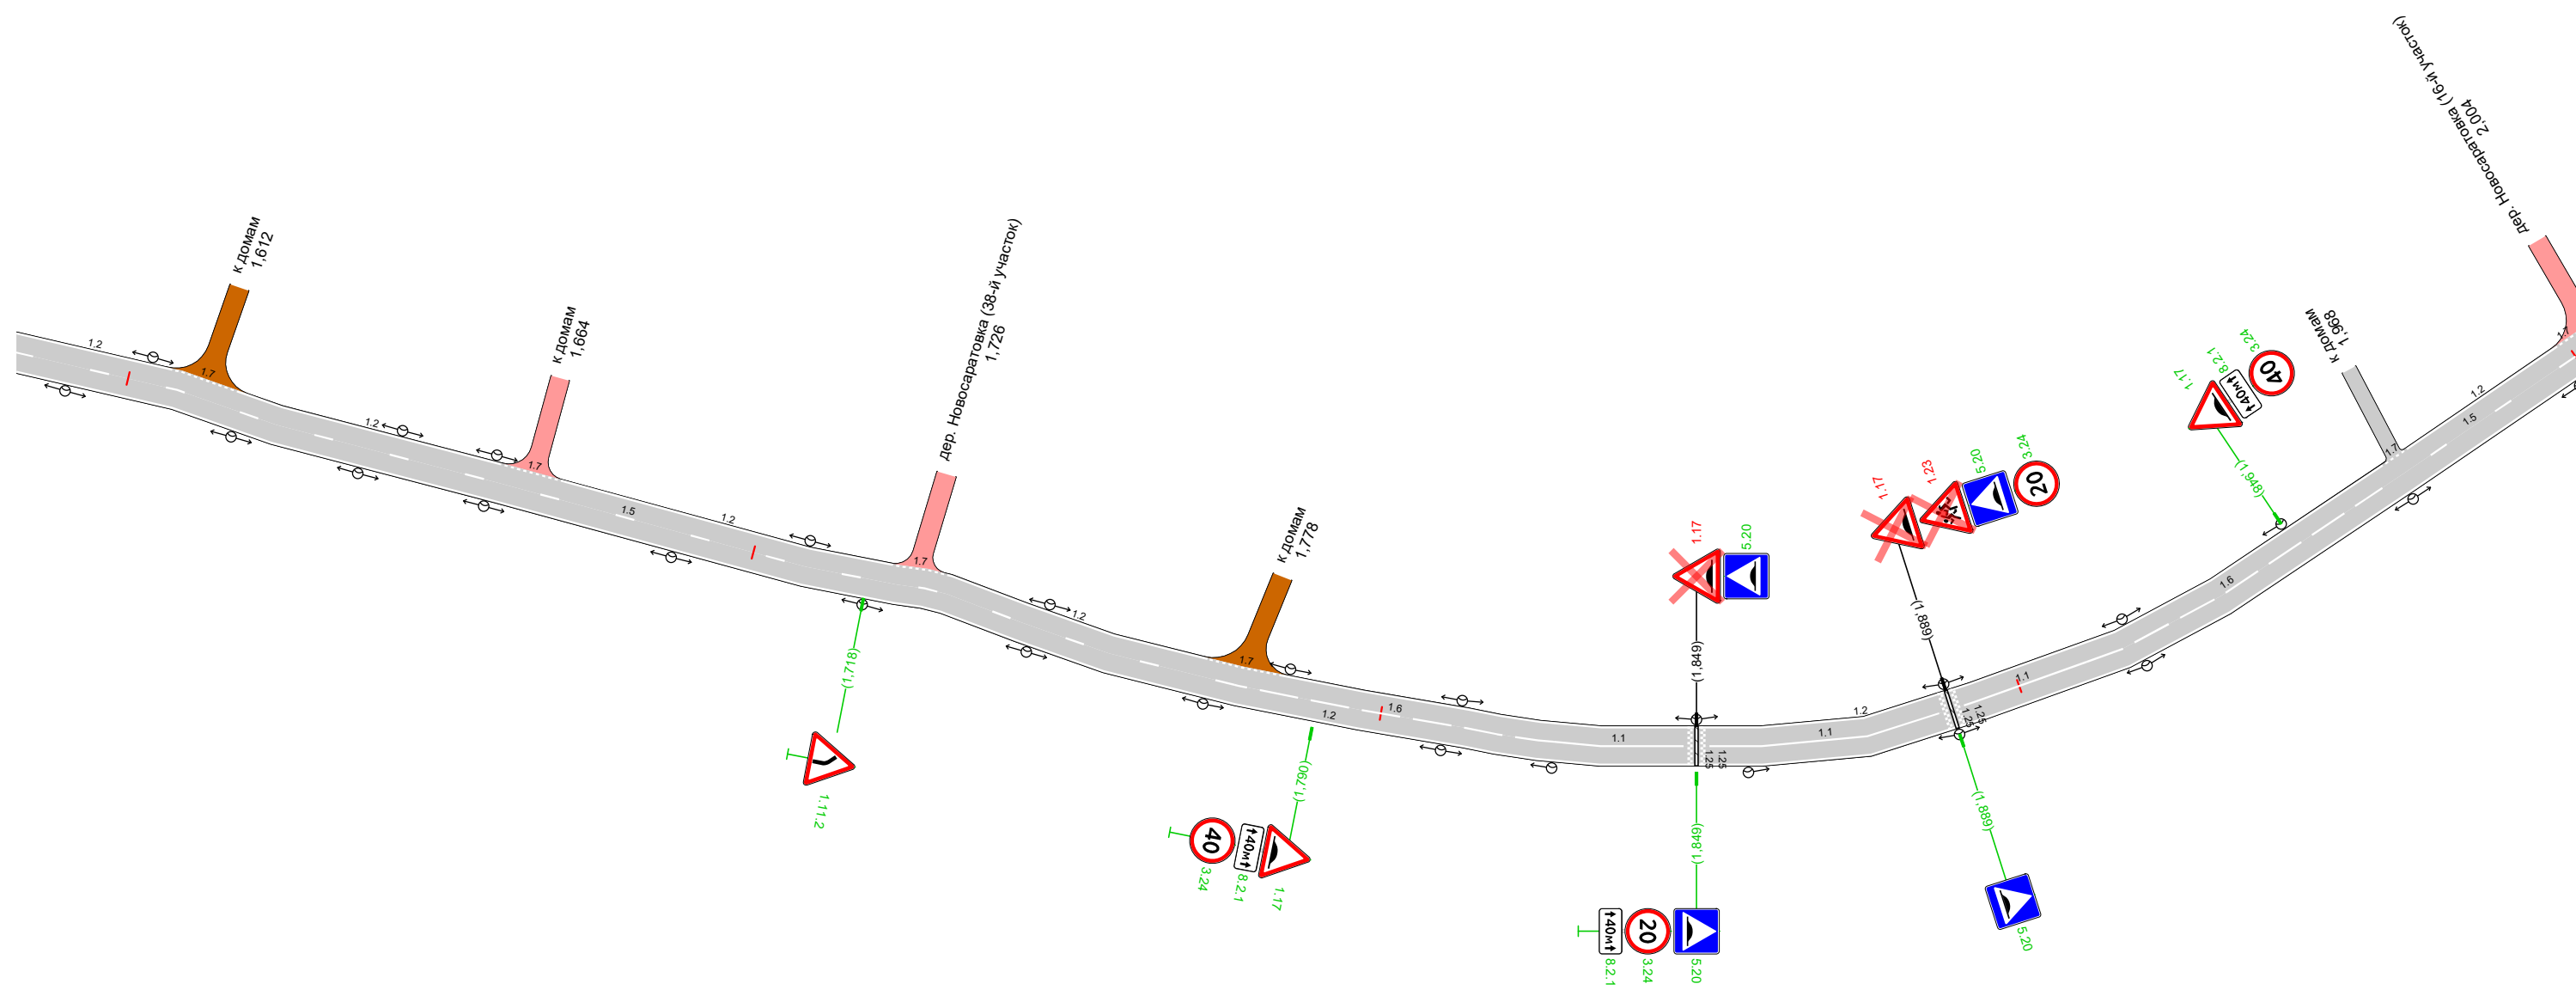



1:1000

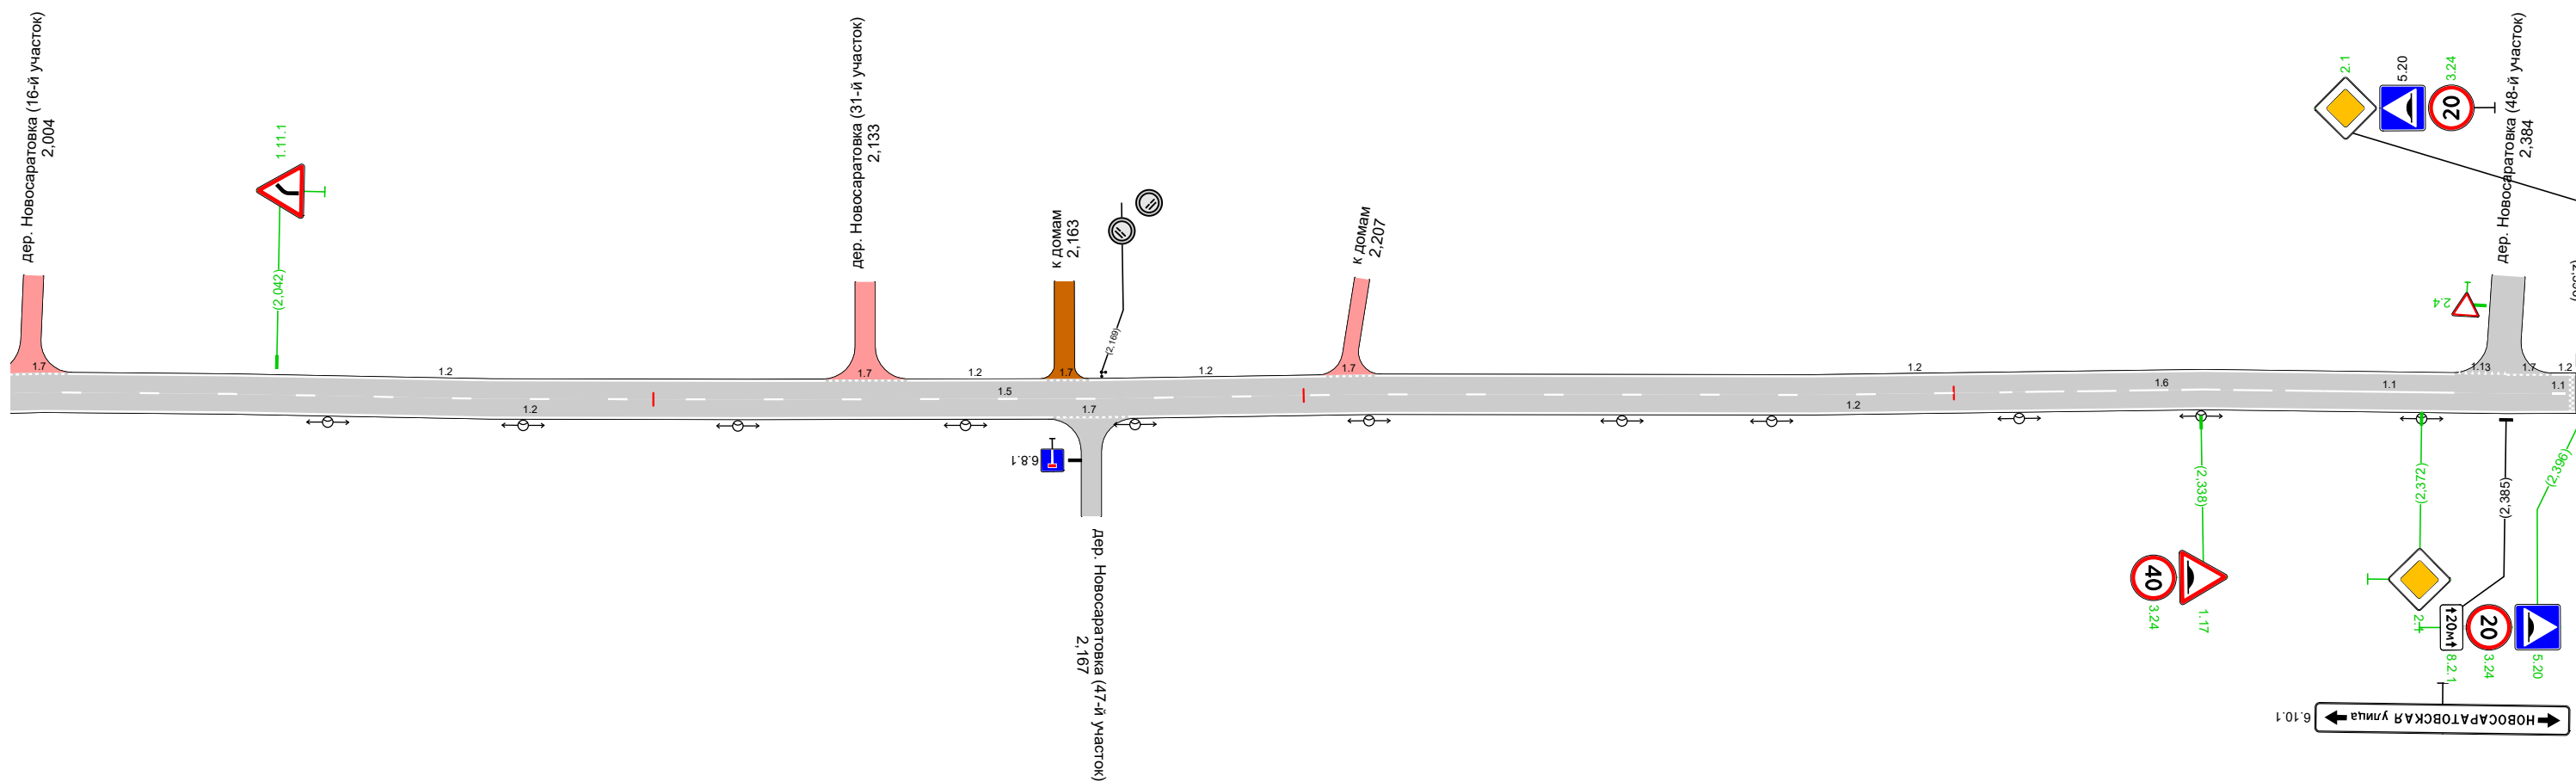

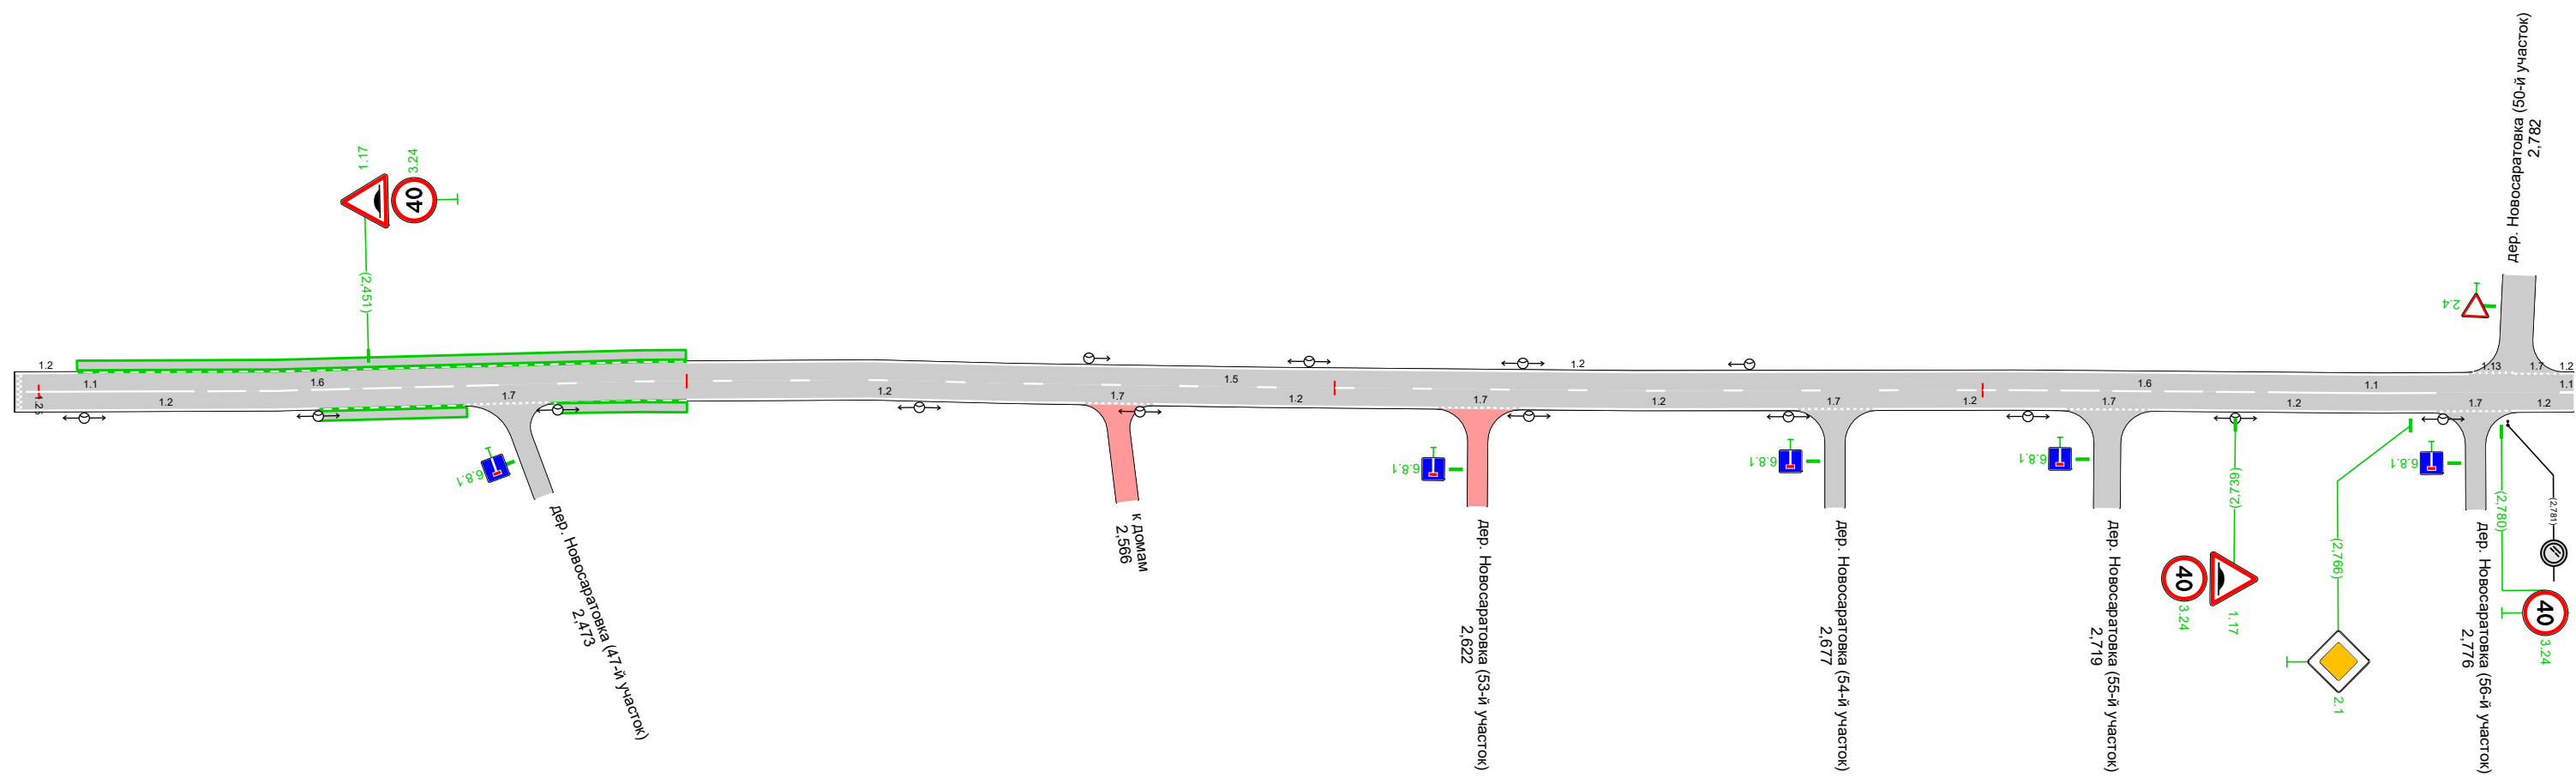

дер. Новосаратовка (10-й участок)
2,791-3,188
1:1000

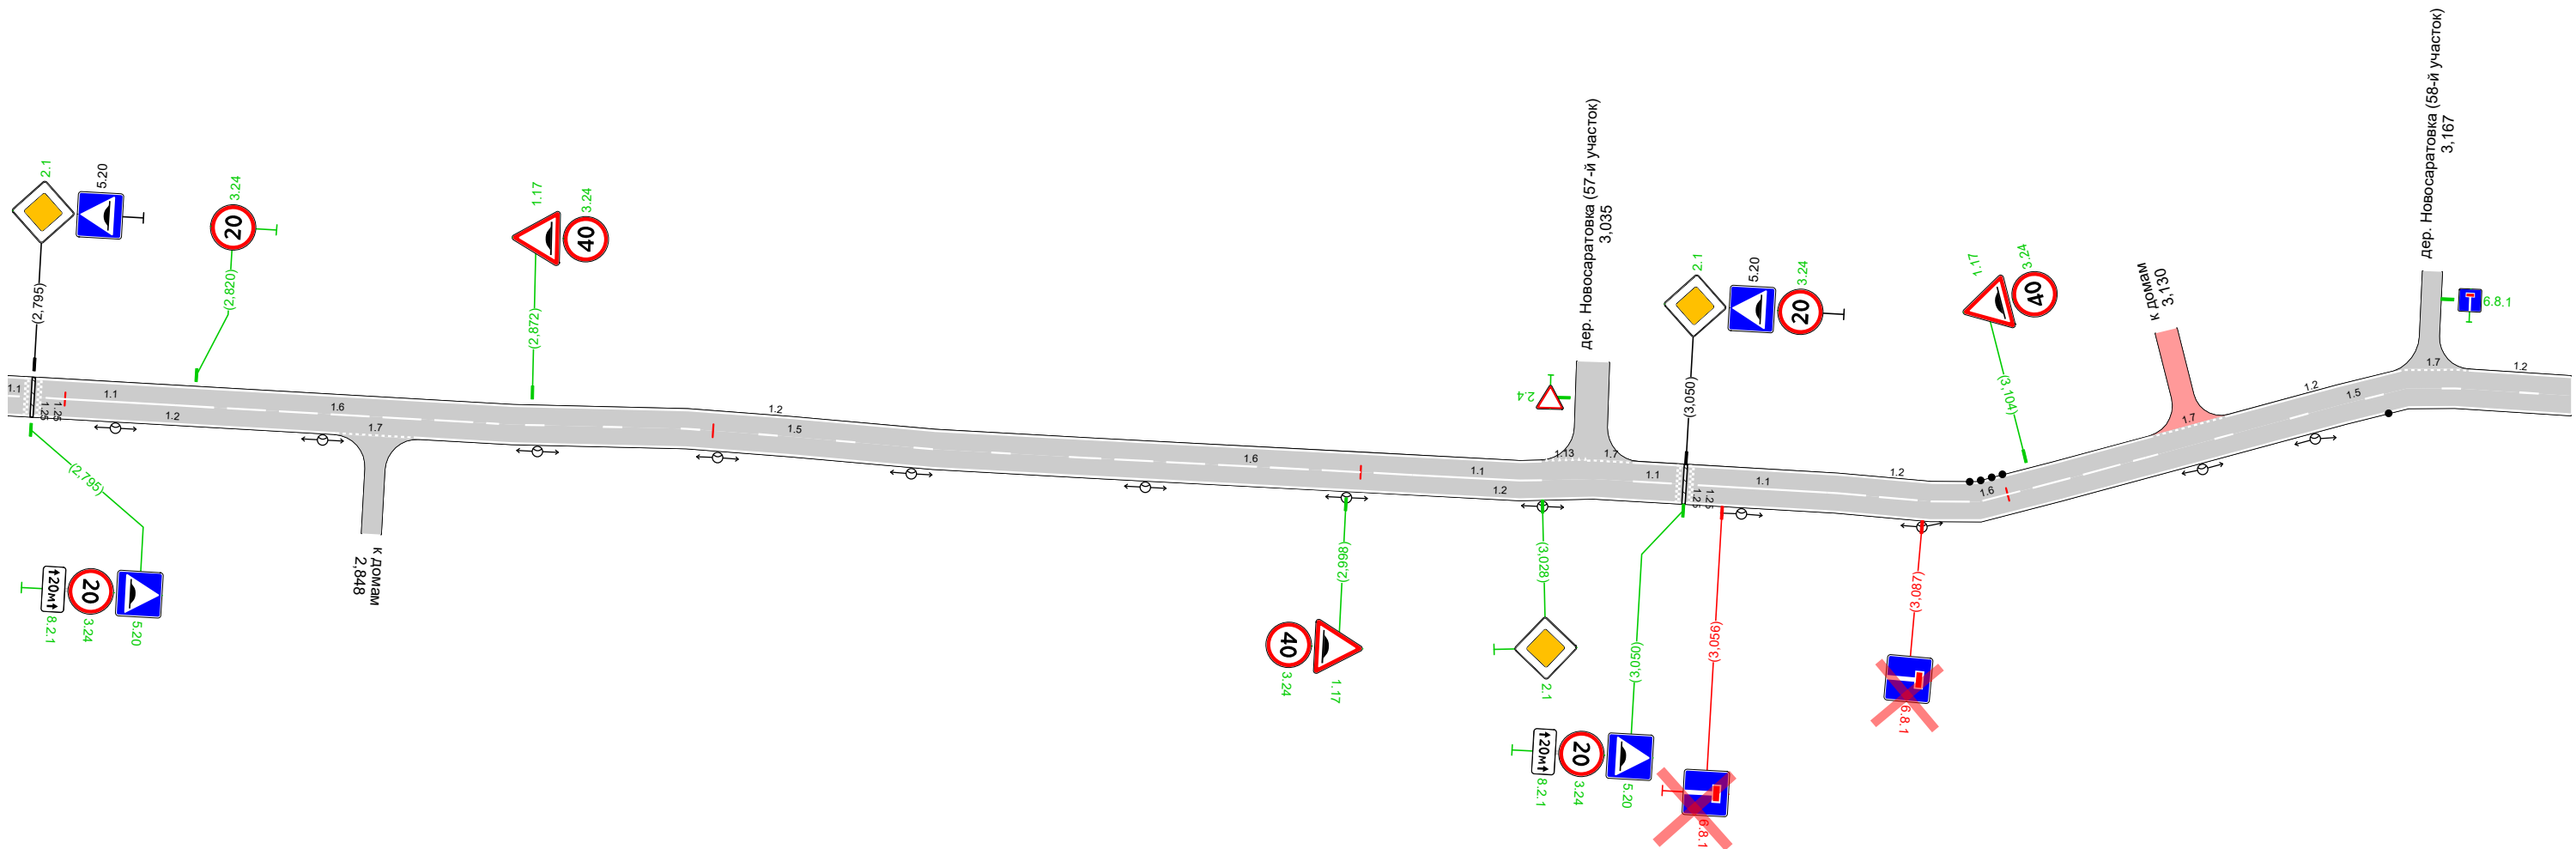




дер. Новосаратовка (10-й участок)

дер. Новоса
3,188-3,350
1:1000

1:1000

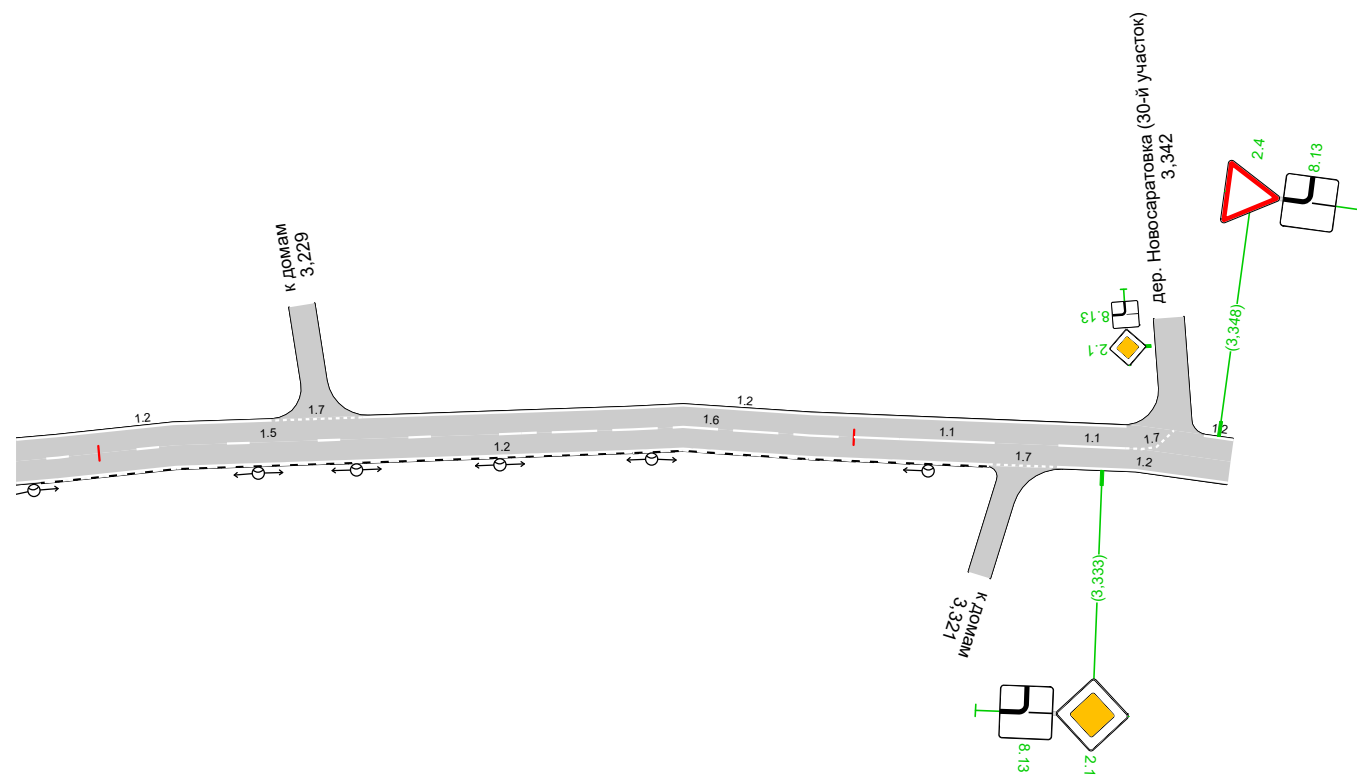

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (10-й участок)

Участок, км,м								Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,25	0,75	0,50	1,50	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60	0,40	—
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м²
0,000 - 1,000	198,0	1792,0	366,0	380,0	73,0	1,95	22,72	264,97
1,000 - 2,000	121,0	1875,0	653,0	200,0	118,0	1,05	14,40	252,28
2,000 - 3,000	86,0	1697,0	630,0	242,0	150,0	2,25	9,60	231,55
3,000 - 3,350	67,5	632,8	134,0	108,0	57,3	1,05	4,80	90,20
Длина, км	0,473	5,997	1,783	0,930	0,398			
Привед. длина, км	0,473	5,997	0,446	0,697	0,199			7,812
Площадь, м²	47,25	599,68	44,57	69,75	19,91	6,30	51,52	838,99

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (10-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,226	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,248	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,471	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,486	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,308	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,330	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,372	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,396	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,766	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,795	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		3,028	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		3,050	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		3,333	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		3,348	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						14	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						14	
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		0,188	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,343	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,431	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,537	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,540	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,659	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,797	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,910	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		1,270	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1,390	Требуется установка	1	Слева
1.11.2	Опасный поворот	II		1,718	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1,790	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1,849	К демонтажу	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		1,889	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II		1,889	К демонтажу	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		1,948	Требуется установка	1	Слева
1.11.1	Опасный поворот	II		2,042	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		2,338	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		2,451	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		2,739	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		2,872	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		2,998	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		3,104	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						20	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						3	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						23	
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,248	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,248	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,283	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,283	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,486	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,486	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,609	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,609	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,850	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,850	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		1,330	Установлен	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
5.20	Искусственная неровность	II		1,330	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		1,849	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		1,849	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		1,889	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		1,889	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		2,396	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		2,396	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		2,795	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		2,795	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		3,050	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		3,050	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						5	
Итого требуется установить:						17	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						22	
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,188	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,248	Требуется установка	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II		0,253	К демонтажу	1	Справа
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,283	К демонтажу	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,283	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,343	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,431	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,486	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,486	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,537	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,540	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,609	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,609	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,639	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,659	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,797	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,850	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,850	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,910	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,270	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,330	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,330	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,390	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,790	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,849	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,889	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,948	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,338	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,396	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,396	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,451	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,739	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,780	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,795	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,820	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,872	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,998	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		3,050	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		3,050	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		3,104	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						38	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						2	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						40	
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,224	Требуется установка	1	Слева
6.10.1	Указатель направлений		1,80	2,385	Установлен	1	Справа
6.8.1	Тупик	II		3,056	К демонтажу	1	Справа
6.8.1	Тупик	II		3,087	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:						1	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						2	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						4	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		0,188	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,226	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		0,248	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,248	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		0,343	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		0,609	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		0,850	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		1,330	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		1,790	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		1,849	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (40м)	Зона действия	II		1,948	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		2,396	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		2,795	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		3,050	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		3,333	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		3,348	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						16	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						16	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						6	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						106	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						7	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						119	

Ведомость обоснования установки запрещающих дорожных знаков

дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Информация на знаке	Обоснование
1	0,188	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
2	0,248	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
3	0,283	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
4	0,343	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
5	0,431	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
6	0,486	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
7	0,486	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
8	0,537	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
9	0,540	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
10	0,609	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
11	0,609	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
12	0,639	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
13	0,659	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
14	0,797	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
15	0,850	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
16	0,850	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
17	0,910	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Информация на знаке	Обоснование
18	1,270	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
19	1,330	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
20	1,330	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
21	1,390	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
22	1,790	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
23	1,849	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
24	1,889	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
25	1,948	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
26	2,338	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
27	2,396	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
28	2,396	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
29	2,451	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
30	2,739	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
31	2,780	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
32	2,795	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
33	2,820	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
34	2,872	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
35	2,998	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	
36	3,050	Справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
37	3,050	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	20	
38	3,104	Слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	40	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Марка	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Статус	Дата установки
1	0,129	0,144	15,0	(марка не задана)			Правая обочина	Населенный пункт	Установлено	

Итого по дороге

Итого		
Статус	Марка	Протяжённость, м
Установлено	(марка не задана)	15,0

Ведомость размещения пешеходных ограждений

дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Марка	Высота, м	Материал	Объект установки
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,129	0,144	15,0	15,0			Правая обочина	(марка не задана)	0,75		Населенный пункт
Итого:			15,0	15,0	0,0						

Ведомость размещения сигнальных столбиков

дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м/шт	Расположение	Тип	Материал	Статус	Объект установки	Дата установки
1	3,094	3,100	5,2/4	Левая обочина	(тип не задан)	Металл	Установлено	На обочине	
2	3,160	3,160	0/1	Правая обочина	(тип не задан)	Металл	Установлено	На обочине	

Итого по дороге

Итого		
Статус	Тип	Протяжённость, м/шт
Установлено	(тип не задан)	5,2/5

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,053	0,408	Населенный пункт	8/8	355	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,226	1,827	Населенный пункт	49/49	1601	Соответствует нормам	Правая кромка
3	1,073	1,331	Населенный пункт	5/5	258	Соответствует нормам	Левая кромка
4	1,573	1,948	Населенный пункт	12/12	375	Соответствует нормам	Левая кромка
5	1,857	3,310	Населенный пункт	44/44	1453	Соответствует нормам	Правая кромка
6	2,562	2,664	Населенный пункт	4/4	102	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Статус	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	122/122	4144

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров
дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Статус
1	0,000	0,123	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	122	184	Требуется строительство
2	2,406	2,500	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	94	141	Требуется строительство
3	2,443	2,466	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	23	34	Требуется строительство
4	2,480	2,500	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	20	30	Требуется строительство

Итого по дороге

Итого		
Статус	Протяжённость, м	Площадь, м²
Требуется строительство	259	389

Ведомость размещения искусственных неровностей
дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,248	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Соответствует
2	0,283	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Соответствует
3	0,486	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Соответствует
4	0,609	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Соответствует
5	0,850	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Соответствует
6	1,330	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует
7	1,849	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует
8	1,889	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует
9	2,396	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует
10	2,795	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует
11	3,050	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,10	0,05	-	Соответствует

Итого по дороге


Итого	
Статус	Количество
Соответствует	11

Ведомость размещения водопропускных труб
дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Расположение	Местоположение, км,м	Угол, °	Форма сечения	Размер отверстия, м	Длина, м	Количество очков	Материал
1	Основная дорога	0,967	90	Круглая	d=0,40	18,00	1	Железобетон

Ведомость размещения дорожных зеркал
дер. Новосаратовка (10-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Типоразмер	Световозвращающие элементы	Статус
1	2,169	Слева	II – Нормальный d = 800 мм	Нет	Установлено
2	2,169	Слева	II – Нормальный d = 800 мм	Нет	Установлено
3	2,781	Справа	I – Малый d = 600 мм	Нет	Установлено

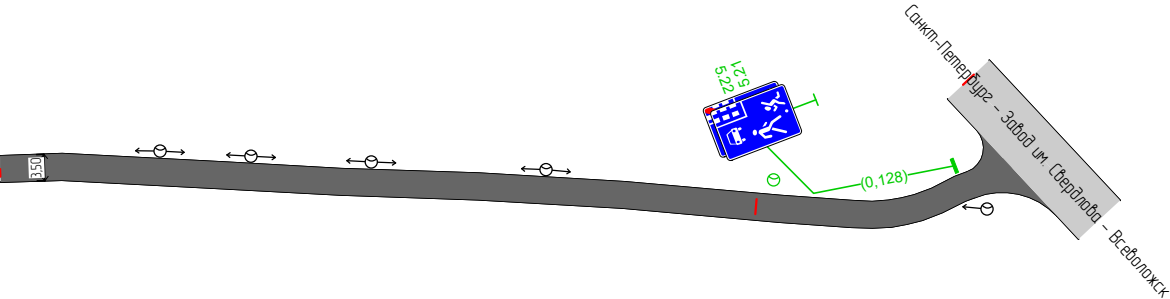

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (11-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,128	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,128	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (11-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,000	0,130	Населенный пункт	6/6	130	Установлено	Правая кромка
2	0,102	0,102	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	6/6	130
Требуется	1/1	0



дер. Новосаратовка (12-й участок)

0,000-0,085

1:1000

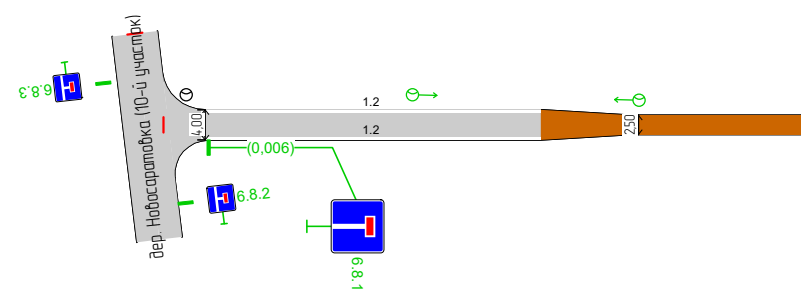

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (12-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,085	90,00	9,00
Длина, км	0,090	
Привед. длина, км	0,090	0,090
Площадь, м²	9,00	9,00

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (12-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,006	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					


Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (12-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,003	Населенный пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,033	0,063	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Левая кромка
Итого							
Состояние		Опор/ светильников, шт		Протяженность, м			
Установлено		1/1		0			
Требуется		2/2		30			



дер. Новосаратовка (13-й участок)
0,000-0,117
1:1000

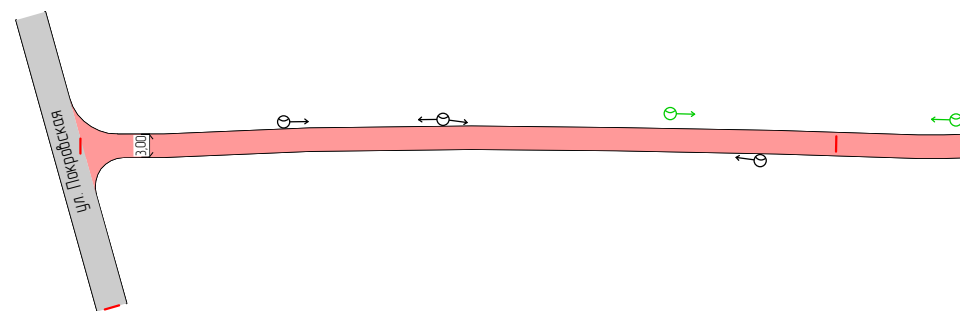


Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (13-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,027	0,090	Населенный пункт	3/3	63	Установлено	Правая кромка
2	0,078	0,116	Населенный пункт	2/2	38	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	3/3	63
Требуется	2/2	38

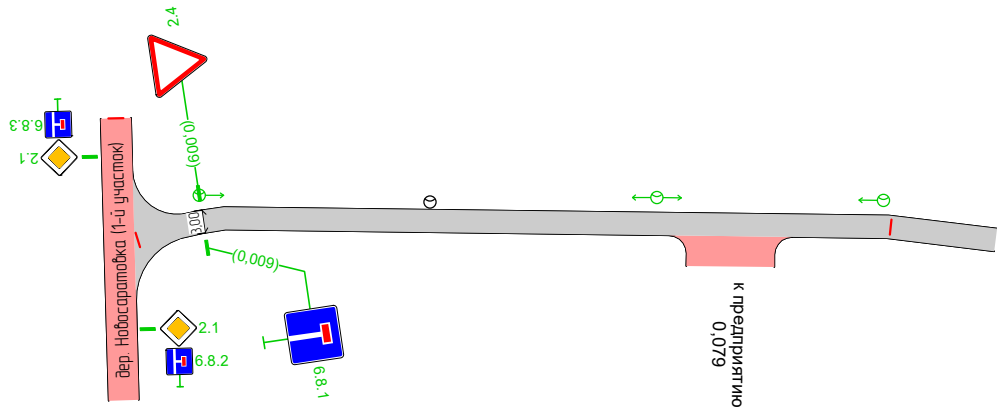

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (14-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,009	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					


Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (14-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,099	Населенный пункт	3/3	90	Требуется	Левая кромка
2	0,039	0,039	Населенный пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	90
Установлено	1/1	0

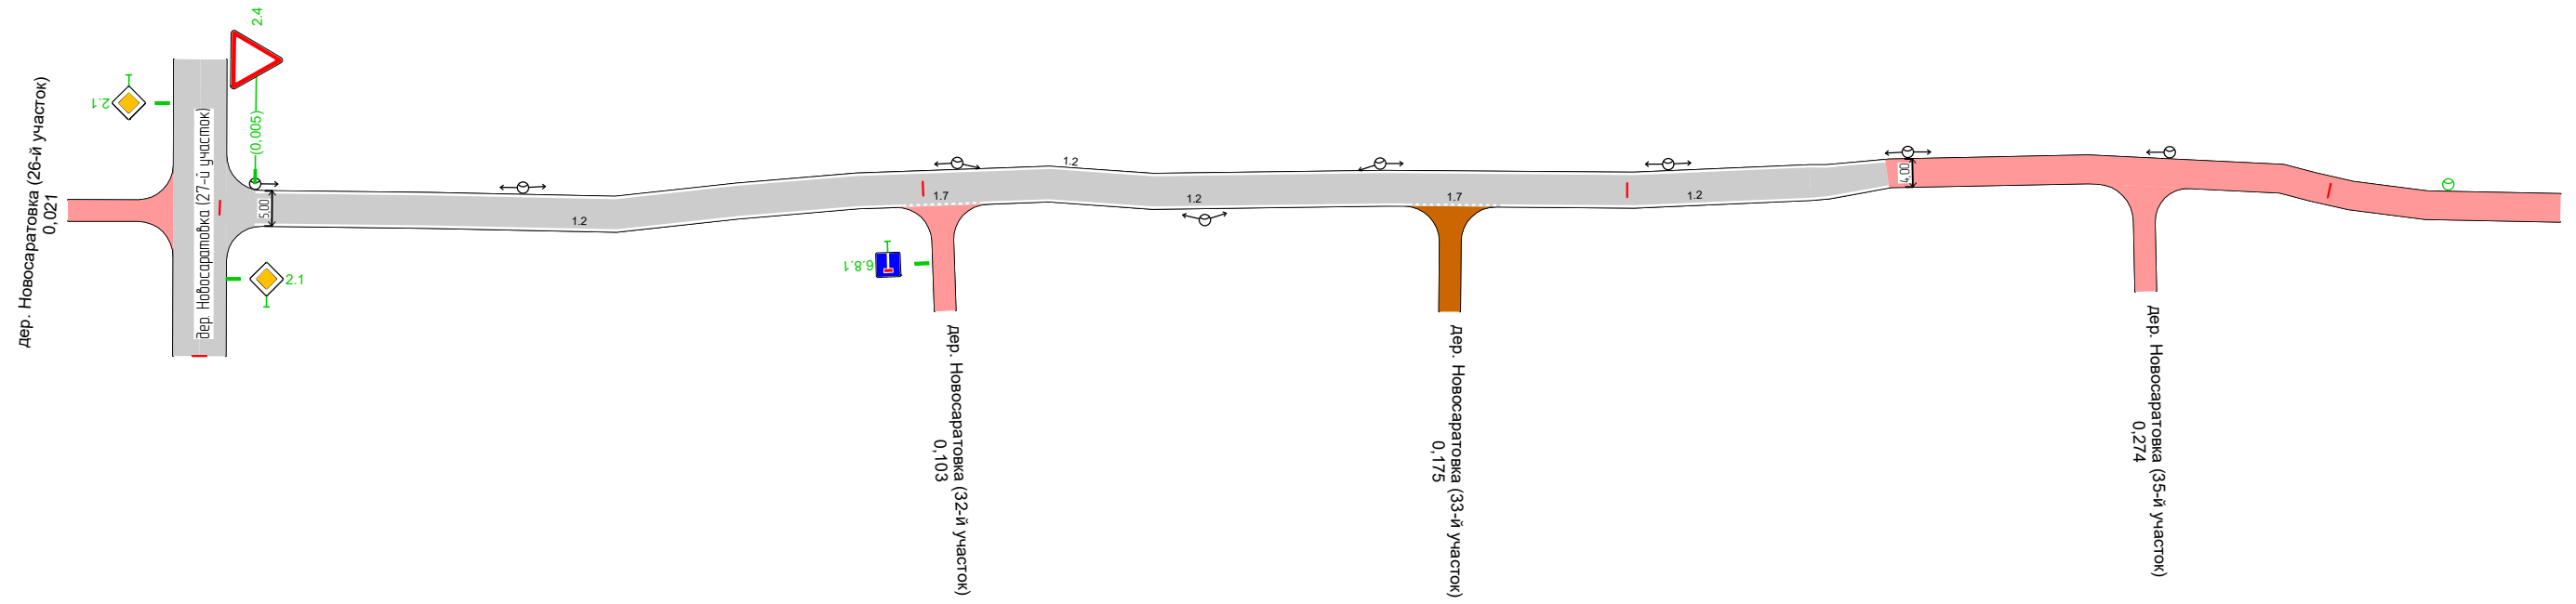

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (15-й участок)

Участок, км,м	1.2 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	—
Ширина, м	0,10	0,10	—
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,333	440,0	24,0	45,20
Длина, км	0,440	0,024	
Привед. длина, км	0,440	0,012	0,452
Площадь, м²	44,00	1,20	45,20

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (15-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (15-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,277	Населенный пункт	8/8	272	Соответствует нормам	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
2	0,317	0,317	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	8/8	272
Требуется установка	1/1	0



дер. Новосаратовка (16-й участок)

0,000-0,143

1:1000

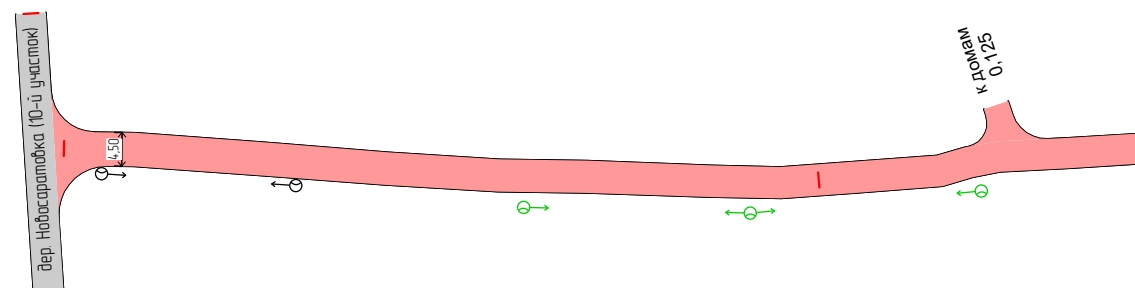

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (16-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,031	Населенный пункт	2/2	26	Установлено	Правая кромка
2	0,061	0,121	Населенный пункт	3/3	60	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	2/2	26
Требуется	3/3	60



дер. Новосаратовка (17-й участок)
0,000-0,240
1:1000

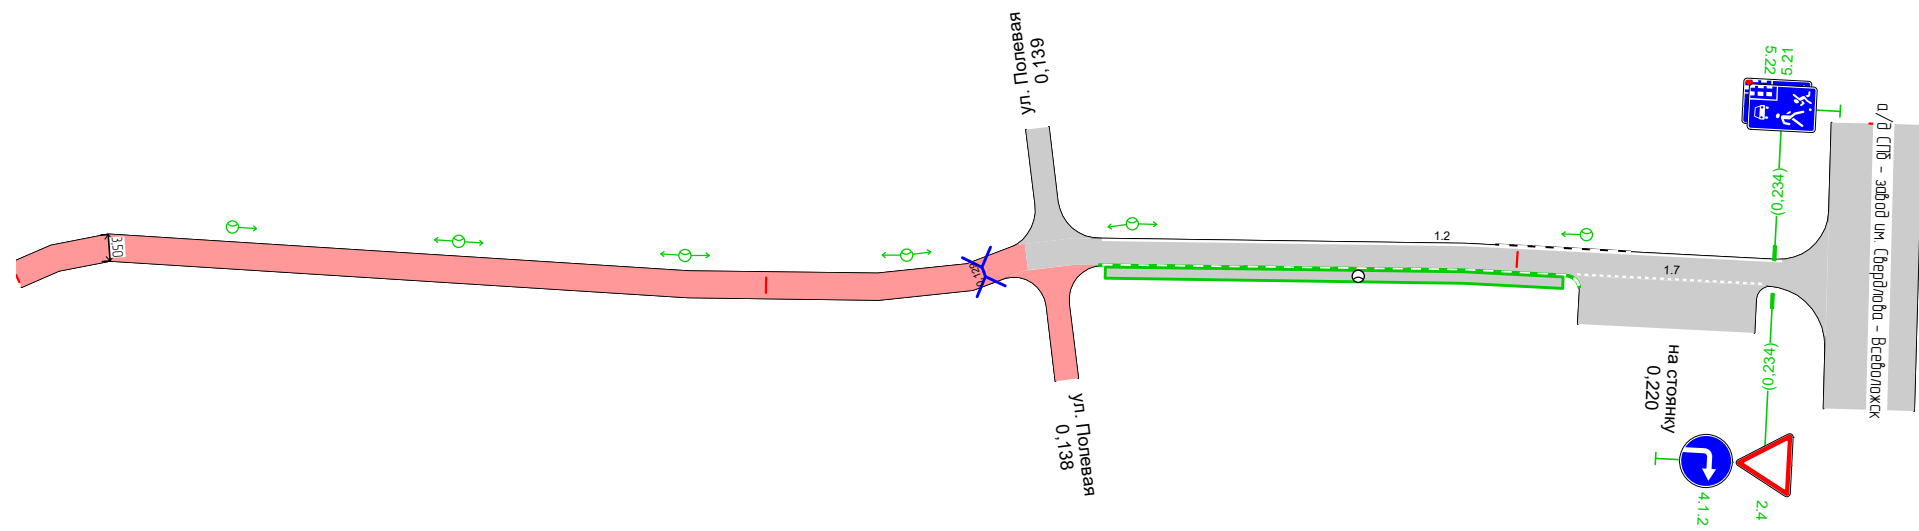

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (17-й участок)

Участок, км,м	1.2 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	—
Ширина, м	0,10	0,10	—
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,240	90,0	25,0	10,25
Длина, км	0,090	0,025	
Привед. длина, км	0,090	0,013	0,103
Площадь, м²	9,00	1,25	10,25

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (17-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,234	Требуется установка	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,234	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						2	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						2	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (18-й участок)

Участок, км,м	1.2 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Кэф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	—
Ширина, м	0,10	0,10	—
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,219	408,0	13,0	41,45
Длина, км	0,408	0,013	
Привед. длина, км	0,408	0,007	0,414
Площадь, м²	40,80	0,65	41,45

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (18-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,089	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,089	К демонтажу	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,106	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (18-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,175	Населенный пункт	5/5	173	Соответствует нормам	Правая кромка
2	0,205	0,205	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	5/5	173
Требуется установка	1/1	0



дер. Новосаратовка (19-й участок)

0,000-0,048

1:1000

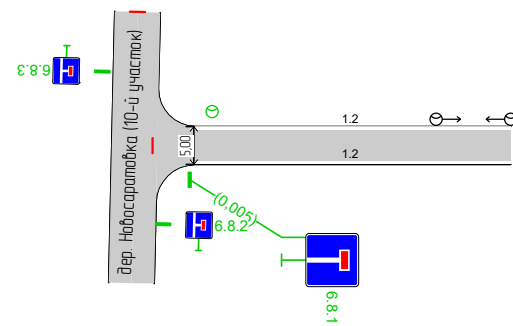

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (19-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,048	86,00	8,60
Длина, км	0,086	
Привед. длина, км	0,086	0,086
Площадь, м²	8,60	8,60

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (19-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,005	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (19-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,008	0,008	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,038	0,048	Населенный пункт	2/2	10	Установлено	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	1/1	0
Установлено	2/2	10



дер. Новосаратовка (20-й участок)

0,000-0,042

1:1000

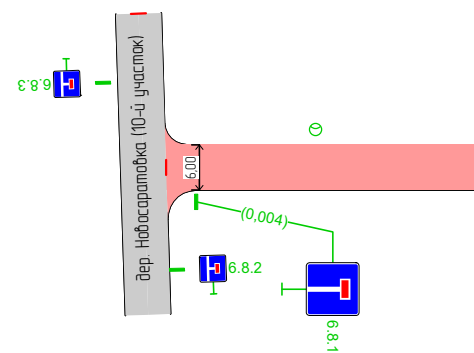

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (20-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,004	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (20-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,020	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	1/1	0



дер. Новосаратовка (21-й участок)

0,000-0,096

1:1000

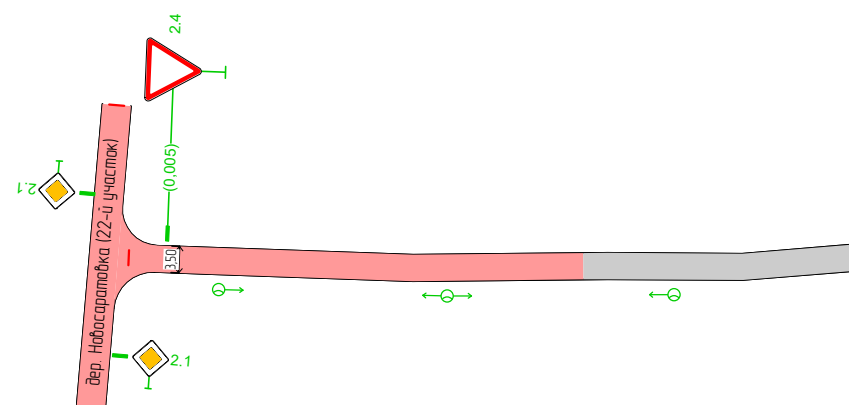

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (21-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				


Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (21-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,072	Населенный пункт	3/3	60	Требуется	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	60

дер. Новосаратовка (22-й участок)
0,000-0,354
1:1000

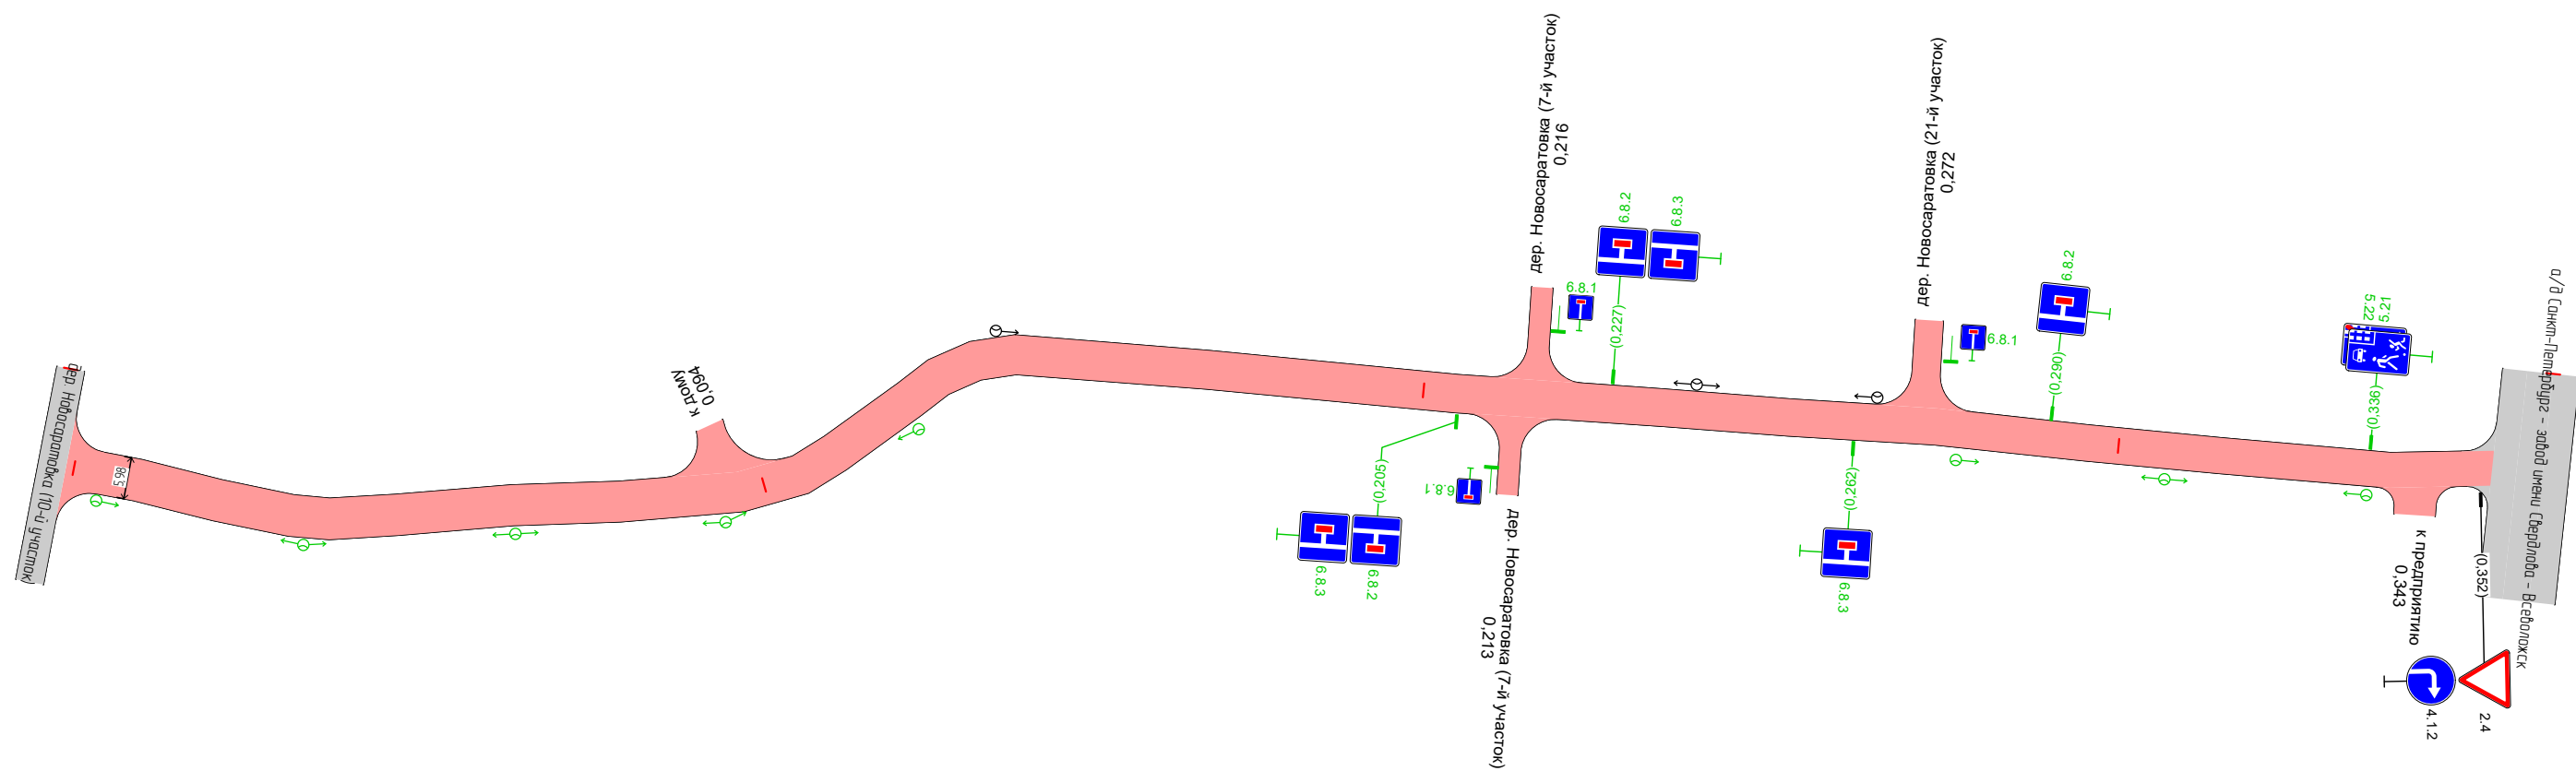

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (22-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,336	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,336	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.8.2	Тупик	II		0,205	Требуется	1	Справа
6.8.3	Тупик	II		0,205	Требуется	1	Справа
6.8.2	Тупик	II		0,227	Требуется	1	Слева
6.8.3	Тупик	II		0,227	Требуется	1	Слева
6.8.3	Тупик	II		0,262	Требуется	1	Справа
6.8.2	Тупик	II		0,290	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (22-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,123	Населенный пункт	5/5	119	Требуется	Правая кромка
2	0,139	0,265	Населенный пункт	3/3	126	Установлено	Левая кромка
3	0,277	0,336	Населенный пункт	3/3	59	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	8/8	178
Установлено	3/3	126

A

дер. Новосаратовка (23-й участок)

0,000-0,235

1:1000

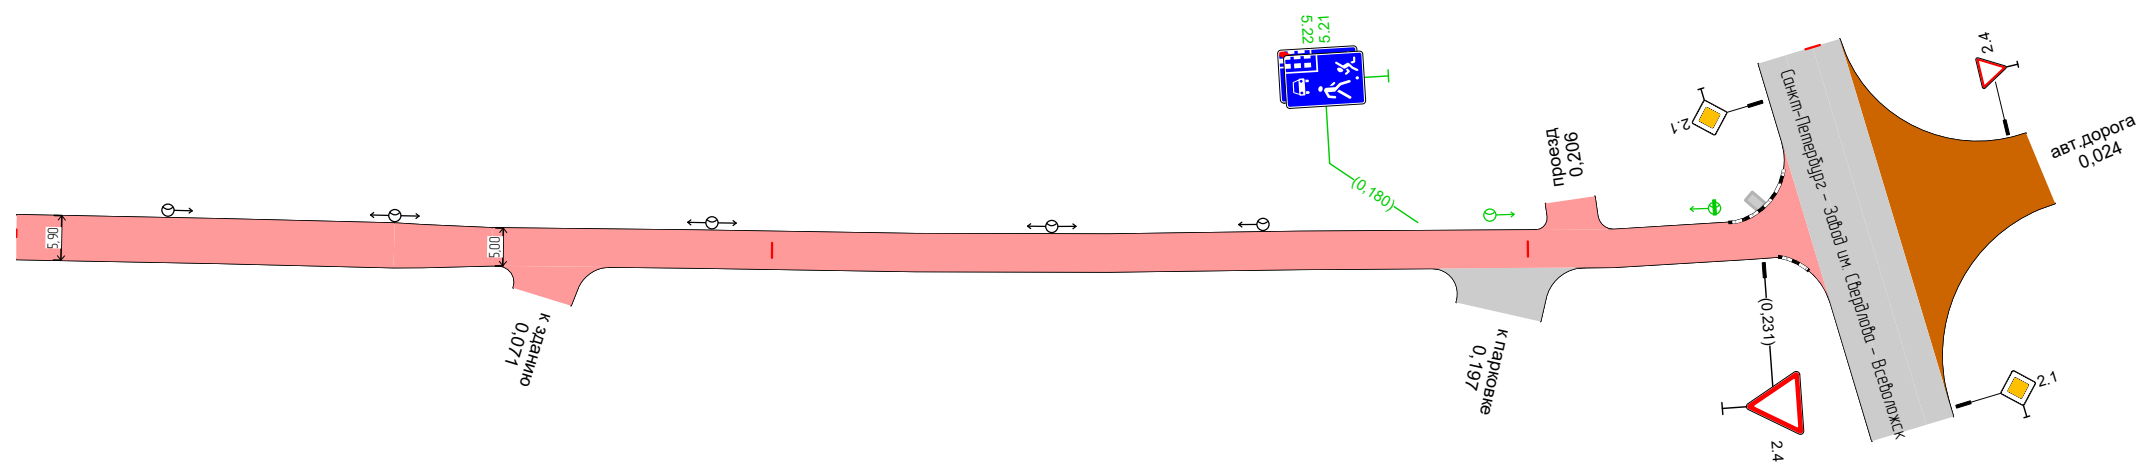

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (23-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,180	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,180	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (23-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,165	Населенный пункт	5/5	145	Установлено	Левая кромка
2	0,195	0,225	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	5/5	145
Требуется	2/2	30


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

дер. Новосаратовка (23-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,230	0,231	Тротуар	Слева	2,3	Населенный пункт	Асфальтобетон	1	3	Установлено
Итого установлено:								1	3	
Итого требуется:								0	0	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								1	3	



дер. Новосаратовка (24-й участок)
0,000-0,242
1:1000

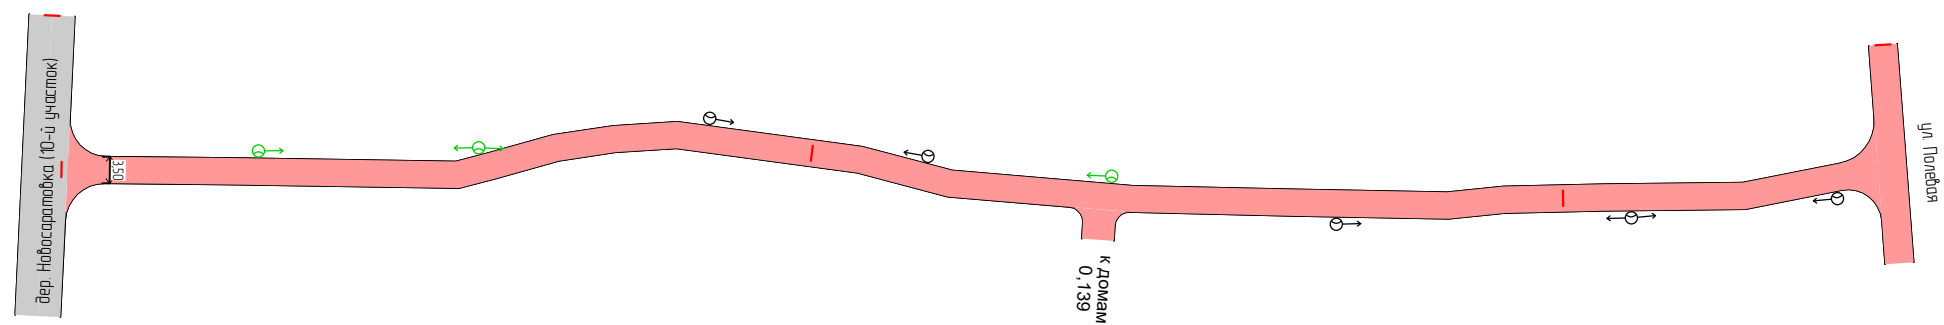

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (27-й участок)

Участок, км,м	1.1 	1.7 	1.13 	1.25 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	1,50	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,10	0,60	0,40	—
Единицы	м	м	м²	м²	м²
0,000 - 0,397	133,0	61,0	1,05	12,48	29,88
Длина, км	0,133	0,061			
Привед. длина, км	0,133	0,031			0,164
Площадь, м²	13,30	3,05	1,05	12,48	29,88

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (27-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		0,020	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,120	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,250	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,290	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,390	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,211	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,232	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II		0,070	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,070	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,200	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,200	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,340	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,340	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		15					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		15					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,014	0,104	Населенный пункт	4/4	90	Требуется установка	Правая кромка
2	0,134	0,227	Населенный пункт	4/4	93	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,257	0,370	Населенный пункт	5/5	113	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	203
Соответствует нормам	4/4	93

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
------	----------------------	---------------------	-----	--------------	-----------	------------------	----------	------------------	-------------	-----------


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,006	0,214	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	208	312	Требуется строительство
2	0,007	0,123	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	116	174	Требуется строительство
3	0,137	0,214	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	77	116	Требуется строительство
4	0,228	0,389	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	161	241	Требуется строительство
5	0,229	0,316	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	87	131	Требуется строительство
6	0,327	0,372	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	45	67	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								694	1041	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								694	1041	

Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,070	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	5,00	0,05	-	Требуется строительство
2	0,200	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	5,50	0,05	-	Требуется строительство
3	0,340	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	6,00	0,05	-	Требуется строительство
Итого:	Соответствует	0						
	Требуется строительство	3						
	К демонтажу	0						
	Требуется реконструкция	0						

дер. Новосаратовка (25-й участок)
0,000-0,291
1:1000

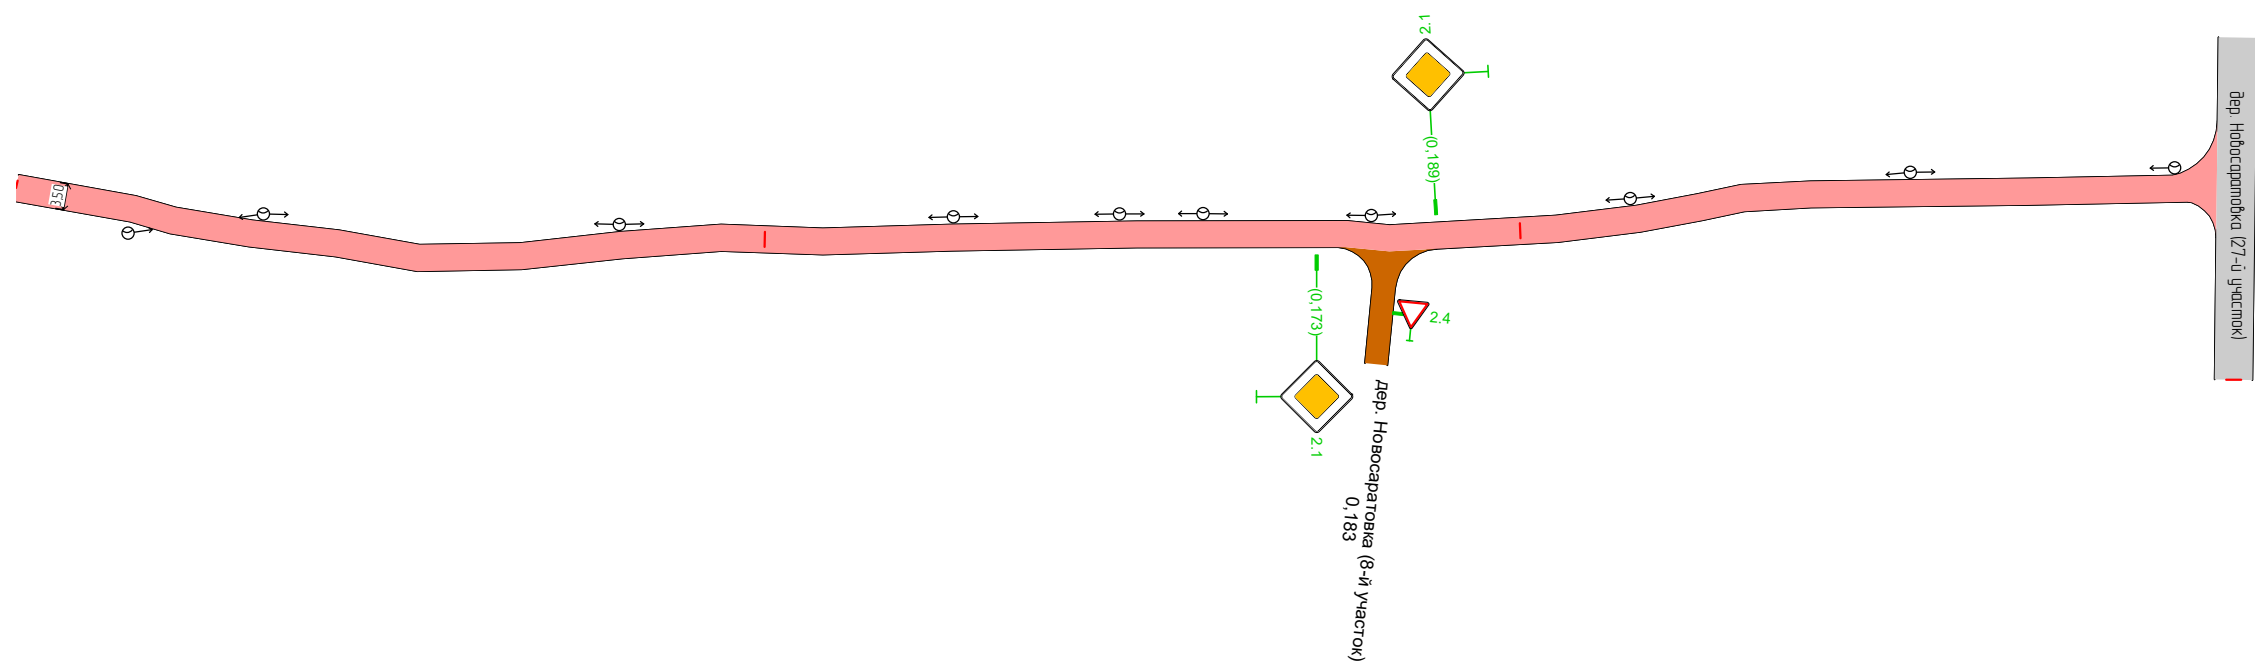

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (25-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,173	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,189	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (25-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,287	Населенный пункт	10/10	271	Установлено	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	10/10	271

дер. Новосаратовка (26-й участок)
0,000-0,134
1:1000

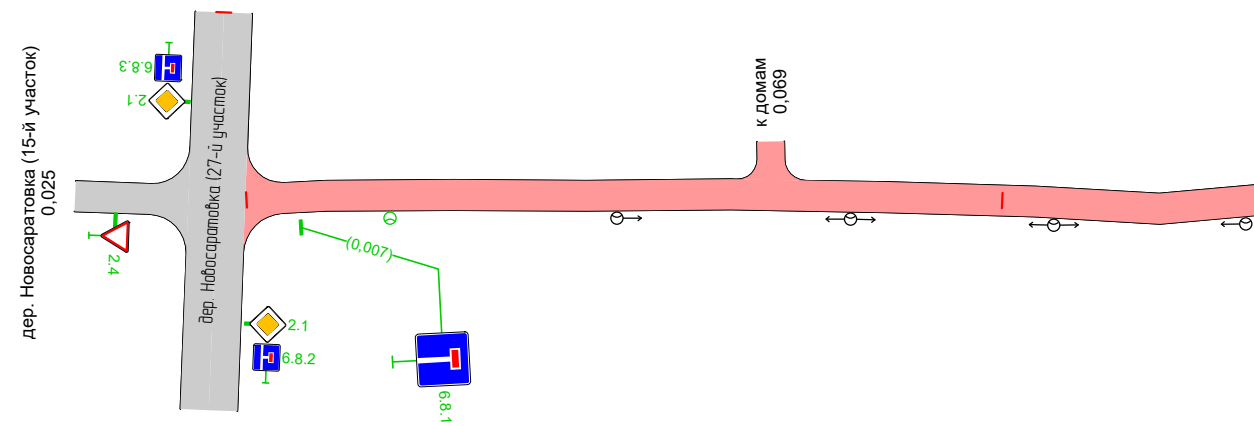

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (26-й участок)


Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,007	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (26-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,019	0,019	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,049	0,132	Населенный пункт	4/4	83	Установлено	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	1/1	0
Установлено	4/4	83

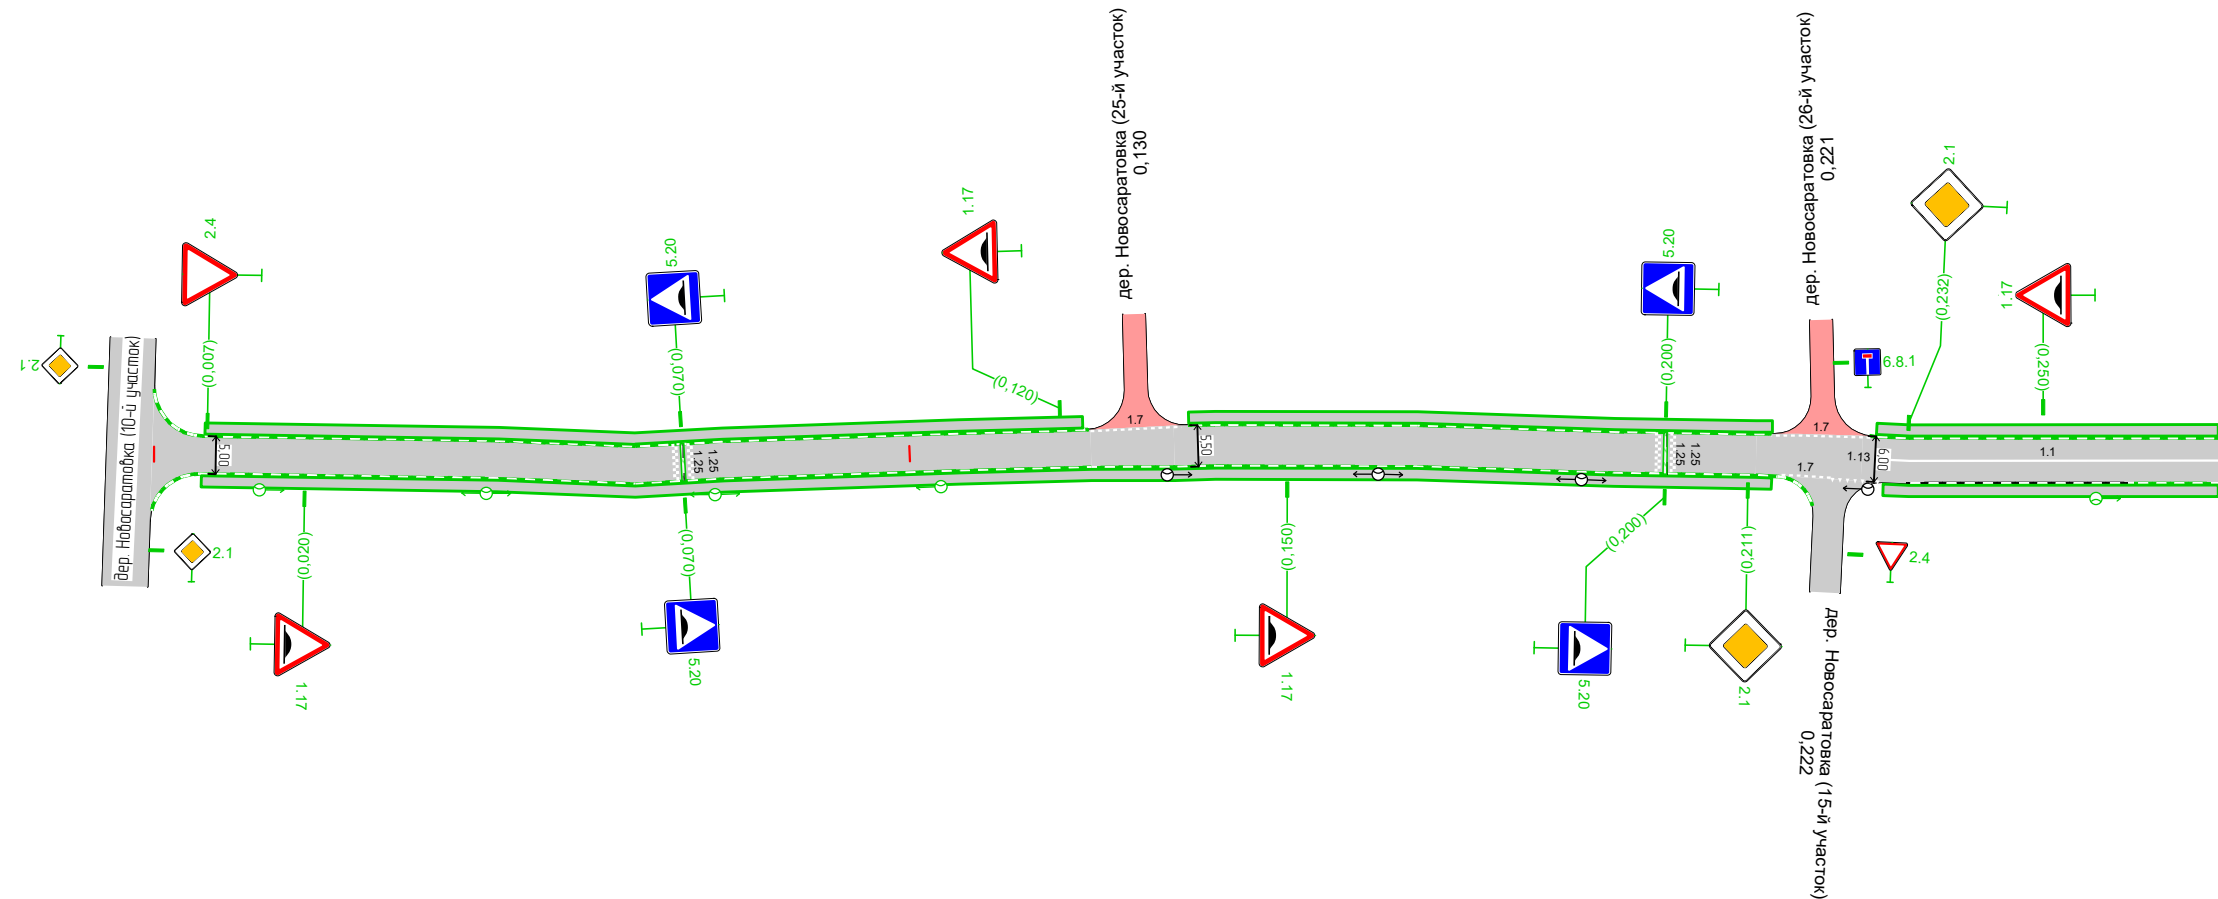



дер. Новосаратовка (27-й участок)
0,273-0,397
1:1000

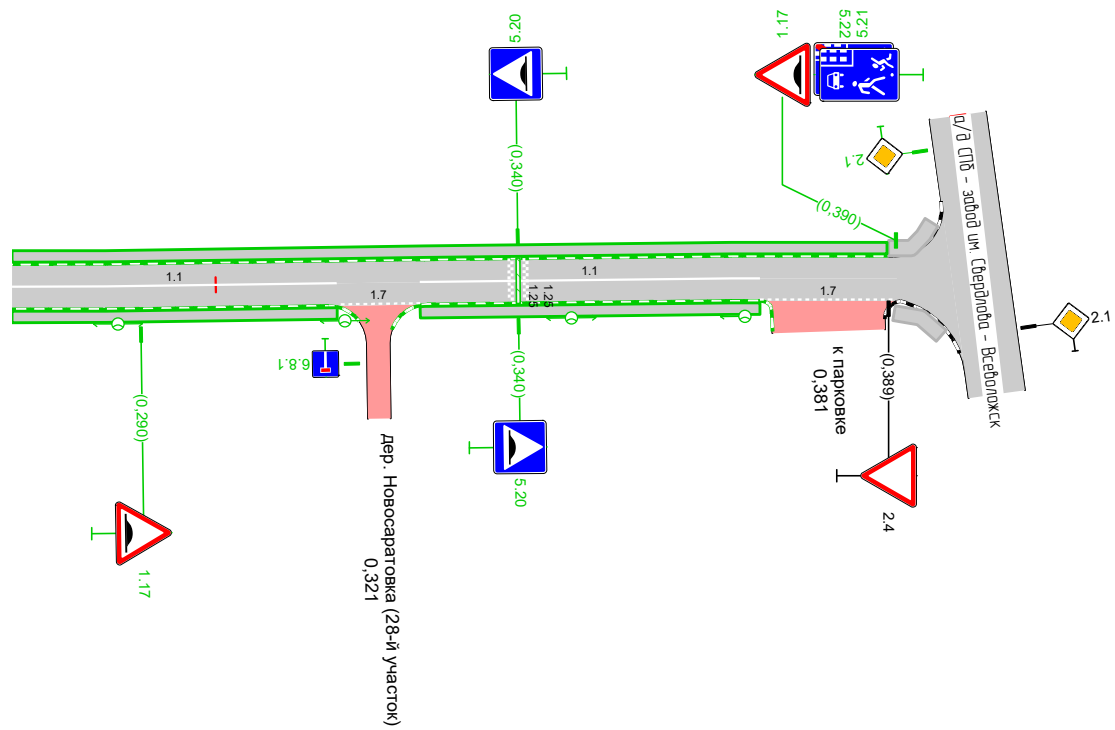

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (27-й участок)

Участок, км,м	1.1 	1.7 	1.13 	1.25 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	1,50	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,10	0,60	0,40	—
Единицы	м	м	м²	м²	м²
0,000 - 0,397	133,0	61,0	1,05	12,48	29,88
Длина, км	0,133	0,061			
Привед. длина, км	0,133	0,031			0,164
Площадь, м²	13,30	3,05	1,05	12,48	29,88

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (27-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,211	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,232	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		0,020	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,120	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,250	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0,290	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0,390	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						6	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						6	
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,070	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,070	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,200	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,200	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,340	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,340	Требуется установка	1	Справа
5.21	Жилая зона	II		0,390	Требуется установка	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,390	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						8	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						17	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						17	

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,014	0,104	Населенный пункт	4/4	90	Требуется установка	Правая кромка
2	0,134	0,227	Населенный пункт	4/4	93	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,257	0,370	Населенный пункт	5/5	113	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Статус	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	4/4	93
Требуется установка	9/9	203

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Статус
1	0,006	0,214	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	208	312	Требуется строительство
2	0,007	0,123	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	116	174	Требуется строительство
3	0,137	0,214	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	77	116	Требуется строительство
4	0,228	0,389	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	161	241	Требуется строительство
5	0,229	0,316	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	87	131	Требуется строительство
6	0,327	0,372	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	45	67	Требуется строительство

Итого по дороге

Итого		
Статус	Протяжённость, м	Площадь, м²
Требуется строительство	694	1041

Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Новосаратовка (27-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,070	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	5,00	0,05	-	Требуется строительство
2	0,200	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	5,50	0,05	-	Требуется строительство
3	0,340	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,00	0,05	-	Требуется строительство

Итого по дороге


Итого	
Статус	Количество
Требуется строительство	3



дер. Новосаратовка (28-й участок)

0,000-0,171

1:1000

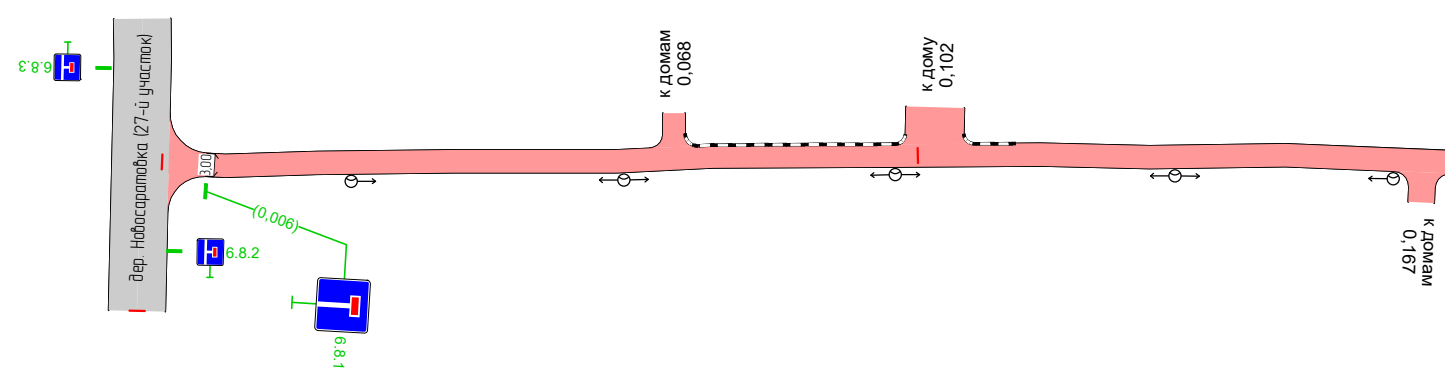

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (28-й участок)


Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,006	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (28-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,163	Населенный пункт	5/5	138	Установлено	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	5/5	138

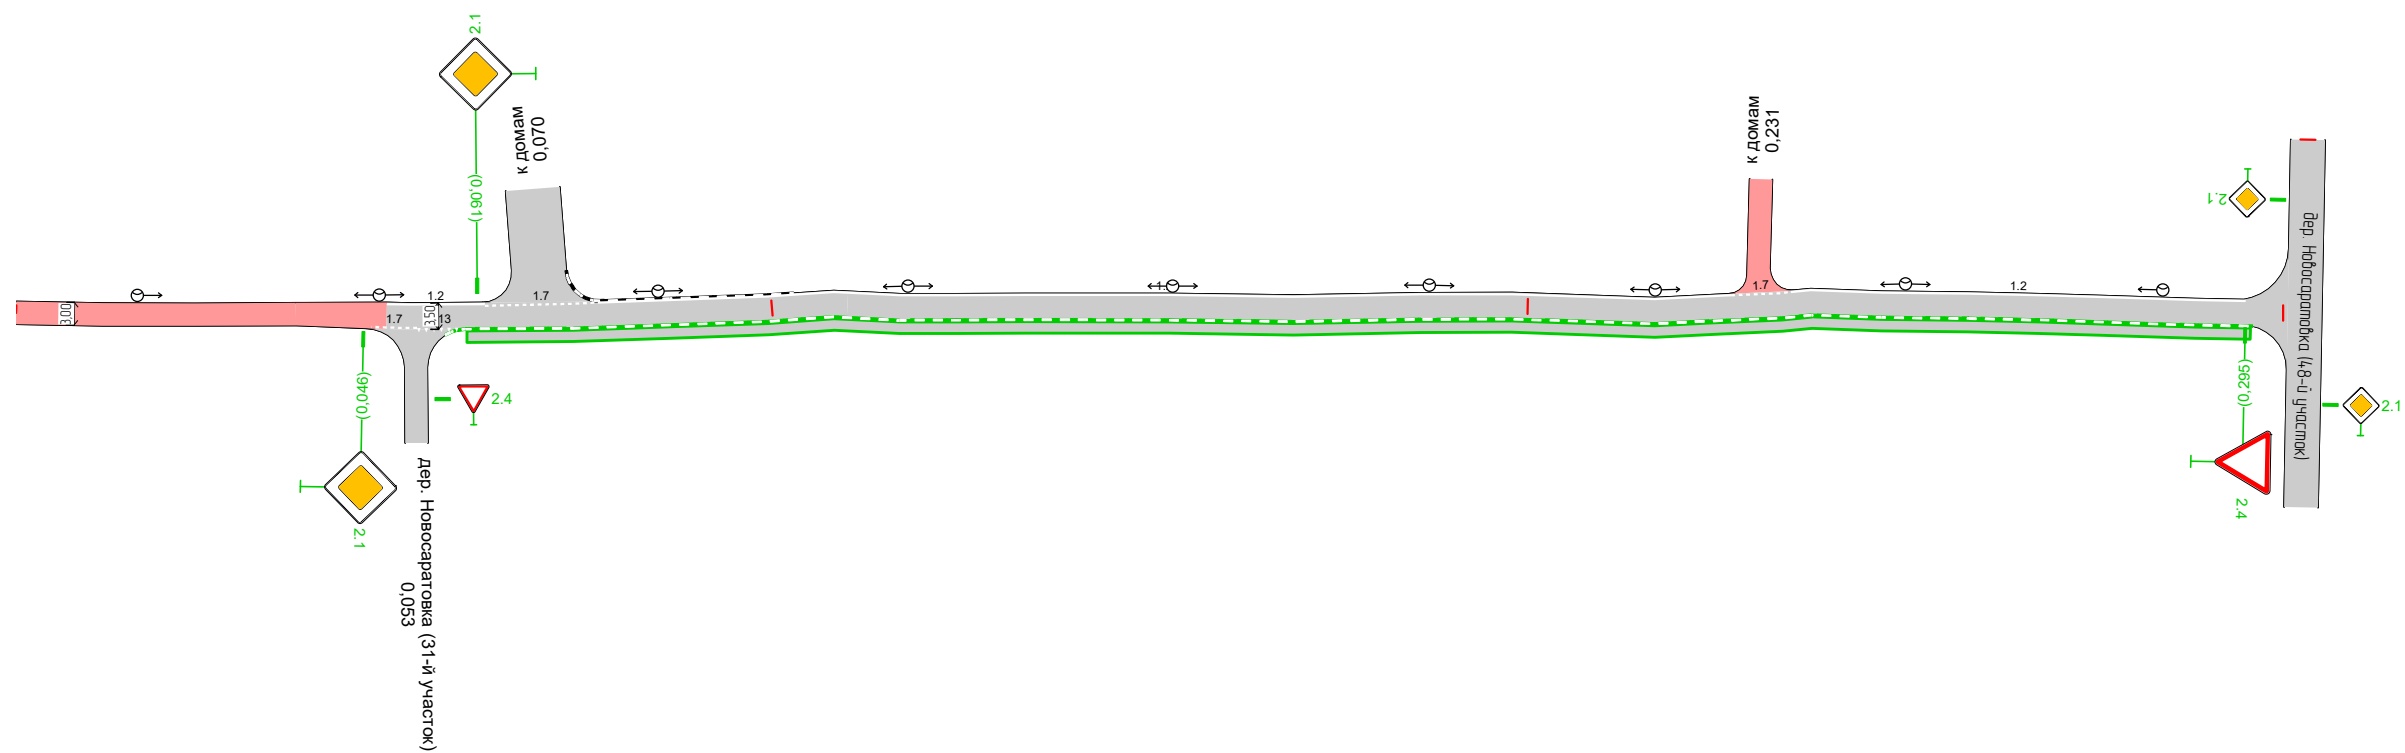

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (29-й участок)

№ км	1.2 	1.7 	1.13 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	1,50	0,00
Ширина, м	0,10	0,10	0,60	0,00
Единицы	м	м	м²	м²
0,000 - 0,300	223,00	29,00	0,90	24,65
Длина, км	0,223	0,029		
Привед. длина, км	0,223	0,015		0,238
Площадь, м²	22,30	1,45	0,90	24,65

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (29-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,046	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,061	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,295	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (29-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,284	Населенный пункт	9/9	268	Установлено	Левая кромка
Итого							
Состояние		Опор/ светильников, шт		Протяженность, м			
Установлено		9/9		268			

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

дер. Новосаратовка (29-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Состояние
1	0,060	0,296	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	236	Требуется
Итого установлено:								0 м	
Итого требуется:								236 м	
Итого к демонтажу:								0 м	
Итого:								236 м	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (30-й участок)

Участок, км,м	1.2	1.25	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,40	—
Единицы	м	м²	м²
0,000 - 0,202	377,0	6,40	44,10
Длина, км	0,377		
Привед. длина, км	0,377		0,377
Площадь, м²	37,70	6,40	44,10

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (30-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,194	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,010	Требуется установка	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	II		0,010	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,050	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,050	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
8.13	Направление главной дороги	II		0,194	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (30-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,198	Населенный пункт	6/6	186	Соответствует нормам	Левая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	6/6	186

Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Новосаратовка (30-й участок)


№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,050	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	4,00	0,05	-	Требуется строительство
2	0,150	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	4,00	0,05	-	Требуется строительство
Итого:	Соответствует	0						
	Требуется строительство	2						
	К демонтажу	0						
	Требуется реконструкция	0						



дер. Новосаратовка (31-й участок)

0,000-0,176

1:1000

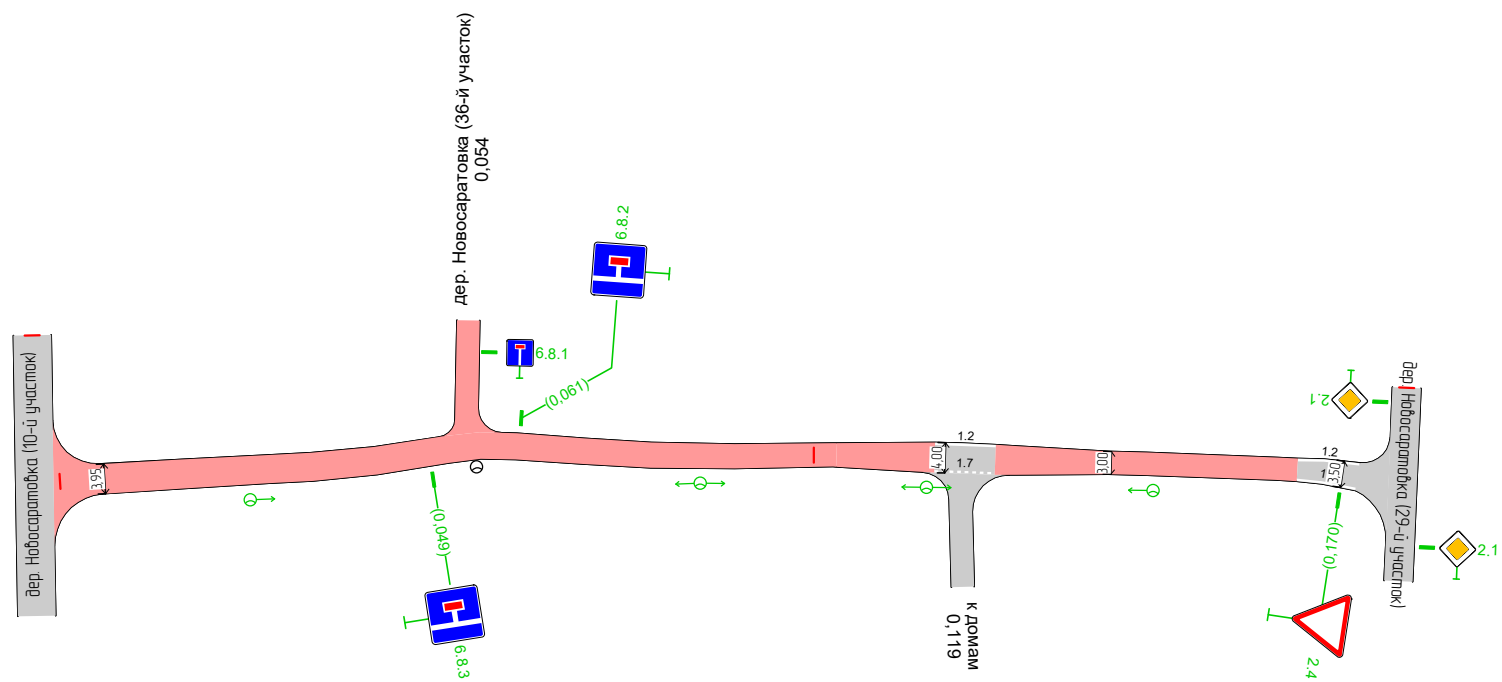

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (31-й участок)

№ км	1.2 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	0,00
Ширина, м	0,10	0,10	0,00
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,176	24,01	8,00	2,80
Длина, км	0,024	0,008	
Привед. длина, км	0,024	0,004	0,028
Площадь, м²	2,40	0,40	2,80

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (31-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,170	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.8.3	Тупик	II		0,049	Требуется	1	Справа
6.8.2	Тупик	II		0,061	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (31-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,145	Населенный пункт	4/4	120	Требуется	Правая кромка
2	0,055	0,055	Населенный пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	4/4	120
Установлено	1/1	0



дер. Новосаратовка (32-й участок)

0,000-0,120

1:1000

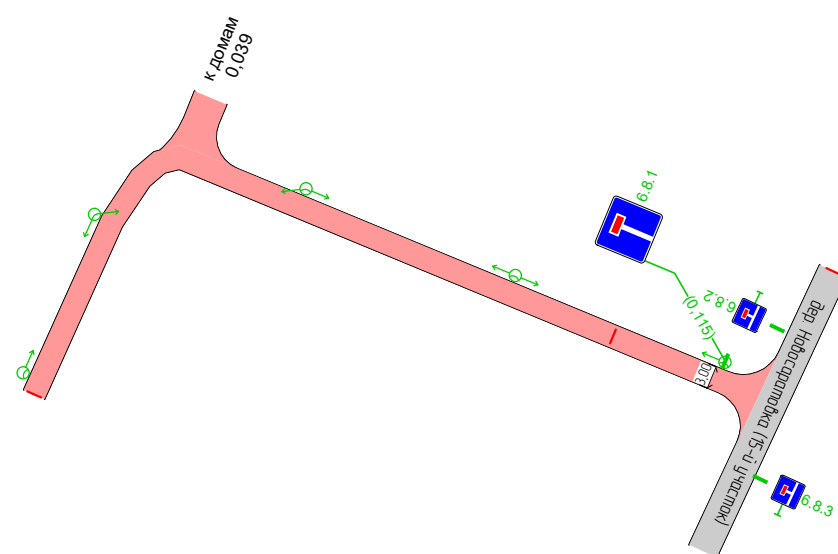

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (32-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,115	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (32-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,115	Населенный пункт	5/5	113	Требуется	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	5/5	113



дер. Новосаратовка (33-й участок)

0,000-0,090

1:1000

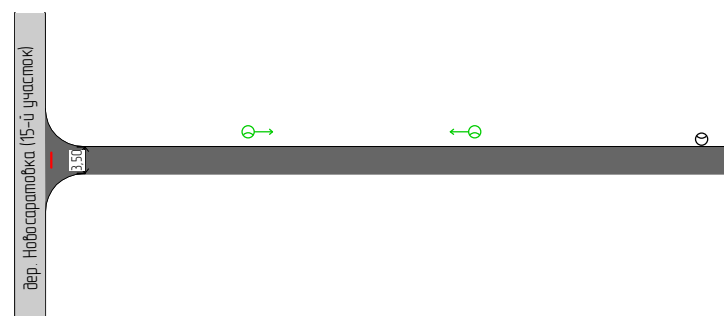

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (33-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,026	0,056	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Левая кромка
2	0,086	0,086	Населенный пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итоги по всем дорогам


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	30
Установлено	1/1	0



дер. Новосаратовка (34-й участок)

0,000-0,125

1:1000

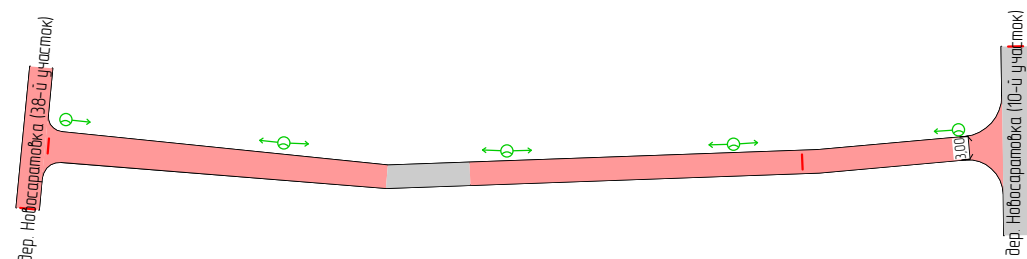

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (34-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,121	Населенный пункт	5/5	119	Требуется	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	5/5	119



дер. Новосаратовка (35-й участок)

0,000-0,095

1:1000

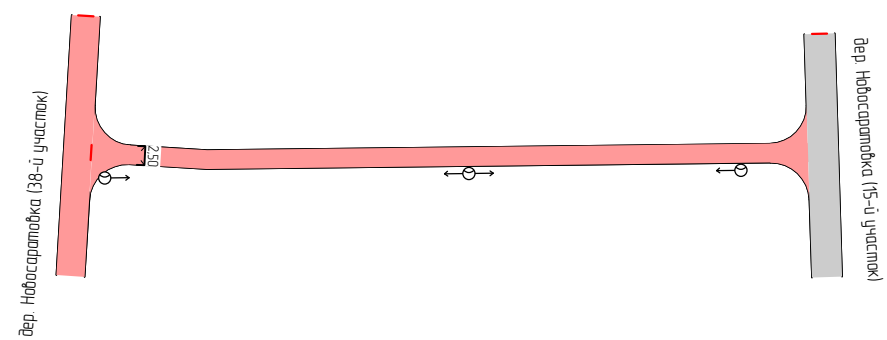

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (35-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,086	Населенный пункт	3/3	84	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	3/3	84



дер. Новосаратовка (36-й участок)

0,000-0,070

1:1000

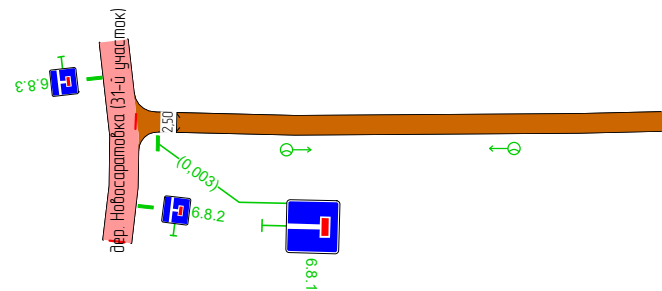

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (36-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,003	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (36-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,050	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Правая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	30



дер. Новосаратовка (37-й участок)

0,000-0,158

1:1000

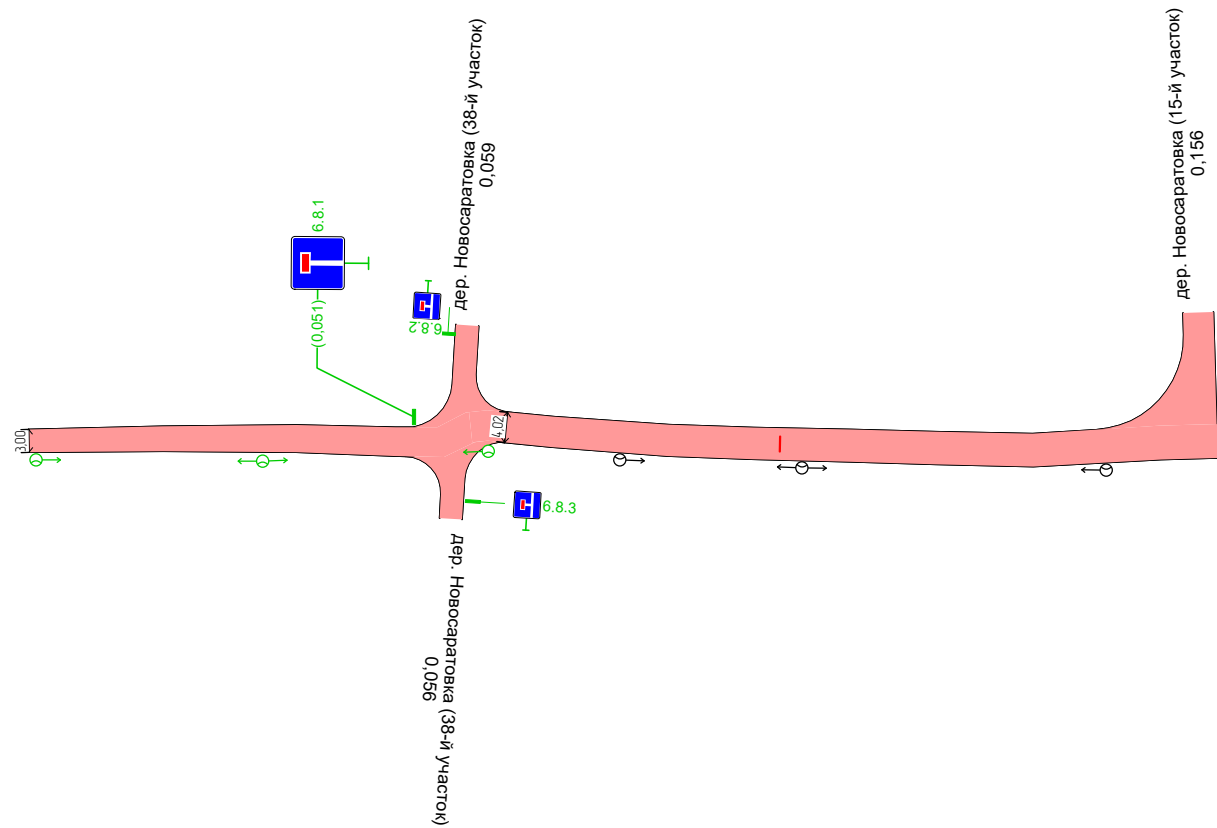

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (37-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,051	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (37-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,061	Населенный пункт	3/3	60	Требуется	Правая кромка
2	0,079	0,143	Населенный пункт	3/3	64	Установлено	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	60
Установлено	3/3	64



дер. Новосаратовка (38-й участок)

0,000-0,347

1:1000



Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (38-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,022	0,222	Населенный пункт	6/6	200	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,244	0,300	Населенный пункт	3/3	56	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,341	0,341	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	9/9	256
Требуется установка	1/1	0

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (39-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,095	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,095	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					



Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (39-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,006	0,095	Населенный пункт	4/4	89	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	4/4	89

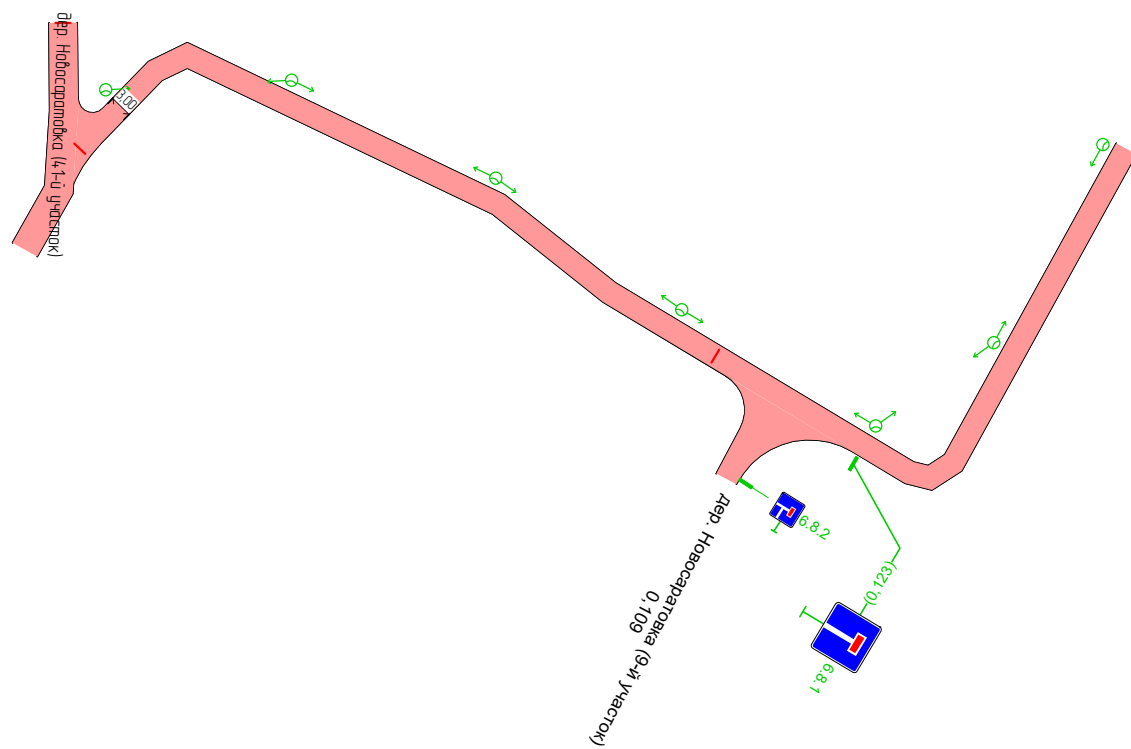

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (40-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,123	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				


Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (40-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,008	0,183	Населенный пункт	7/7	175	Требуется	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	7/7	175

А дер. Новосаратовка (41-й участок)
0,000-0,168
1:1000

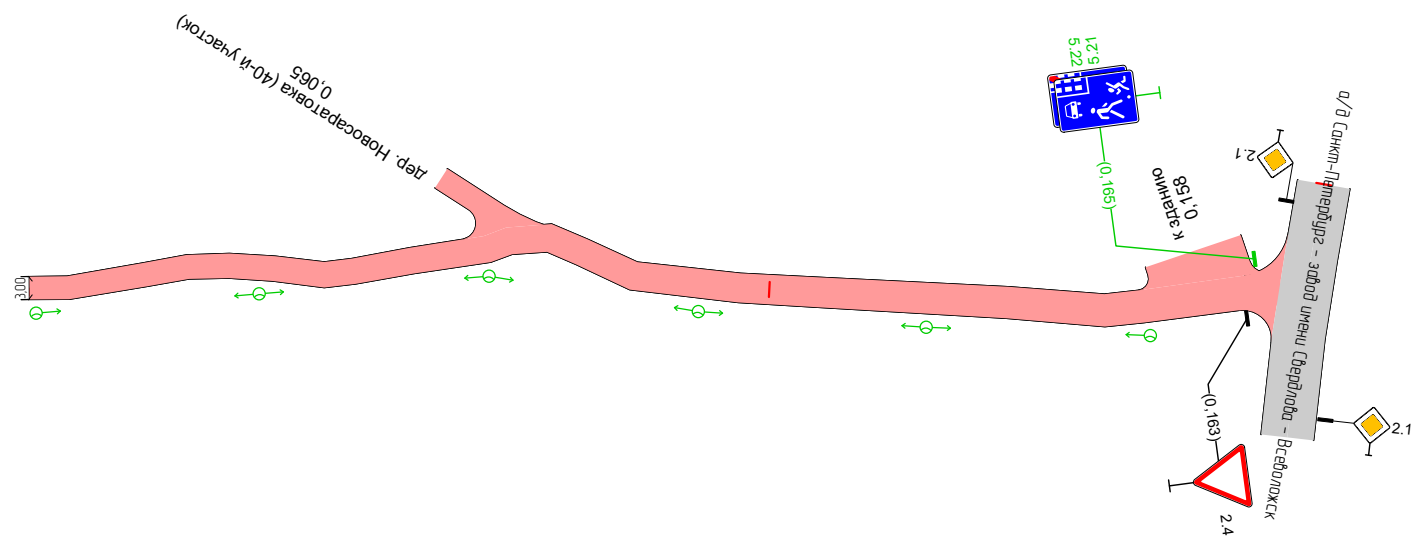

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (41-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,165	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,165	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (41-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,150	Населенный пункт	6/6	149	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	6/6	149

А дер. Новосаратовка (42-й участок)
0,000-0,144
1:1000

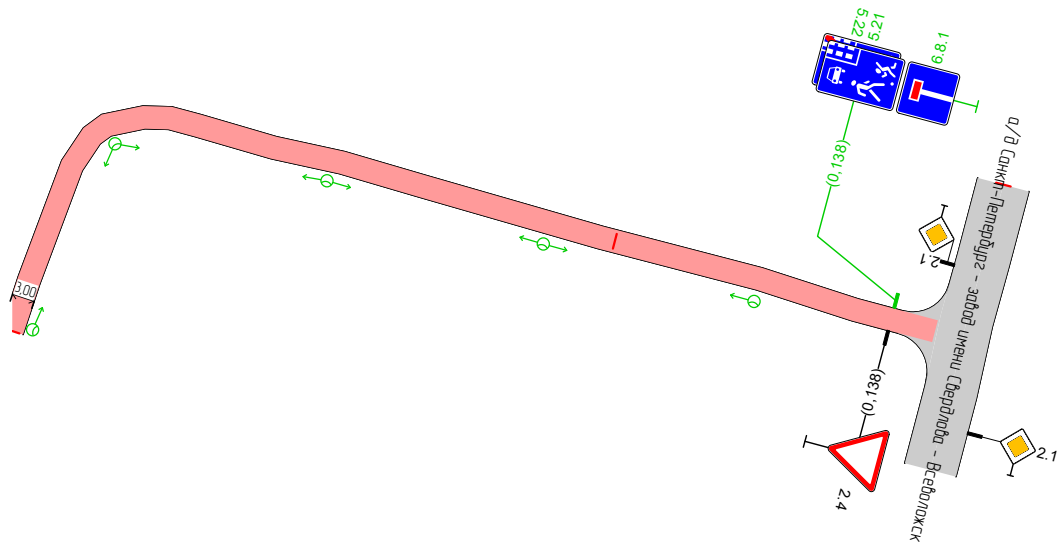

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (42-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,138	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,138	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,138	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения


дер. Новосаратовка (42-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,120	Населенный пункт	5/5	119	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	5/5	119

дер. Новосаратовка (43-й участок)
0,000-0,080
1:1000

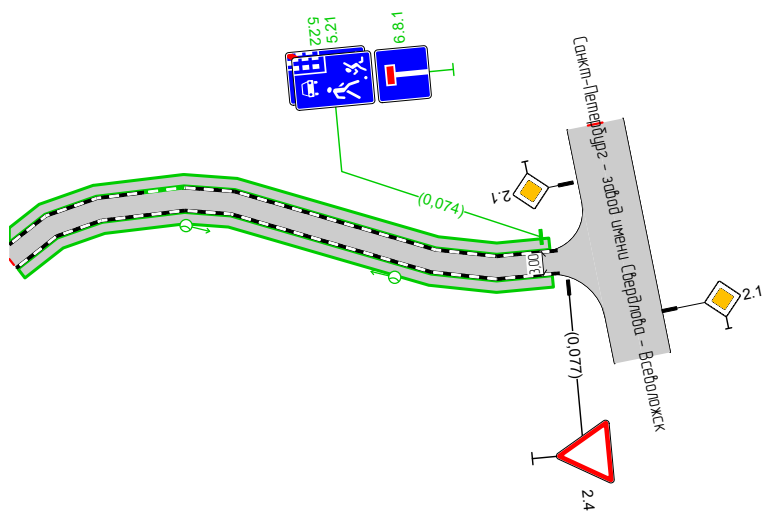

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (43-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,074	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	II		0,074	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,074	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (43-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,055	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	30

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

дер. Новосаратовка (43-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,075	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	75	110	Требуется
2	0,000	0,075	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	75	114	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								150	224	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								150	224	



дер. Новосаратовка (44-й участок)

0,000-0,248

1:1000

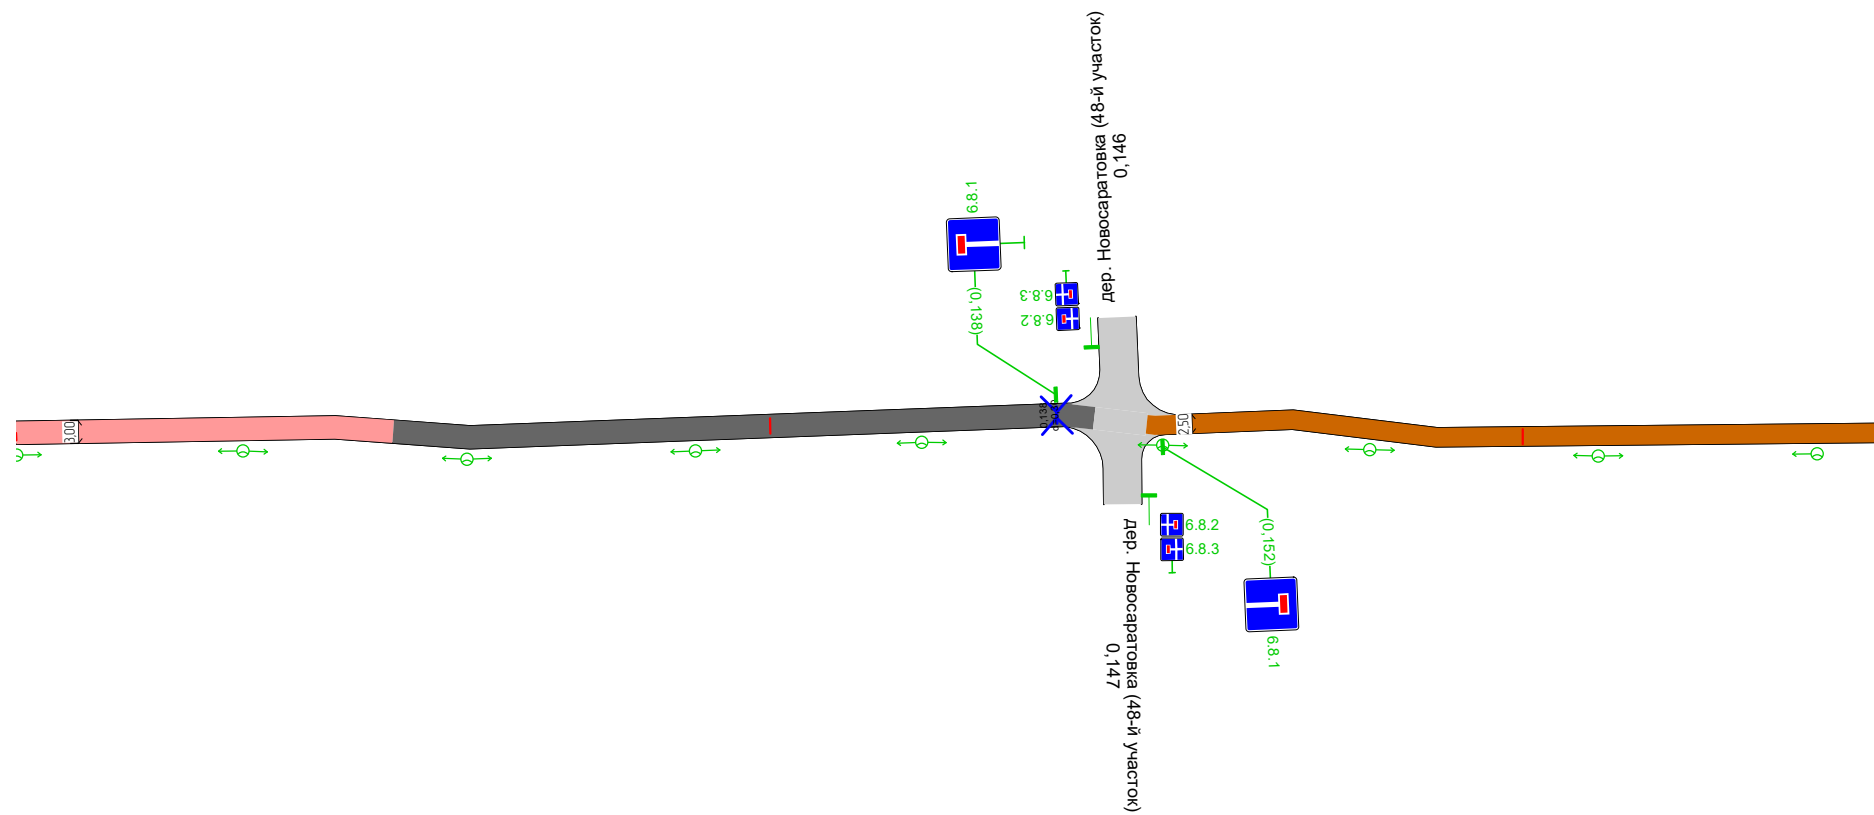

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (44-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,138	Требуется	1	Слева
6.8.1	Тупик	II		0,152	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения


дер. Новосаратовка (44-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,000	0,239	Населенный пункт	9/9	239	Требуется	Правая кромка
Итого							
Состояние			Опор/ светильников, шт		Протяженность, м		
Требуется			9/9		239		


Ведомость водопропускных труб

дер. Новосаратовка (44-й участок)

№п/п	Расположение	Местоположение, км,м	Угол, °	Форма сечения	Размер отверстия, м	Длина, м	Количество очков	Материал
1	Основная дорога	0,138	90	Круглая	d=0,30	6,00	1	Иной



дер. Новосаратовка (45-й участок)
0,000-0,060
1:1000

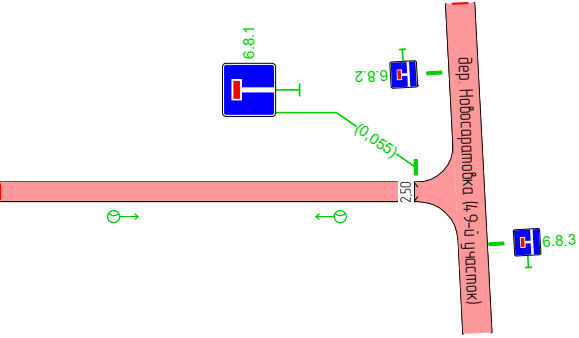

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (45-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,055	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения


дер. Новосаратовка (45-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,045	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	30



дер. Новосаратовка (46-й участок)
0,000-0,055
1:1000

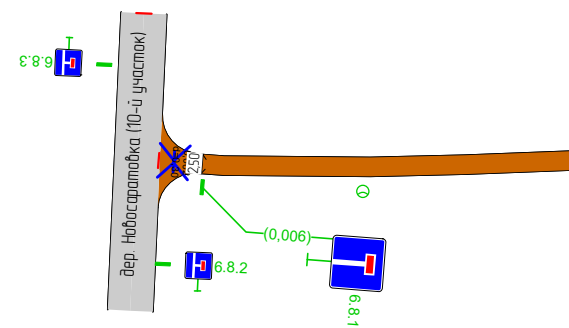

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (46-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,006	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (46-й участок)



№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,027	0,027	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	1/1	0

Ведомость водопропускных труб

дер. Новосаратовка (46-й участок)

№п/п	Расположение	Местоположение, км,м	Угол, °	Форма сечения	Размер отверстия, м	Длина, м	Количество очков	Материал
1	Основная дорога	0,002	90	Круглая	d=0,30	4,50	1	Металл

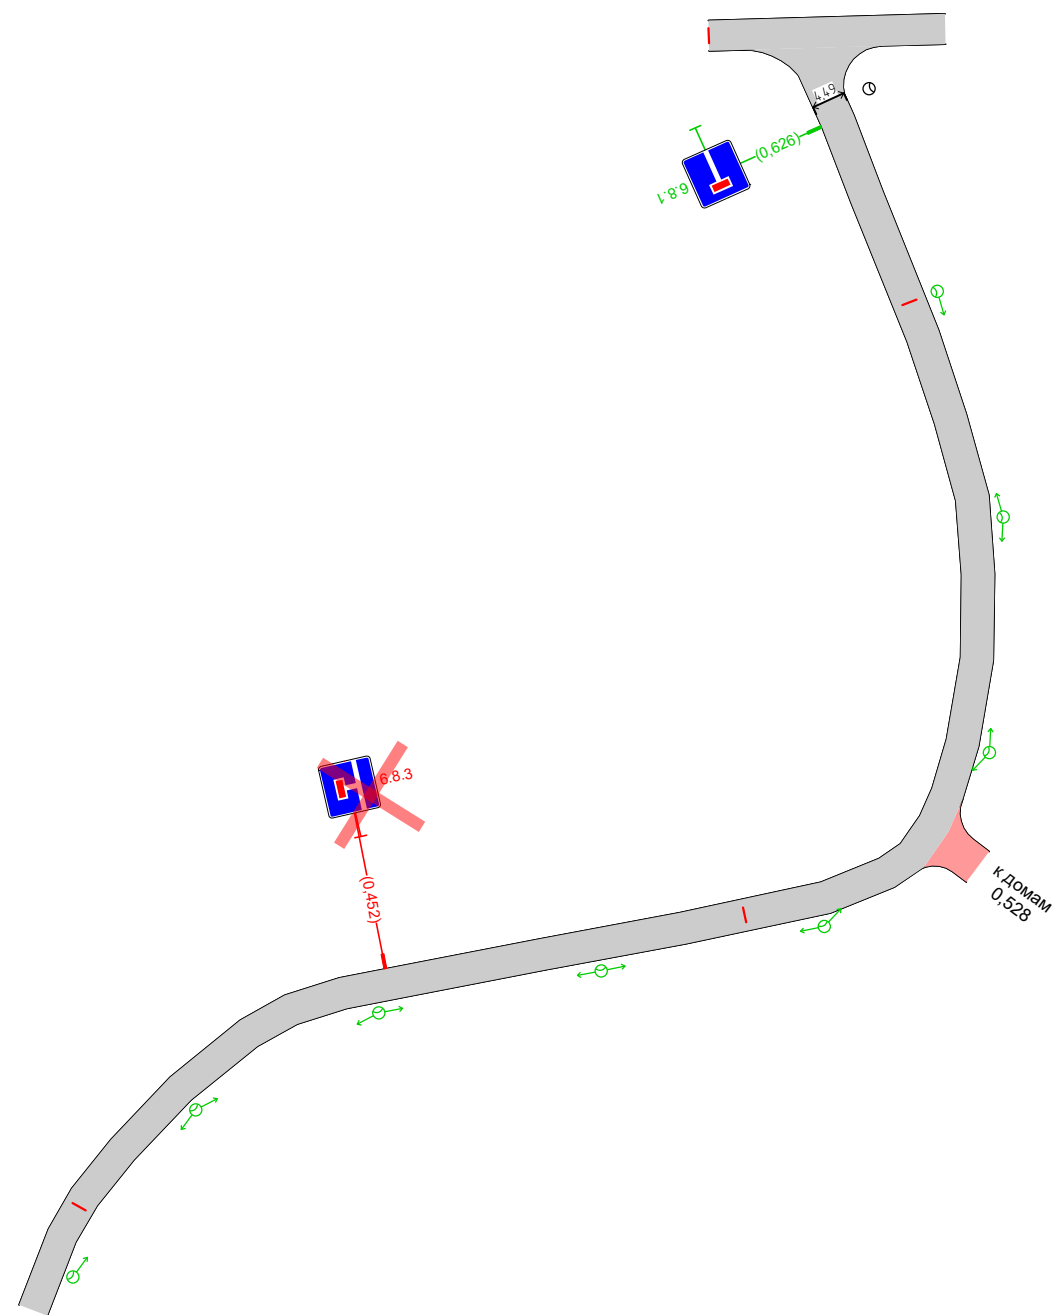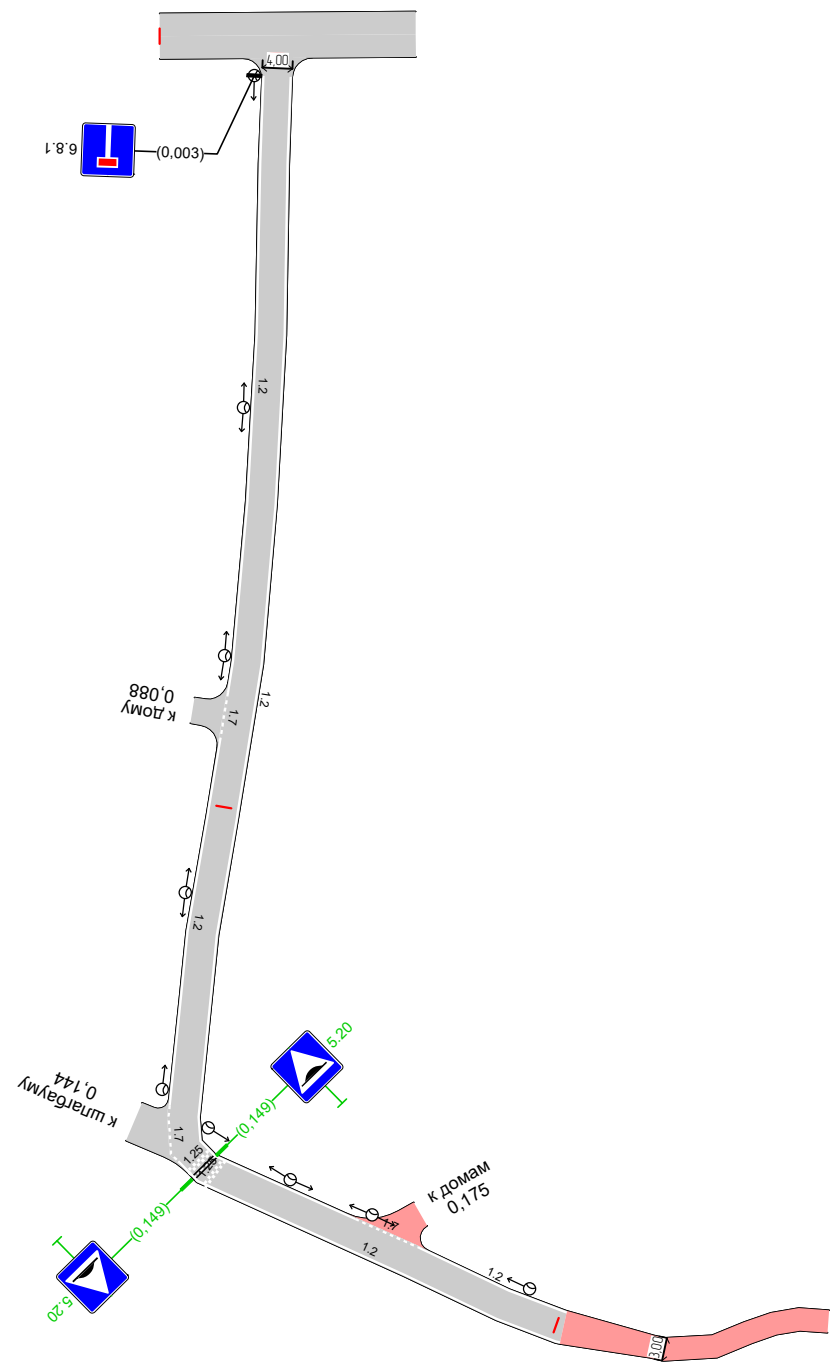

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (47-й участок)

Участок, км,м	1.2	1.7	1.25	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,10	0,40	—
Единицы	м	м	м²	м²
0,000 - 0,636	375,0	21,0	3,36	41,91
Длина, км	0,375	0,021		
Привед. длина, км	0,375	0,011		0,386
Площадь, м²	37,50	1,05	3,36	41,91

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (47-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,149	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,149	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,003	Установлен	1	Справа
6.8.3	Тупик	II		0,452	К демонтажу	1	Слева
6.8.1	Тупик	II		0,626	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (47-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,138	Населенный пункт	5/5	135	Соответствует нормам	Правая кромка
2	0,143	0,195	Населенный пункт	4/4	52	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,391	0,600	Населенный пункт	8/8	209	Требуется установка	Правая кромка
4	0,628	0,628	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	10/10	187
Требуется установка	8/8	209


Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Новосаратовка (47-й участок)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,149	По всей ширине дороги	Сборная	0,5	4,37	0,05	-	Соответствует
Итого:	Соответствует	1						
	Требуется строительство	0						
	К демонтажу	0						
	Требуется реконструкция	0						

A

дер. Новосаратовка (48-й участок)
0,000-0,328
1:1000

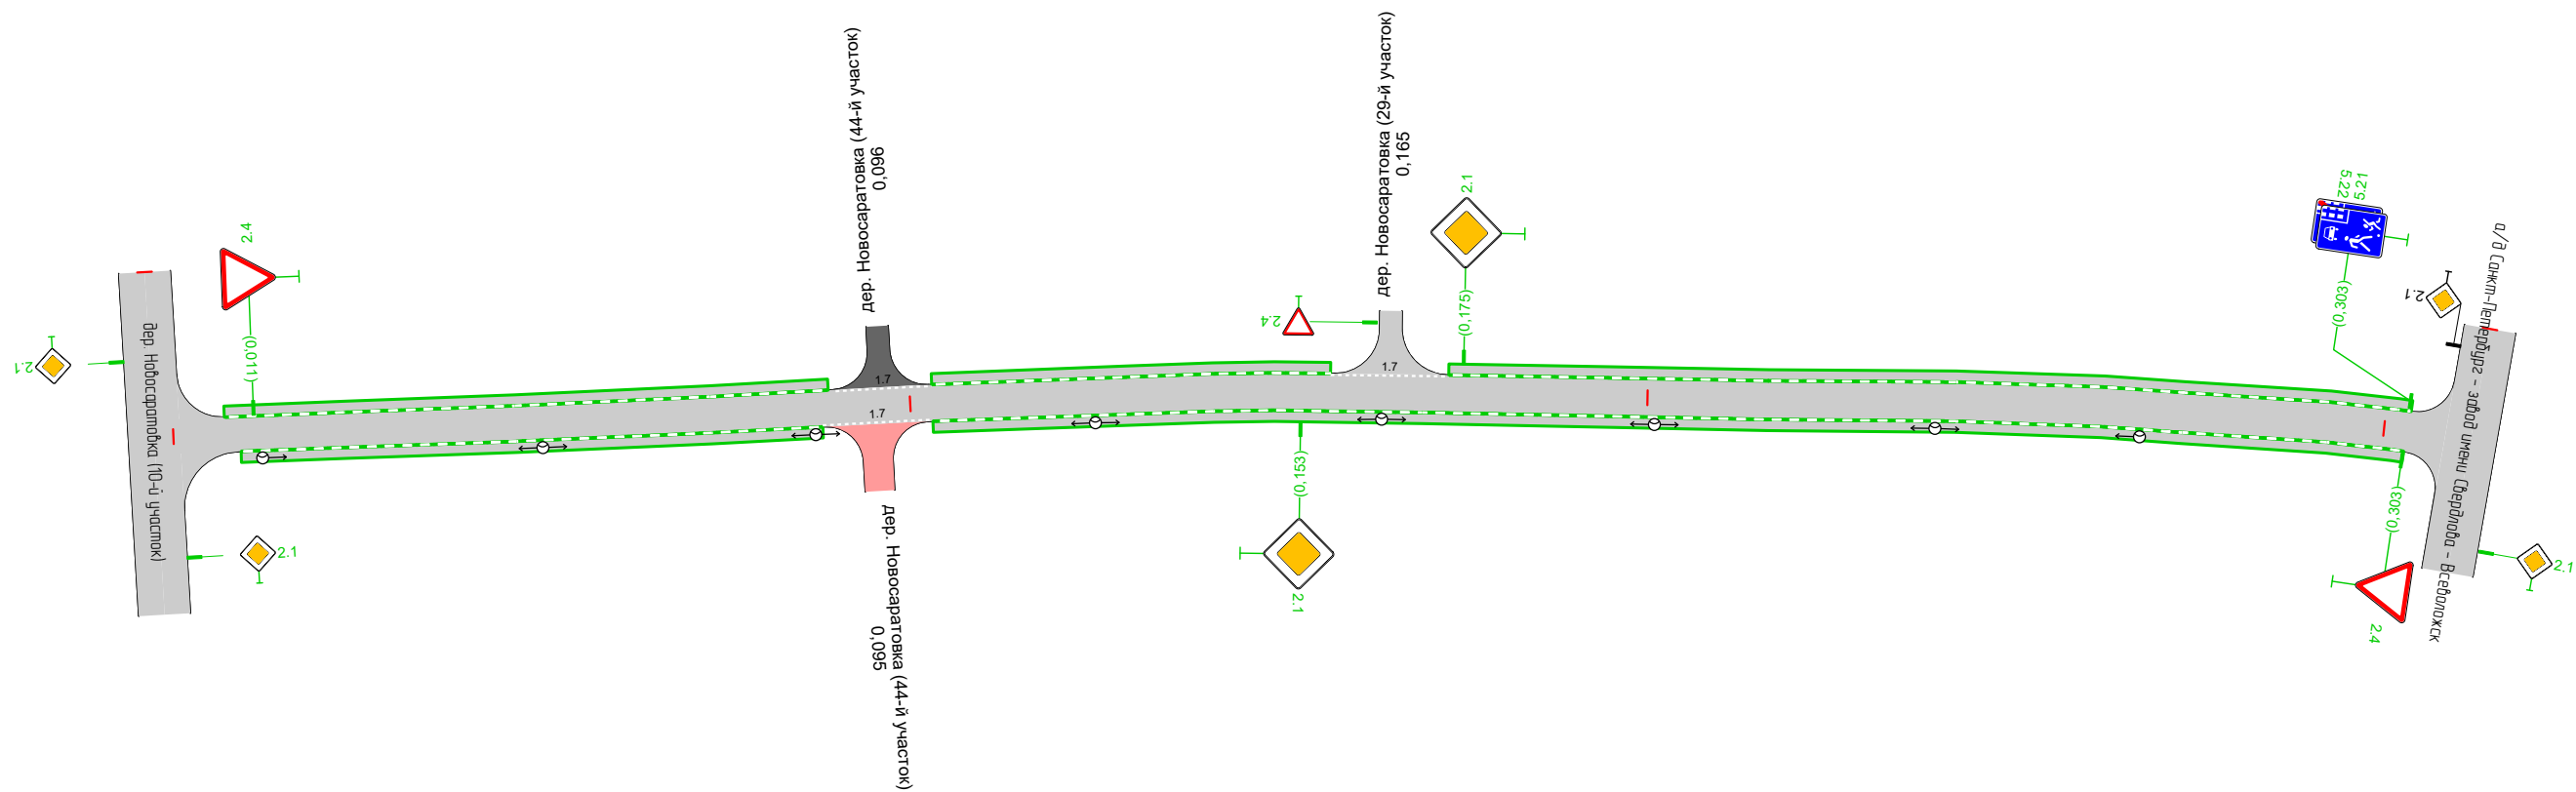

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (48-й участок)

№ км	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	0,50	-
Ширина, м	0,10	-
Единицы	м	м²
0,000 - 0,308	44,00	2,20
Длина, км	0,044	
Привед. длина, км	0,022	0,022
Площадь, м²	2,20	2,20

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (48-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,153	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,175	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,303	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,303	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (48-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,267	Населенный пункт	8/8	255	Установлено	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	8/8	255

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

дер. Новосаратовка (48-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,007	0,089	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	82	123	Требуется
2	0,009	0,088	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	79	118	Требуется
3	0,103	0,157	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	54	81	Требуется
4	0,103	0,303	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	200	299	Требуется
5	0,173	0,303	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	130	196	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								545	818	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								545	818	



дер. Новосаратовка (49-й участок)

0,000-0,370

1:1000

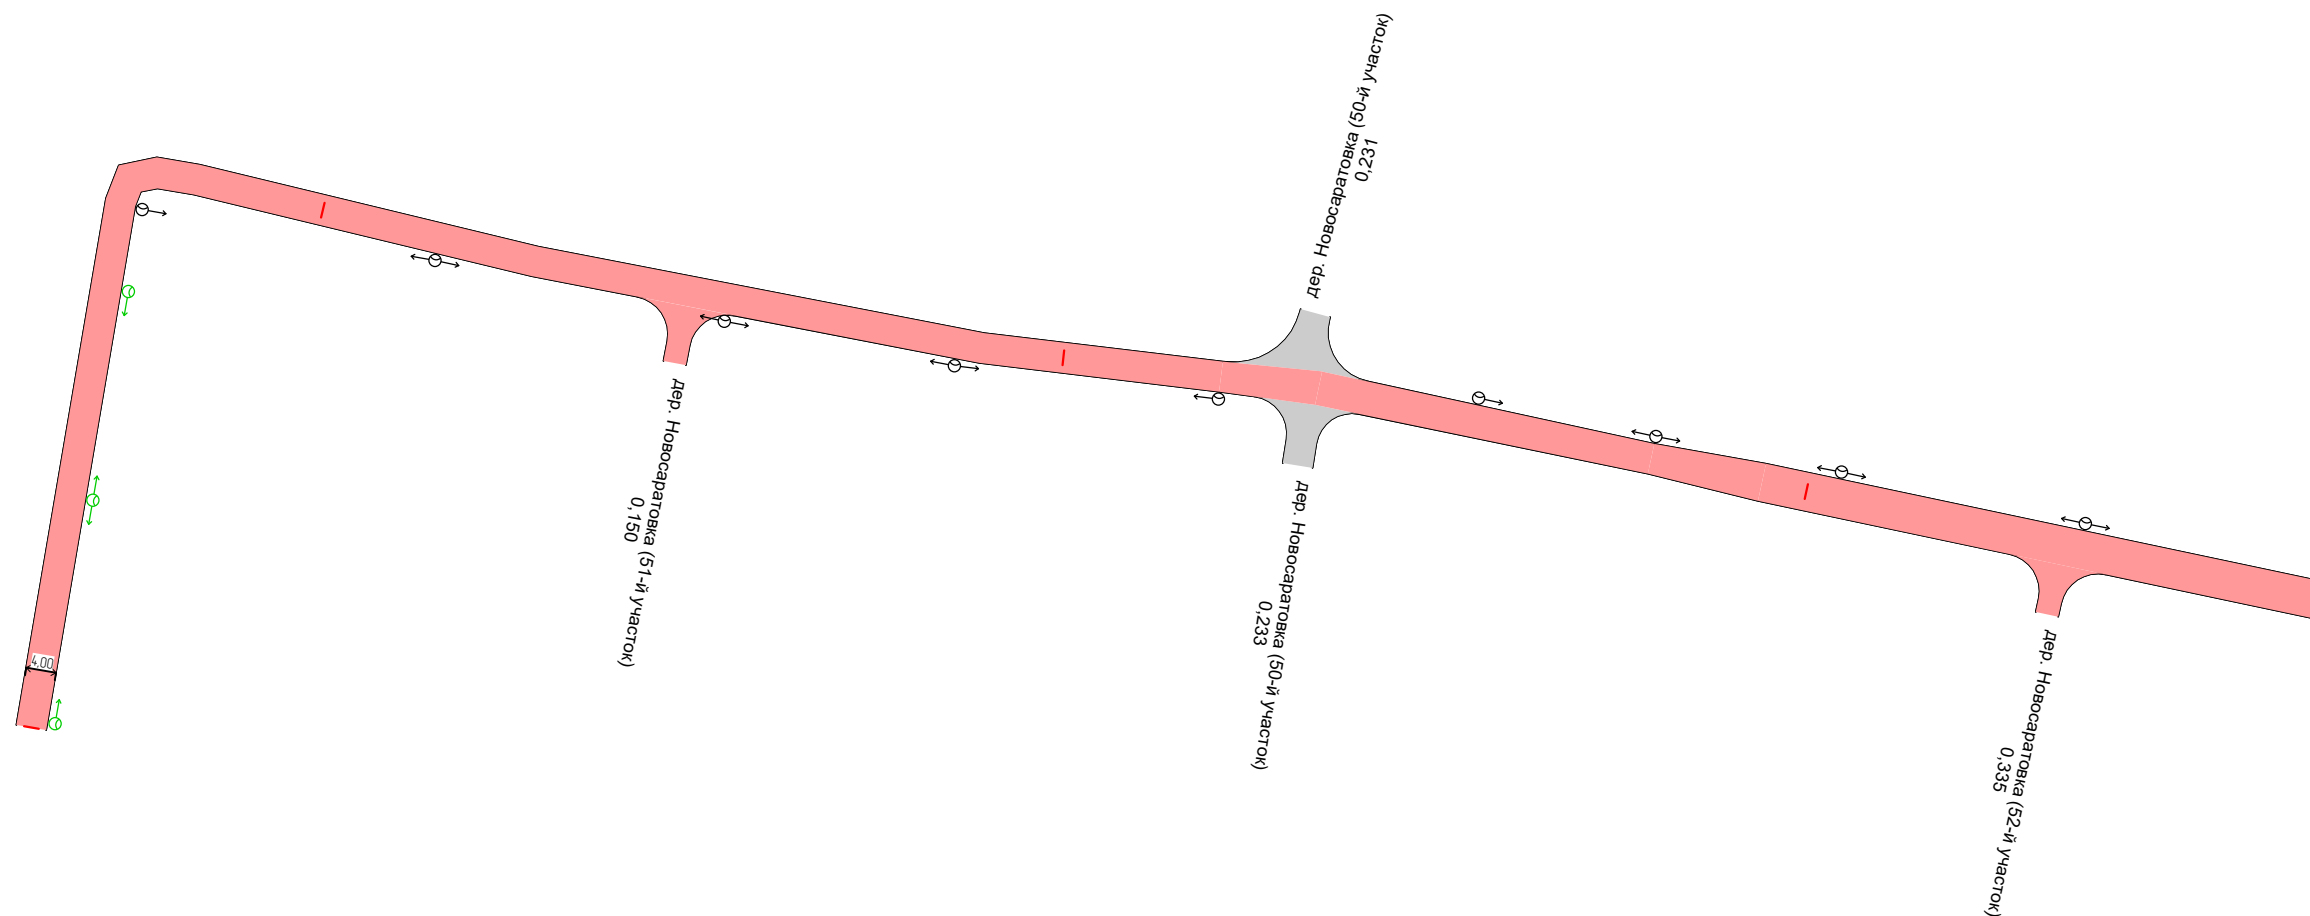




дер. Новосаратовка (49-й участок)

0,370-0,483

1:1000

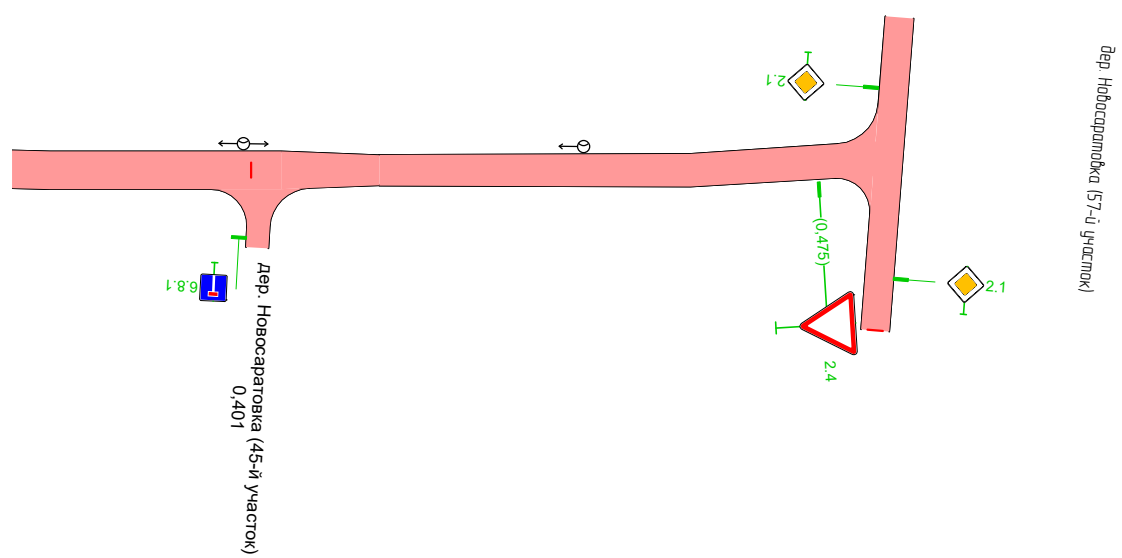

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (49-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,475	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (49-й участок)


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,059	Населенный пункт	3/3	58	Требуется установка	Правая кромка
2	0,070	0,221	Населенный пункт	5/5	151	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,255	0,444	Населенный пункт	6/6	189	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	58
Соответствует нормам	11/11	340

A

дер. Новосаратовка (50-й участок)
0,000-0,295
1:1000

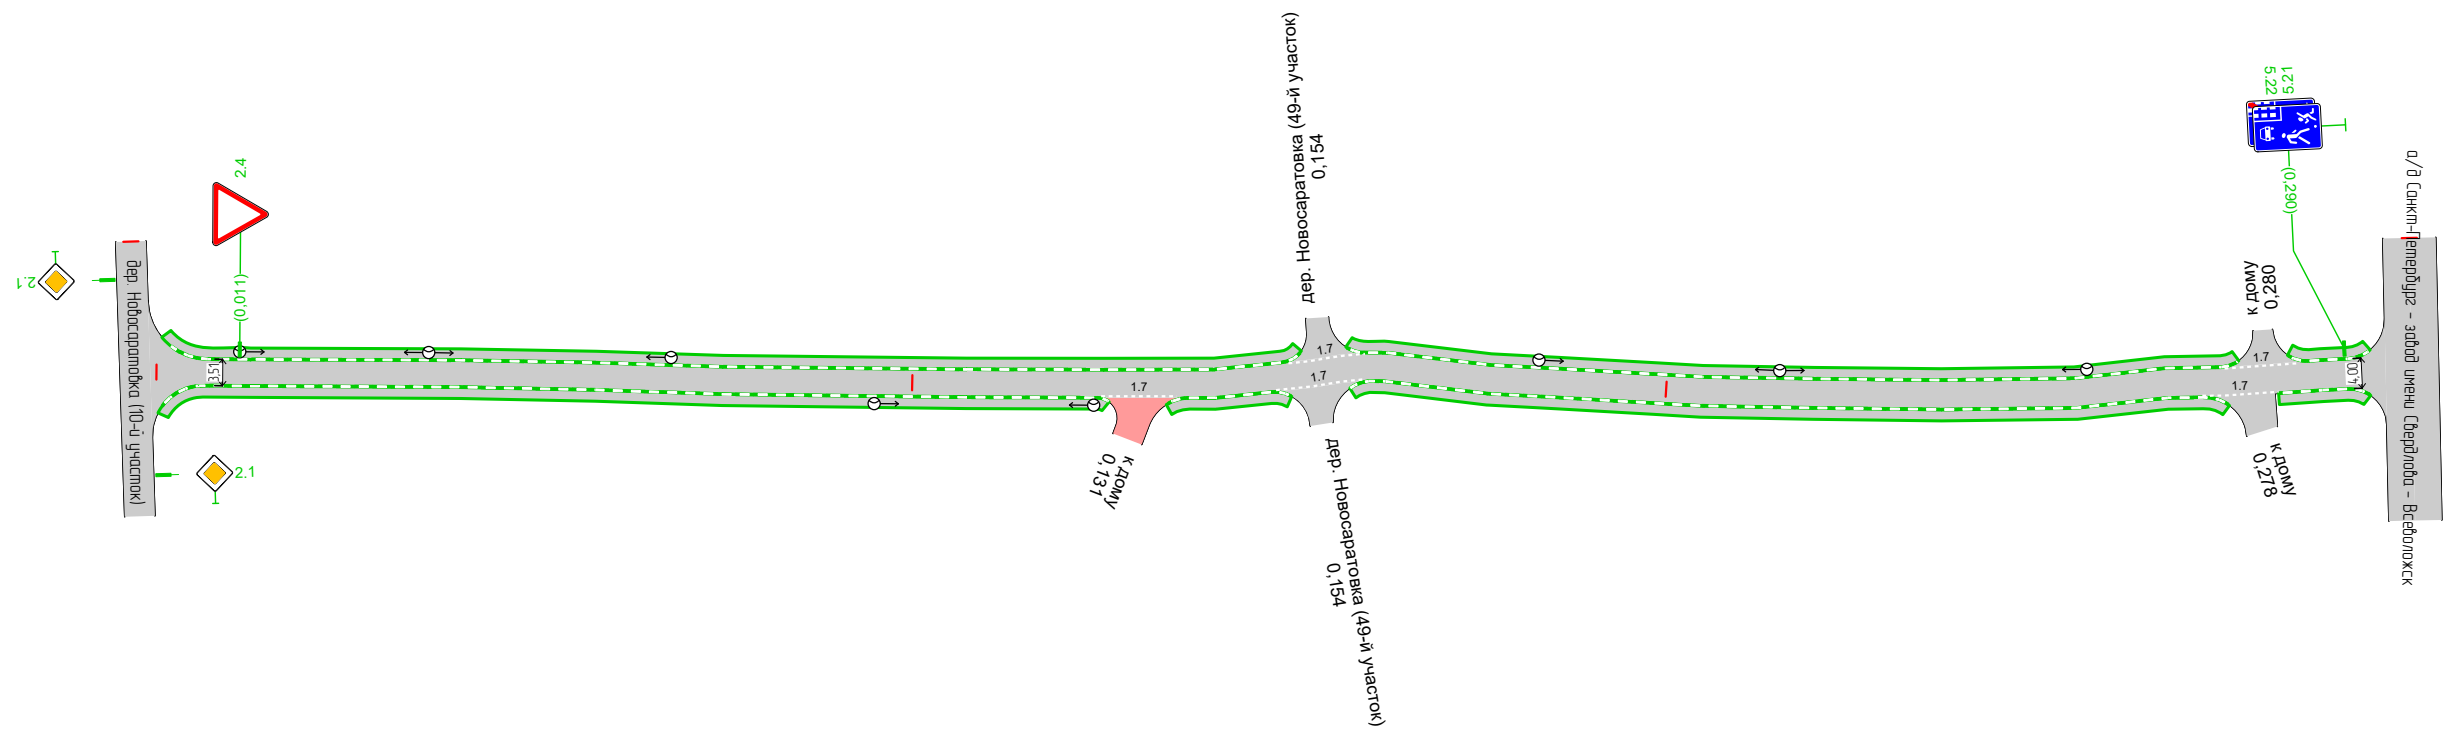

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (50-й участок)


№ км	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	0,50	-
Ширина, м	0,10	-
Единицы	м	м²
0,000 - 0,295	52,00	2,60
Длина, км	0,052	
Привед. длина, км	0,026	0,026
Площадь, м²	2,60	2,60

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (50-й участок)


Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,290	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,290	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					



дер. Новосаратовка (51-й участок)

0,000-0,073

1:1000

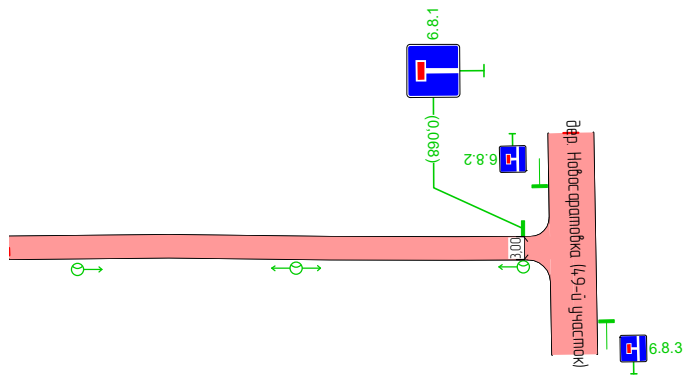

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (51-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,068	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (51-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,068	Населенный пункт	3/3	59	Требуется	Правая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	59



дер. Новосаратовка (52-й участок)

0,000-0,085

1:1000

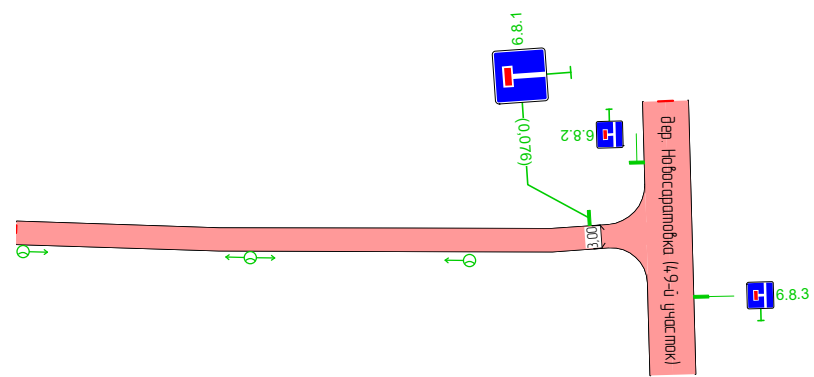

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (52-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,076	Требуется	1	Слева
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (52-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,060	Населенный пункт	3/3	59	Требуется	Правая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	3/3	59



дер. Новосаратовка (53-й участок)

0,000-0,040

1:1000

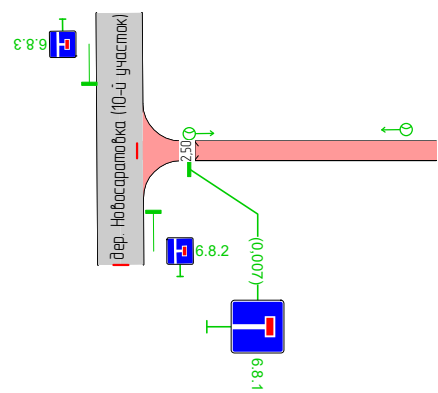

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (53-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,007	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				


Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (53-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,036	Населенный пункт	2/2	29	Требуется	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	29

дер. Новосаратовка (54-й участок)
0,000-0,112
1:1000

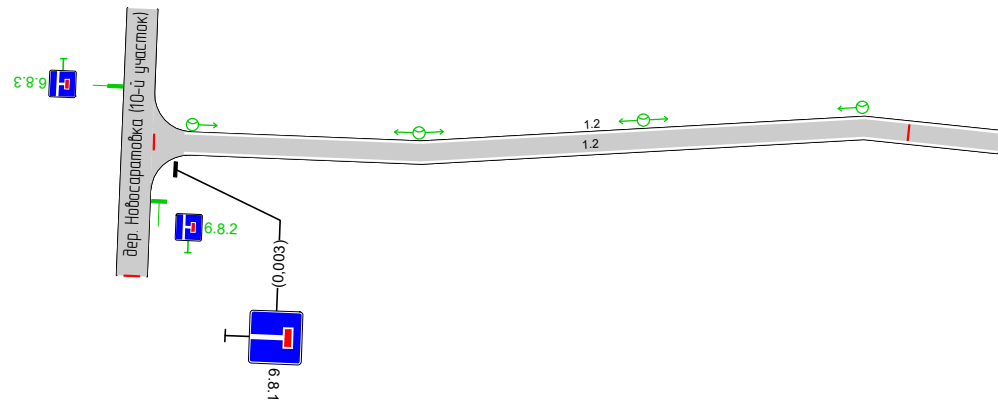

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (54-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,112	216,00	21,60
Длина, км	0,216	
Привед. длина, км	0,216	0,216
Площадь, м²	21,60	21,60

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (54-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,003	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (54-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,094	Населенный пункт	4/4	89	Требуется	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	4/4	89

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (55-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,050	96,00	9,60
Длина, км	0,096	
Привед. длина, км	0,096	0,096
Площадь, м²	9,60	9,60

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (55-й участок)


Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,003	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения


дер. Новосаратовка (55-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,033	Населенный пункт	2/2	30	Требуется	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	2/2	30



дер. Новосаратовка (56-й участок)
0,000-0,049
1:1000

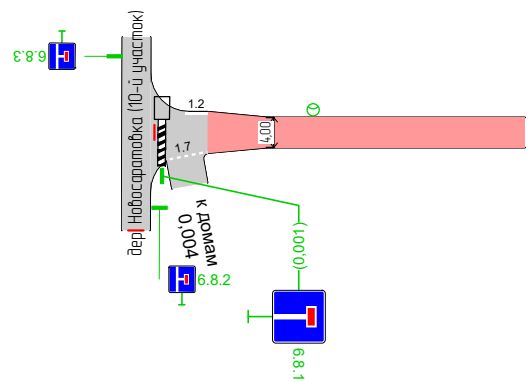

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (56-й участок)

№ км	1.2 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	0,00
Ширина, м	0,10	0,10	0,00
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,049	3,00	6,12	0,61
Длина, км	0,003	0,006	
Привед. длина, км	0,003	0,003	0,006
Площадь, м²	0,30	0,31	0,61

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (56-й участок)


Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,001	Требуется	1	Справа
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			1				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			1				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			1				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			1				

Ведомость искусственного освещения

дер. Новосаратовка (56-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,021	Населенный пункт	1/1	0	Требуется	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	1/1	0



дер. Новосаратовка (57-й участок)

0,000-0,293

1:1000

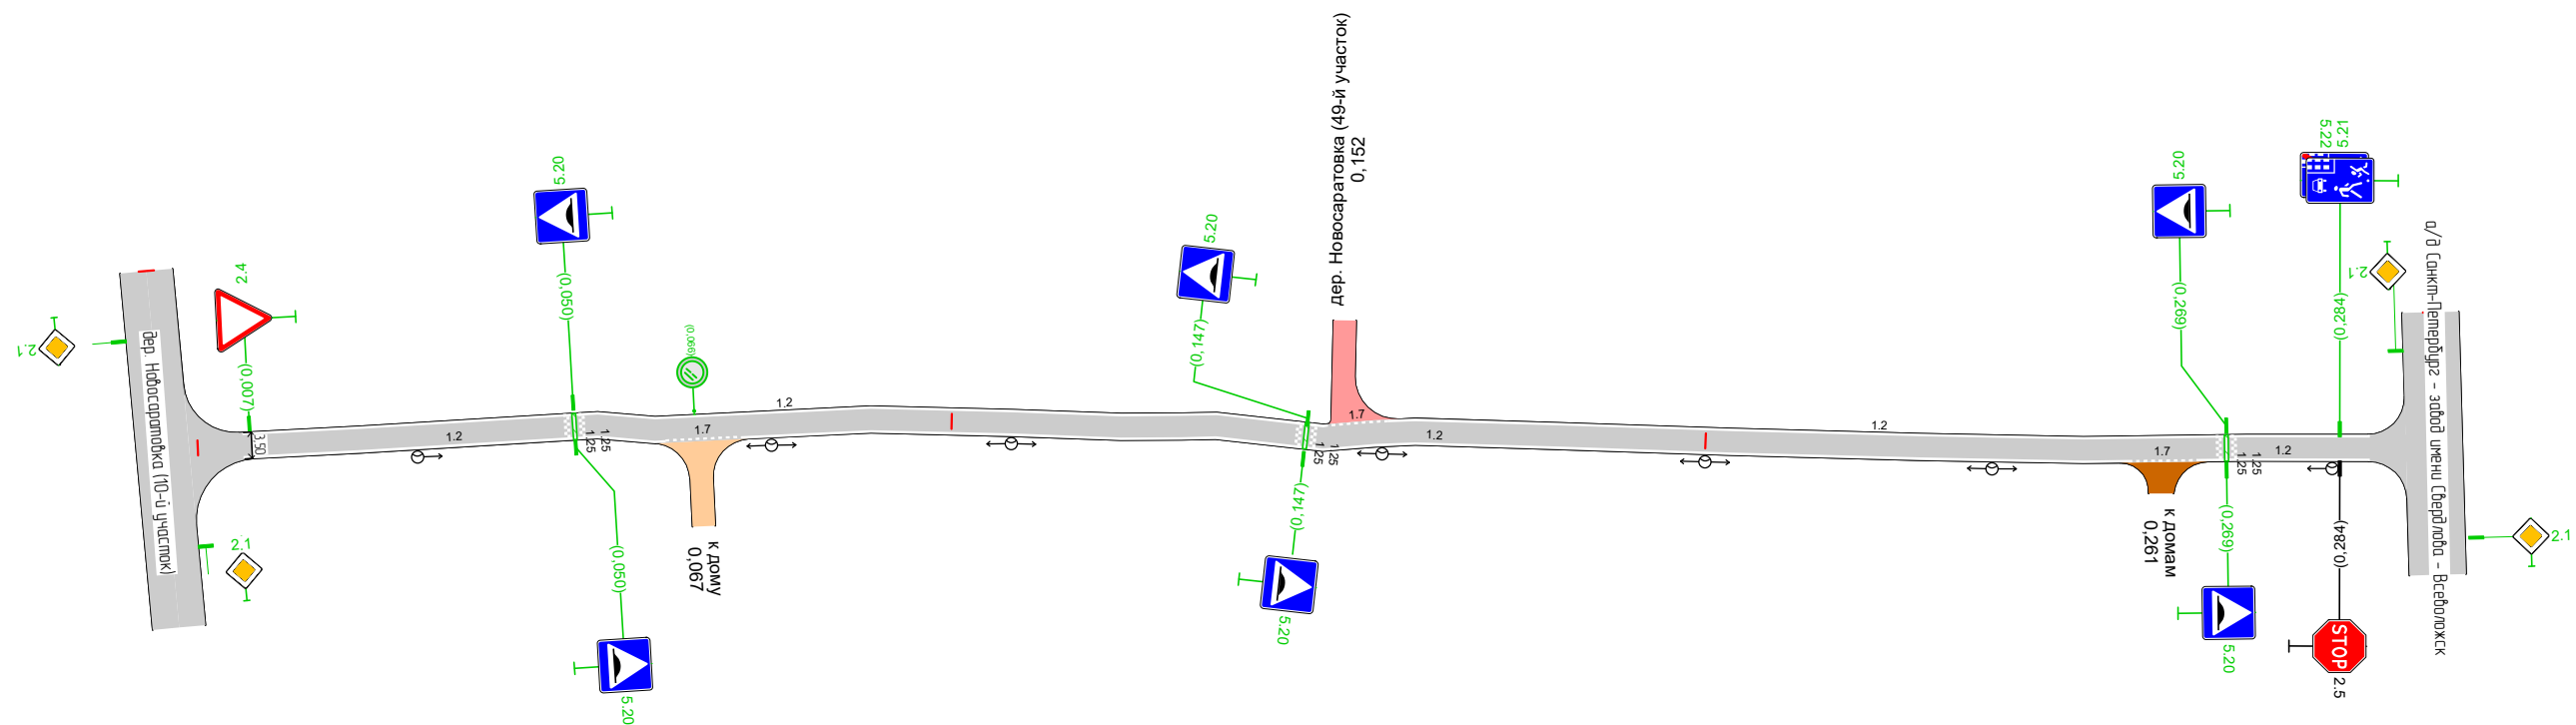

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (57-й участок)

Участок, км,м	1.2 	1.7 	1.25 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	1,00	—
Ширина, м	0,10	0,10	0,40	—
Единицы	м	м	м²	м²
0,000 - 0,293	537,0	27,0	7,68	62,73
Длина, км	0,537	0,027		
Привед. длина, км	0,537	0,014		0,551
Площадь, м²	53,70	1,35	7,68	62,73

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

дер. Новосаратовка (57-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						1	
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,050	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,050	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,147	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,147	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,269	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,269	Требуется установка	1	Справа
5.21	Жилая зона	I		0,284	Требуется установка	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,284	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						8	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						9	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						9	

Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Новосаратовка (57-й участок)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,029	0,283	Населенный пункт	7/7	254	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Статус	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	7/7	254

Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Новосаратовка (57-й участок)


№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,050	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	3,50	0,05	-	Требуется строительство
2	0,147	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	3,50	0,05	-	Требуется строительство
3	0,269	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	3,50	0,05	-	Требуется строительство

Итого по дороге

Итого	
Статус	Количество
Требуется строительство	3



дер. Новосаратовка (58-й участок)
0,000-0,073
1:1000

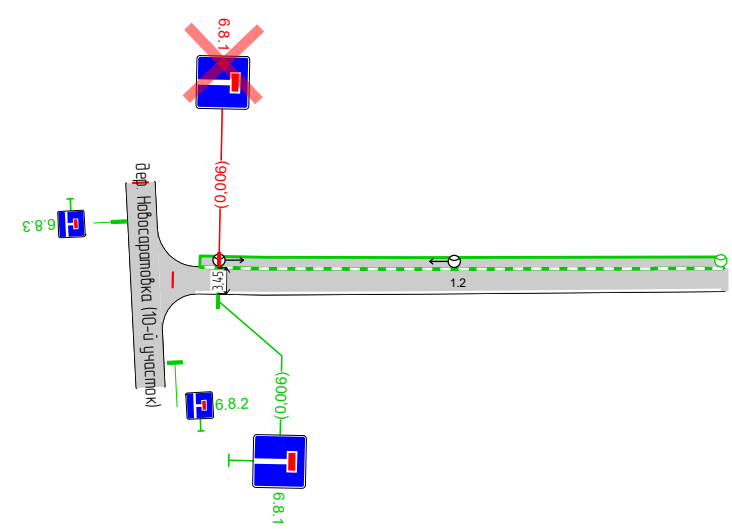

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

дер. Новосаратовка (58-й участок)

№ км	1.2	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,10	0,00
Единицы	м	м²
0,000 - 0,073	69,00	6,90
Длина, км	0,069	
Привед. длина, км	0,069	0,069
Площадь, м²	6,90	6,90

*Такой же ширины

Ведомость дорожных знаков

дер. Новосаратовка (58-й участок)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Информационные знаки							
6.8.1	Тупик	II		0,006	К демонтажу	1	Слева
6.8.1	Тупик	II		0,006	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО:		2					

автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ул. Покровская

0,000 - 0,337



Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Покровская

Участок, км,м	1.7	1.14.1		1.25	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	0,50	0,40	0,40	1,00	—	—
Ширина, м	0,10	4,00	4,00	0,40	—	—
Единицы	м	м²	м²	м²	м²	м²
0,000 - 0,337	83,3	9,60	8,00	9,92	23,68	8,00
Длина, км	0,083					
Привед. длина, км	0,042				0,042	
Площадь, м²	4,16	9,60	8,00	9,92	23,68	8,00

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Покровская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						1	
Знаки особых предписаний							
5.20	Искусственная неровность	II		0,039	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,039	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,150	Требуется установка	1	Справа
5.21	Жилая зона	I		0,201	Требуется установка	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,201	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0,228	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0,228	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,321	К демонтажу	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,321	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,321	Требуется установка	1	Справа

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,326	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,326	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						12	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						1	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						13	
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,076	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						1	
Итого требуется установить:						0	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						1	
Информационные знаки							
6.8.2 (1)	Тупик	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
6.8.3 (1)	Тупик	II		0,076	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						1	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						1	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						15	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						18	

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Покровская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,002	0,148	Населенный пункт	6/6	146	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,178	0,313	Населенный пункт	4/4	135	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Статус	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	6/6	146
Требуется установка	4/4	135

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул. Покровская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Статус	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,323	Наземный	Требуется строительство	

Итого		
Статус	Вид перехода	Количество
Требуется строительство	Наземный	1

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Покровская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Статус
1	0,005	0,104	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	99	148	Требуется строительство
2	0,006	0,160	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	154	231	Требуется строительство
3	0,117	0,205	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	88	132	Требуется строительство
4	0,173	0,203	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	30	45	Требуется строительство
5	0,212	0,293	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	81	121	Требуется строительство
6	0,216	0,321	Тротуар	Справа	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	105	157	Требуется строительство
7	0,310	0,314	Тротуар	Слева	1,5	Населенный пункт	Асфальтобетон	4	6	Требуется строительство

Итого		
Статус	Протяжённость, м	Площадь, м²
Требуется строительство	561	840

Ведомость размещения искусственных неровностей
ул. Покровская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,039	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	4,00	0,05	-	Требуется строительство
2	0,150	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	4,00	0,05	-	Требуется строительство
3	0,228	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	5,00	0,05	-	Требуется строительство

Итого по дороге

Итого	
Статус	Количество
Требуется строительство	3

автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области


ул. Полевая

0,000 - 0,450





ул. Полевая (Новосаратовка)
0,000-0,369
1:1000

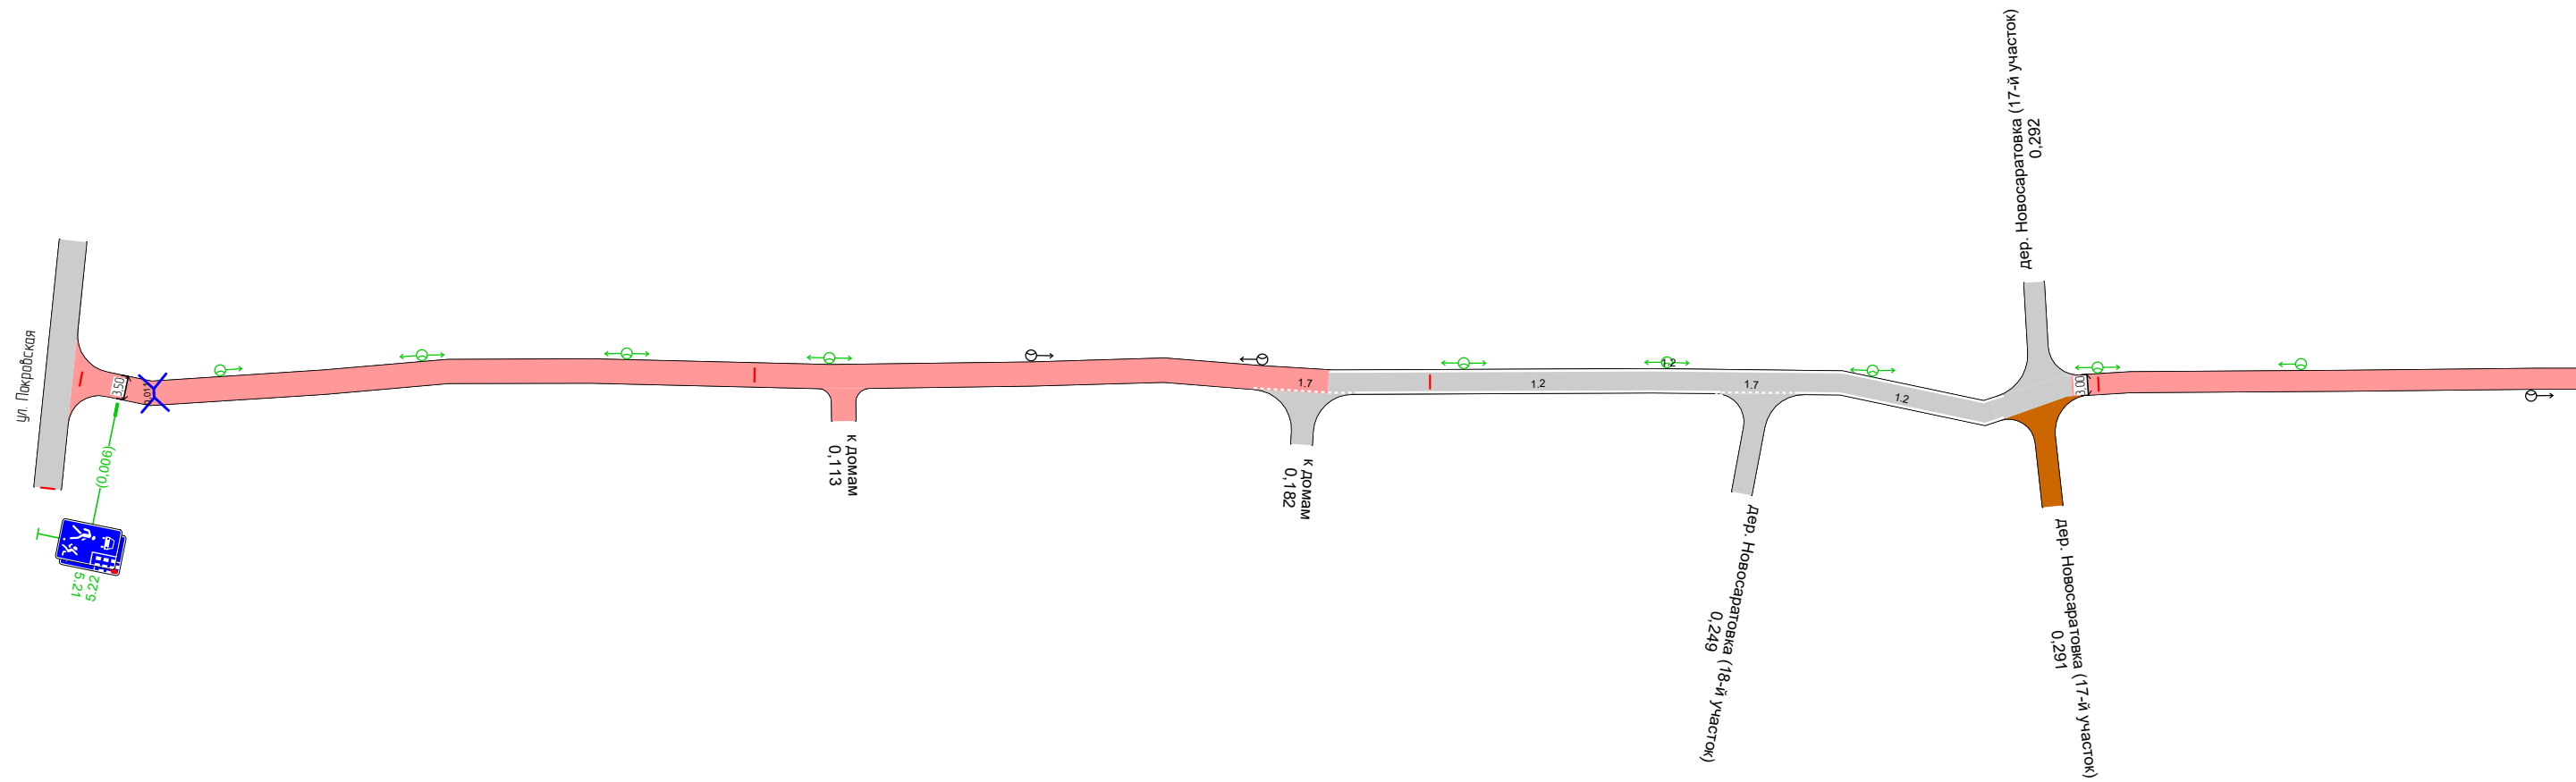




ул. Полевая (Новосаратовка)

0,369-0,450

1:1000

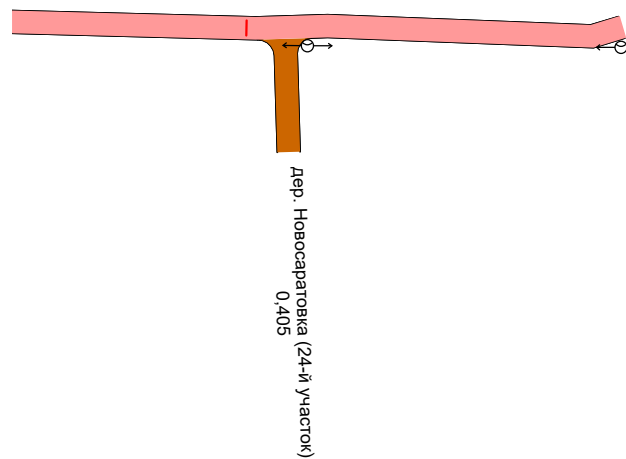

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Полевая (Новосаратовка)

Участок, км,м	1.2	1.7	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	—
Ширина, м	0,10	0,10	—
Единицы	м	м	м²
0,000 - 0,450	186,0	25,7	19,89
Длина, км	0,186	0,026	
Привед. длина, км	0,186	0,013	0,199
Площадь, м²	18,60	1,29	19,89

Ведомость размещения дорожных знаков

*Такой же ширины

ул. Полевая (Новосаратовка)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,006	Требуется установка	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I		0,006	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						2	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						2	

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Полевая (Новосаратовка)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Статус	Расположение
1	0,021	0,330	Населенный пункт	9/9	309	Требуется установка	Левая кромка
2	0,141	0,175	Населенный пункт	2/2	34	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,364	0,449	Населенный пункт	3/3	85	Соответствует нормам	Правая кромка
